

Пудрат шартномаси  
(Жорий таъмирлаш)

3А-22 -сон

2022 йил "20" 10

Кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритиладиган Сурхондарё минтакавий йўлларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш кўрувчи директор А.Бокіев бир томондан ва кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритиладиган QURILISH RAVON YO'LLAR МЧЖ номидан Низом асосида иш кўрувчи : Б.Каршнев иккинчи томондан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПК-172-сонли "Обод кишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастуриларини амалга ошириш бўйича қўшимча чора тadbирлар тўғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (шаҳар) хокимликлари тасарруфида бўлган ички хўжалик йулларида Республика бюджет захира маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022 йил учун дастлабки 27.05.2022 йилги №18 Манзилли дастурига асосан ҳамда, 01.08.2022 йилдаги №124731 сонли лот Протокол қарори 2022 йилда РЕСПУБЛИКА БЮДЖЕТ МАБЛАҒЛАРИ ҳисобидан таъмирланиши белгиланган Сурхондарё вилояти Шеробод тумани Бойбулоқ МФЙ Пахтакор, Ғўринбулоқ кишлоқ кўчасини жорий таъмирлашга доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

## I. Таърифлар

### 1. Мазкур шартномада тарифлар кулланилади:

**"ижро ҳужжатлари":** - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритолган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларини бажаришда қўлланилган материаллар, конструкция ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисида далолатномалар, айрим маъсулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тўғрисида далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисида далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар:

**"қурилиш майдони":** Мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегарасини ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади.

**"вакцинчалик ишлар":** Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишлар бажариш учун зарур зарур бўлган ҳар типдаги вакцинчалик бинолар ва иншоотлар.

**"беркитилган ишлар":** сифати ва яқунлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар:

**шартномани нархини бўлиб чиқиш:** ишларнинг ҳар бир босқичи ёки турлари қийматининг аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектни умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

## II. Шартнома мавзуси

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига лойиха-смета ва экспертиза ҳулосасига келишилган муддатларга асосан Сурхондарё вилояти Шеробод тумани Бойбулоқ МФЙ Пахтакор, Ғўринбулоқ қишлоқ кўчасини жорий таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади, Буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

## III. Шартнома бўйича ишлар қиймати

3. Мазкур шартнома бўйича пудратчи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (01.08.2022 йилдаги №124731 сонли лот Протокол қарори) билан тасдиқланган баенномага асосан барча солиқлар, йиғимлар, ККС ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда **1 201 521 995 (бир миллиард икки юз бир миллион беш юз йиғирма бир минг тўққиз юз тўқсон беш)** сўмни ташкил этади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта қўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- қурилиш қиймати ва кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;
- ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганда;
- объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегишли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

## IV. Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга "1а" иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда иншоот нархидаги ишларни энг камида 50%ни ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

- "1" иловага мувофиқ қурилиш майдонида зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушириш омборга жойлаш ва сақлаш;

- қурилиш майдони ҳудудида вакцинчалик иншоотлар қуриш;

- буюртмачини Пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

- объектда тасдиқланган лойихага мувофиқ қурилиш-монтаж ишларини амалга ошириш;

- қурилиш тавakkалчилигини сўғурта қилиш.

Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекилгандан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вакцинчалик бинолардан бўшатиш;

қурилиш майдонини қўриқланишини таъминлаш;

қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий химояси ва техник хафсизлигини таъминлаш.

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлик ҳажмда бажаришни ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 %дан куп бўлмаган) зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлик мулкый жавоб беради.

#### **V. Буюртмачининг мажбуриятлари**

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага иловага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

- ишлар бажарилиши устидан доимий йўл қурилиш сифати техник назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ қабул қилиб олишни таъминлаш;

- молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига "1Б" иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлик ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

#### **VI. Ишларни бажариш муддати**

10. Шартнома миллий валюта (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда томонлар учун имзоланган пайтдан бошлаб: кейинчалик ЭАВ га конвертация қилган ҳолда миллий валютада (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда шартнома қонун ҳужжатларга мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга қиради:

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва аниқланган муддатда ишларни тўлик якунлайди..

12. Қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан **60 кунни ташкил этади.** (бажариш графигига асосан)

13. Мазкур шартнома бўйича ишларнинг муддати ҳамда бажариладиган ишлар, ишларни бажариш жадвалига (1а-илова) мувофиқ амалга оширилади.

#### **VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар**

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30 % миқдорига, аванс ўтказади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1б-илова)

16. Буюртмачи ва Пудратчи ҳар ойда бажарилган ишларини "Маълумотнома-ҳисоб-фактура"га асрсан молиялаштирилади. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 70 % гача доирасида амалга оширилади.

17. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган қисми Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин ёки мазкур шартномада белгиланган кафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан кейин ишлар қийматининг 5% гача миқдорига, амалга оширилади:

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунга қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бундан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

#### **VIII. Ишларни бажариш**

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақилини – Техник кузатувчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади. Аниқланган камчиликларни ўз вақтида бартараф этиш бўйича барча чораларини кўради, мунтазам равишда олиб борилаётган ишлар юзасидан Буюртмачи маъсул ходимларини ёзма равишда хабардор қилиб боради.

21. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўлиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи Техник кузатувчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йнгилишларда мунтазам равишда қатнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI-бўлимда кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини қурилишда Давлат назорат инспекцияси билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортқича тупроқ ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупроқни қазиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) қилиш учун Пудратчига геодезия нукталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларнинг жойлаши схемаларини ва жадвалларни саклайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига беради.

30. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

32. Алоҳида беркитилган конструкциялар ва беркитилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлашдан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва қурилишда Давлат назорати инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қурилишда Давлат назорати инспекцияси билан келишган шартларида беркитилладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар беркитилладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитилладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг манфаатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилиғисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исоблатласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келтирилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 35 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини супуриб-сидиради ва озода саклайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтари юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi ўтказилган сеновлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмасилиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашни узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қоникмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини ўз зиммасига олади.

#### **IX. Ишларнинг қуриқлаш**

39. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллагунча ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва ошқа мол-мулк зарур даражада қуриқланишини таъминлайди.

40. Тикланган бино ва иншоотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олингандан кейин сакланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

#### **X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари**

41. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтда мутаносиб равишда узайтирилади.

42. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда кўп вақтда чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қиладилар.

43. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

#### **XI. Қурилиш тугалланган объектни қабул қилиб олиш**

44. Қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиши тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қодаларига биноан амалга оширилади.

45. Объектни фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 30 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

46. Пудратчи қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибдаги икки нусха ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

47. Қабул қилиб олинган пайдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

#### **XII. Кафолатлар**

48. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;

- лойиха ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;

- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилинишни;

объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини қафолатлайди.

49. Объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг қафолат муддати томонлар қурилиши тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб қаида 1 ой этиб белгиланади. Объект томининг қафолат муддати қаида 12 ой этиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг қафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда қафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига у зайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаларида қаид этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган қафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

51. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш қурилишда Давлат назорати инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича ҳўжалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

### **XIII. Шартномани бекор қилиш**

52. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

- ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортик муддатга кечиктирилган ҳолда,

- пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига рио я этилмаганда;

- пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

- қонун ҳўжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

53. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортик муддатга тўхтатиб қўйилганда;

- буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

- қонун ҳўжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қоидаcига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳўжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

### **XV. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги**

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

- Ўзбекистон Республикаcининг Фуқаролик кодексига, “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаcи Қонунида, бошқа қонун ҳўжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

59. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига рио я қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 % миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 30% фоицидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлашни Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

60. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5% фоици миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50% фоицидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,5% фоици миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50% фоицидан ошмаслиги керак.

Пудратчи бажариш графигада 2021 йил учун белгиланган иш ҳажми қийматининг бажармаган қисмидан Буюртмачига 1 фоици миқдорида жарима тўлайди.

Пеня тўлаш Пудратчинини ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди

61. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, ишчи ҳўжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилишда Давлат назорати инспекцияcининг ҳулосаси асосига объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20% фоици миқдорида ундириш ҳуқуқига эга.

62. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йукотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

63. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тулаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

#### XV. Низоларни ҳал этиш тартиби

64. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низолар масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иккисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

#### XVI. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

65.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни тақлиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар қўрилишига қафолат беради.

66.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган ўзгариш ва қўшимчалар қонуний кучига эга булади. Ўзгариш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

67.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

68.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортикча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

#### XVII. Алоҳида шартлар

69. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг узаро келишувлари ўз кучини йукотади.

70. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

71. Мазкур шартномага барча ўзгариш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

72. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгаришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

73. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунланганидан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

74. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

75. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

76. Мазкур шартнома 31.12.2022 йилгача амал қилади.

#### Буюртмачи:

“Сурхондарё минтақавий йўлларга  
буюртмачи хизмати” давлат унитар  
корхонаси

Термиз шаҳар Олмазор кўчаси 42-уй  
Тел: 221-26-35 Факс 221-19-22

ИНН: 304985647 ОКОНХ: 70220

Ш/х: 30452186022223404512918024

Ҳазначилик бўлинимаси номи: Ўзбекистон  
Республикаси Молия Вазирлиги Ҳазначилиги  
Ҳазна: х/в 23402000300100001010  
ХККМ Тошкент ш. МҲО: 00014  
Ҳазначилик бўлини ИНН: 201122919

Директор

А.Бокиев

#### Пудратчи:

QURILISH RAVON YO'LLAR MCHJ

Шеробод тумани Гуриин Гидамбоб кучаси

ИНН:307906084 ОКЕД

х/р 2020 8000 7053 0472 2001

ТИФ Миллий банк Термиз бўлини

МҲО 00324

Директор:

Б.Каршиев

Ушбу шартнома мазмуни амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, “Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тугрисида”ги қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос ҳолда тузилган.

19.10.2022 йил

Ф.Тураев

Сурхондарё вилояти Шеробод тумани Бойбулок МФЙ Пахтакор, Ғурибулок қишлоқ кўчасини жорий таъмирлаш объектининг \_\_\_\_\_ соғли шартномасига - илова

Сурхондарё вилояти Шеробод тумани Бойбулок МФЙ Пахтакор, Ғурибулок қишлоқ кўчасини жорий таъмирлаш объектининг \_\_\_\_\_ соғли шартномасига - илова

**МОЛИЯЛАШТИРИШ ГРАФИГИ**

Молиялаштириш шартлари	Йиллар	Шу жумладан ойлар												Жами
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Йиллик иш таъмининг ажратилган аванс маблағи	2022 йил						0,0				360 456 598,5			360 456 599
Ажратилган аванс маблағининг оғлақ буйича тақсимланадиган қисми	2022 йил						0,0				360 456 598,5			360 456 599
Ажратилган аванс маблағини инобатга олиб, бажарилган ишларни молиялаштиришга ажратилган маблағ	2022 йил						0				841 065 396,5			841 065 397
<b>Жами</b>	2022 йил		0	0		0	0	0,0		0	1 201 521 995,0	0	0	1 201 521 995
Жами молиялаштирилмаган маблағ														

Бухгалтер



Пудратчи




Сурхондарё вилояти Шеробод тумани Бойбулоқ МФЙ Пахтакор,Гуринбулоқ кишлоқ кучасини жорий таъмирлаш объектининг \_\_\_\_\_сонли шартномасига - илова

Сурхондарё вилояти Шеробод тумани Бойбулоқ МФЙ Пахтакор,Гуринбулоқ кишлоқ кучасини жорий таъмирлаш объектининг \_\_\_\_\_сонли шартномасига - илова

**БАЖАРИШ ГРАФИГИ**

№	Амалга оширилаётган ишлар	Йиллар	2022 йил												Объектининг умумий қиймати
			1-квартал			2-квартал			3-квартал			4-квартал			
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Қурилиш-монтаж ишлари	2022										1 201 521 995,0			1 201 521 995
	Жами		-	-	0,0		0	0	0		-	1201521995	-	-	1 201 521 995

Буюртмачи

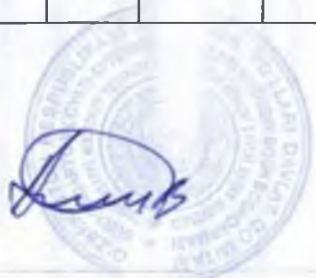

Буюртмачи



**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 124731 на приобретение Шеробод тумани  
Бойбулоқ МФЙ Пахтакор, Ғўринбулоқ қишлоқ кўчасини жорий таъмирлаш**

Способ проведения электронный

Дата 01.08.2022

Время рассмотрения 30.07.2022 19:05

Конкурсная комиссия Surxondaryo mintaqaviy yo`llarga buyurtmachi xizmati DUK (Sherobot) Fond-2020, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Бош мухандис	Сурхондарё МЙБХ
<b>Секретарь комиссии</b>	RAXIMOV SOBIR XUDOYBERDIYEVICH	Булим бошлиги	Сурхондарё МЙБХ
<b>Член комиссии</b>	UMAROV SANJAR INOTOVICH	Лойиха бўлим бошлиғи	Курулиш
<b>Член комиссии</b>	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ
<b>Член комиссии</b>	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ
<b>Член комиссии</b>	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Булим бошлиқ	Сурхондарё МЙБХ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 01.08.2022 года № лота 124731.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог</b>
Подробное описание	Шеробод тумани Бойбулоқ МФЙ Пахтакор, Ғўринбулоқ қишлоқ кўчасини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	1201 521 995.00
Стартовая сумма	1201 521 995.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Машина ва механизмлар рўйхати

Тип: Бинарное значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 5 та дан кам бўлмаган? Кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги қурилиш техникаларининг баллари 30% камайтирилади). Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларини мавжудлиги

Обязательность: Критично



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО QURILISH RAVON YO'LLAR	20	1	20	Экспертная		
GOLD STAR MAX МЧЖ	20	1	19	Экспертная		
TERMIZ SARDOR TRANS MCHJ	20	1	19	Экспертная		
ASL AZIZ FAYZ TERMIZ MCHJ	20	1	19	Экспертная		

Критерий №2 Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Бинарное значение

Описание: "Охириги 3 йил давомида Танловдагига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига N (N- Буюртмачи бошлангич нархнинг 50%) сўм ва ундан кўп. Танлов савдодагига ўхшаш профил бўйича охириги йили ўз кучи билан бажариш. "

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО QURILISH RAVON YO'LLAR	20	1	20	Экспертная		
GOLD STAR MAX МЧЖ	20	1	19	Экспертная		
TERMIZ SARDOR TRANS MCHJ	20	1	19	Экспертная		
ASL AZIZ FAYZ TERMIZ MCHJ	20	1	19	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи

Тип: Бинарное значение

Описание: "Иштирокчининг банкидан картатека йуқлиги хақида маълумот, Солик органларида солиқдан қарзи йуқлиги тугрисида тасдиқланган маълумот, Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги ўтган йилда 20 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги Иш ҳақи фонди 20 млн. сўм Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффициенти 1,25 ва ундан кўп Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффициенти Объектнинг буюртмачи белгиланган бошлангич нархнинг 20 %гача миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги (хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма мабла

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО QURILISH RAVON YO'LLAR	20	1	20	Экспертная		
GOLD STAR MAX МЧЖ	20	1	19	Экспертная		
TERMIZ SARDOR TRANS MCHJ	20	1	19	Экспертная		
ASL AZIZ FAYZ TERMIZ MCHJ	20	1	19	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Бинарное значение

Описание: Танловда иштирок этувчи ташкилот хакида умумий маълумот гувоҳномаси, СОҲАВИЙ ҚУРИЛИШ-ПУДРАТ ТАШКИЛОТЛАРИ РЕЙТИНГИда автомобиль йуллари ва куприкларда рейтинг курсаткичи мавжудлиги.Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги.5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар).Ишлаб-чиқариш техника бўлимида 5 йил иш стажига эга дипломи 1 та мутахассисни мавжудлиги.Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги.Ходим

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО QURILISH RAVON YO'LLAR	20	1	20	Экспертная		
GOLD STAR MAX МЧЖ	20	1	19	Экспертная		
TERMIZ SARDOR TRANS MCHJ	20	1	19	Экспертная		
ASL AZIZ FAYZ TERMIZ MCHJ	20	1	19	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
GOLD STAR MAX МЧЖ	1 201 521 995.00	1 200 000 000.00 UZS	1 200 000 000.00	00.00	1 200 000 000.00	26.07.2022 08:25:33	19.94
ООО QURILISH RAVON YO'LLAR	1 201 521 995.00	1 201 521 995.00 UZS	1 201 521 995.00	00.00	1 201 521 995.00	25.07.2022 18:29:24	19.92
ASL AZIZ FAYZ TERMIZ MCHJ	1 201 521 995.00	1 198 521 995.00 UZS	1 198 521 995.00	00.00	1 198 521 995.00	26.07.2022 08:35:42	19.97
TERMIZ SARDOR TRANS MCHJ	1 201 521 995.00	1 196 521 000.00 UZS	1 196 521 000.00	00.00	1 196 521 000.00	26.07.2022 08:28:29	20

**Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей**

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
GOLD STAR MAX МЧЖ	76	19.94	95.94
ООО QURILISH RAVON YO'LLAR	80	19.92	99.92
ASL AZIZ FAYZ TERMIZ MCHJ	76	19.97	95.97
TERMIZ SARDOR TRANS MCHJ	76	20	96

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 124731 от 01.08.2022 года на приобретение Шеробод тумани Бойбулоқ МФЙ Пахтакор, Ғўринбулоқ қишлоқ кўчасини жорий таъмирлаш определила победителем:

ООО QURILISH RAVON YO'LLAR  
307906084

и резервный исполнитель: TERMIZ SARDOR TRANS MCHJ (303442784)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш бўйича қўшимча чора тadbирлар туғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (шаҳар) ҳокимликлари тасарруфида бўлган ички хужалик йулларида Республика бюджети захира мabлаглари ҳисобида тaъмирлаш ишлари бўйича 2022-йил учун **МАНЗИЛИ РЎЙХАТИ**

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошланган ва тугалланган йили	Лойихавий куватини ушбу йилда бирликлarda	Тaъмирлаш ишларини шартнома сиздаги вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига тaъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига тaъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига тaъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қуйилмалар	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	Буюртмачи харажатлари		Шартномага асосан тaъмирлаш ишлари келгуси йилга утказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	I Пудрат шартномага асосан молиқлаштирилган буйича йилга утказилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Тендер шартномаси тaъмирлаш ишлари ва рақами	Ҳисобнинг санаи ва рақами	Пудратчи таъшиқлотлари		
									шундан,									Буюртмачи харажатлари	Лойиха ва экспертизалар харажатлари							
									Тупроқ бўлини тошга утказиш		Тошдан йулнинг асфальтга утказиш		Цементбетон қоплама ёткичиш		Қуришларни тaъмирлаш											
км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Буюртмачи харажатлари	Лойиха ва экспертизалар харажатлари	№187-Ғ	№187-Ғ	№187-Ғ	№187-Ғ					
193	Вилоят туманлари бўйича жами:	196,735 км <sup>77</sup> км	61 190,091	44 082,683	44 082,683	44 091,946	49 626,491	38 355,201	57,094	1910,5927	115,783	23 498,790	23,858	8 544,564	95 км	3 453,179	1 398,212	535,814	862,398	1 435,893	1 807,863					
13	Ангор тумани	20,800	8 768,422	3 850,284	3 850,284	3 850,284	3238,9	2897,3	12,7	483,9	7,6	2039,5	0,5	0,0	0,0	0,0	119,6	58,0	61,6	76,428	76,384	0,0	0,000			
<b>Захира маблағи</b>																										
1	Жоме масжидга олиб борувчи кўчани туза тaъмирлаш	2021-2022 й	0,500	3 909,270	337,241	337,241	153,800	153,800			0,500	153,800							0,0	0,000	№187-Ғ 23.04.2021 й	№452-2021/472 25.05.2021 й	Ангор ТЙФУК			
2	Илгор МФЙ Мақтаб кўчасини жорий тaъмирлаш	2021-2022 й	1,000	415,8	277,5	277,5	277,5	277,5			1,000	277,5							0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№1779-2021/808 23.08.2021 й	Ангор ТЙФУК			
3	Юкори хужалик МФЙ кўчаларини жорий тaъмирлаш	2021-2022 й	2,350	181,2	128,4	128,4	128,4	120,7	2,4	120,7							7,7	5,1	2,6	0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№531/3р-2021-1 16.09.2021 й	Ангор ТЙФУК		
4	Юкори Таллашон МФЙ ички йулларини жорий тaъмирлаш	2021-2022 й	0,850	69,1	48,5	48,5	48,5	48,472	45,569	0,850	45,569						2,903	1,926	0,976	0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№531/2р-2021-1 16.09.2021 й	Ангор ТЙФУК		
5	Таллашон МФЙ Бунёдкор кўчасини жорий тaъмирлаш	2021-2022 й	1,285	360,3	316,2	316,2	316,2	316,2	307,1			1,285	307,1				9,1	9,1		0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№495-2021/550 27.05.2021 й №495-2021/550	Ангор ТЙФУК		
6	Корасу МФЙ Оббас Фуркат, Хомгон МФЙ А. Темур, Тинчлик, Заит Галимжон МФЙ Хомгон, Ўзбекистон МФЙ Янги қишлоқ, Гулзор МФЙ Уришор, Гулiston, Хомгон МФЙ Тинчлик кўчаларини жорий тaъмирлаш	2021-2022 й	4,135	333,8	127,7	127,7	127,7	127,7	117,7	4,1	117,7						10,000	10,000		0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№897-2021/944 29.09.2021 й	Ангор ТЙФУК		
7	Янги турмуш МФЙ Таъбиркорлар, Деҳқонниғфикс МФЙ Тараққиёт, Каттақум МФЙ Мадиният, Хужалик МФЙ Тинчлик, Тинчлик 1-2, Чинбод МФЙ Фаровон, Новашаҳар МФЙ Мафруққули кўчаларини жорий тaъмирлаш	2021-2022 й	5,388	437,6	209,9	209,9	209,9	209,9	199,914	5,388	199,914						10,000	10,000		0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№894-2021/970 29.09.2021 й	Ангор ТЙФУК		
8	Набхор МФЙ Бобоқулов кўчасини жорий тaъмирлаш	2021-2022 й	0,700	325,3	285,2	285,2	285,2	280,833			0,700	280,833					4,325	4,325		0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№544/1р-2021-1 15.12.2021 й	Ангор ТЙФУК		
9	Илгор МФЙ кўчасига туниги ёритиш чирқолларини уратиш	2021-2022 й	Объект	1 382,5	1 062,5	1 062,5	1 062,5	408,096	373,902								34,194		34,194	0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№532/8р-2021-1 22.11.2021 й	Қириқ ТЙФУК		
10	Тулдон МФЙ, Гулiston МФЙ ички кўчаларини жорий тaъмирлаш	2021-2022 й	1,060	414,8	308,9	308,9	308,9	308,9	291,2		1,1	291,2					17,7	11,7	5,9	0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№515/1р-2021-1 22.09.2021 й	Ангор ТЙФУК		
11	Наврў МФЙ, Баҳор МФЙ ички кўчаларини жорий тaъмирлаш	2021-2022 й	0,895	255,4	65,1	65,1	65,1	65,1	59,2		0,9	59,2					5,9	5,9		0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№532/2р-2021-1 22.09.2021 й	Ангор ТЙФУК		
12	Баҳор МФЙ Баҳор кўчасини жорий тaъмирлаш	2022 й	2,145	683,2	683,2	683,2	683,2	683,225	669,829			2,145	669,829				13,396		13,396	0,0	0,0	№98533 10.06.2022 й	№36737 11.05.2022 й	Ангор ТЙФУК		



















№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ва тугаллаш йили	Лойиҳа ишлари тугаллаш тарихи	Таъмирлаш шартнома шартномаси тузилган умумий қиймати, шу жумладан бу юртимачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан бу юртимачининг бошқа харajatлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан бу юртимачининг бошқа харajatлари	01.01.2021 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан бу юртимачининг бошқа харajatлари	2021 йил қангала қўйилганлар	Шу жумладан:								Бошқа харajatлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бу юртимачининг бошқа харajatлари	Ипудрат шартнома асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бу юртимачининг бошқа харajatлари	Текшерилган объектларнинг қиймати ва расми	Текшерилган объектларнинг қиймати ва расми	Экспертиза саниги ва расми	Ипудрат шартнома асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бу юртимачининг бошқа харajatлари							
									шундан,				шундан,					Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Тупрок йулини тошга утказиш							Тошли йулини асфальтга утказиш	Цементбетон қоплама ётқизиш	Қуриқларини таъмирлаш	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати
									км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум																
1	Хурлик МФЙ Мустақиллик кўчасида Зовур устидан утган кўприкни тула таъмирлаш	2021-2022 й	9 км	1 448,9	796,6	796,6	796,6	727,872	727,872								9 км	727,872			0,0	68,768	№187- F 23.04.2021 й	№6596-2021/654 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК							
2	Дўстлик кўчасидаги Дайғулак кавали устидан утган кўприкни тула таъмирлаш	2021-2022 й	9 км	942,8	396,7	396,7	396,7	351,932	351,037								9 км	351,037	0,895	0,895	0,0	44,796	№187- F 23.04.2021 й	№6598-2021/656 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК							
3	Ешгайрат МФЙ Истиқлол ички йулини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,870	373,1	337,2	337,2	337,2	337,2	326,651		0,870	326,651							10,524	10,524	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№765-2021/776 19.08.2021 й	Шўрчи ТИФУК							
4	Толля МФЙ Толля кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,870	268,0	237,0	237,0	237,0	237,0	225,592		0,870	225,592							11,397	10,362	1,035	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№6889-2021/967 29.09.2021 й	Шўрчи ТИФУК						
5	Олийхўмат МФЙ Марказий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,310	x	x	x	x	141,1				0,3							2,5	2,5	0,0	0,0			Танлов							
6	Сахсонкала МФЙ Янгиобод кўчасини таъмирлаш	2022 й	0,820	x	x	x	x	7,300					0,820						7,300	7,300	0,0	0,0			Танлов							
7	Эгарчи МФЙ А.Темур кўчасини таъмирлаш	2022 й	1,000	x	x	x	x	450,000					1,000						8,800	8,800	0,0	0,0			Танлов							
8	Қуқдам МФЙ Ш.Шамсиев кўчасини таъмирлаш	2022 й	1,085	x	x	x	x	11,696					1,085						11,696	11,696	0,0	0,0			Танлов							
9	Қақан МФЙ Т.Сандов кўчасини таъмирлаш	2022 й	0,945	334,458	334,458	334,458	334,458	334,458	327,900					0,945	327,900				6,558	6,558	0,0	0,0	№119113 19.07.2022 й	№49339 30.06.2022 й	ООО ШЕНОБОД СИТИ HOUSE							
10	Дўстлик, Ойнақўд, Хурлик МФЙ кўчаларидан кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,060					420,000			1,060								8,000	8,000	0,0	0,0			Танлов							
11	Жойилма МФЙ Дўстлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800					56,000			0,800								1,000	1,000	0,0	0,0			Танлов							
12	Бахшита-1 МФЙ Янгиобод кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					21,000			0,300								0,400	0,400	0,0	0,0			Танлов							
13	Бахшита МФЙ Паттабобо кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,435					30,450			0,435								0,600	0,600	0,0	0,0			Танлов							
14	Бахшита-1 МФЙ Боғишамол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					21,000			0,300								0,400	0,400	0,0	0,0			Танлов							
15	Бахшита МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					21,000			0,300								0,400	0,400	0,0	0,0			Танлов							
16	Шолдиқ МФЙ Олмасор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300					21,000			0,300								0,400	0,400	0,0	0,0			Танлов							
17	Қораарик МФЙ Алсор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,400					98,000			1,400								1,900	1,900	0,0	0,0			Танлов							
18	Ойнақўд МФЙ Уртабўз кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,100					77,000			1,100								1,500	1,500	0,0	0,0			Танлов							
19	Олийхўмат МФЙ Янгиобод-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,700					49,000			0,700								0,900	0,900	0,0	0,0			Танлов							
20	Ялти МФЙ Бобур кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,750					52,500			0,750								1,000	1,000	0,0	0,0			Танлов							
21	Ялти МФЙ Олмасор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,250					17,500			0,250								0,300	0,300	0,0	0,0			Танлов							

"КИРИТИЛДИ"  
 "Сурхондарё вилоятидаги  
 йулларга бу юртимачи хизмати"  
 давлат унитар корхонаси директори  
 \_\_\_\_\_ А. Бокиев  
 " " " 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"  
 Сурхондарё вилояти иқтисодий аҳоли ва  
 бош бошқармаси бошлиғи  
 \_\_\_\_\_ Ж. Қаличев  
 " " " 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"  
 Сурхондарё вилоят  
 Молия бош бошқармаси бошлиғи  
 \_\_\_\_\_ Ж. Нормуҳамидов  
 " " " 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"  
 Сурхондарё вилояти иқтисодий тараққиёт  
 ва камбағалликни қисқарттириш бош бошқармаси  
 бошқармаси бошлиғи  
 \_\_\_\_\_ А. Урозов  
 " " " 2022 й.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri , Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:  
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana:08-07-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 50409**

**Obyekt nomi** «Surxondaryo viloyati Sherabod tumani "Boybuloq" MFY ichki yo'lini "Obod qishloq va Obod maxalla" qo'shimcha dasturi asosida 2022 yilda joriy ta'mirlash ishchi loyixasi bo'yicha»

**Buyurtmachi** - "Surxondaryo viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK

**Bosh loyihachi** - "Janub yo'l loyiha " MChJ

**Litsenziya** AL-000657 sonli 02.04.2020 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan

**Moliyalashtirish manbai** - Budget mablag'lari

**Bosh pudratchi** - Erkin tanlov savdolarida aniqlanadi

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 49217

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18-martdagi PQ-172-sonli "Obod-kishlok" va "Obod-maxalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan.

1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ish xajimlari qaydnomasi.

1.3. Buyurtmachining tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan loyixa topshirig'i.

1.4. Surxondaryo viloyati avtomobil yo'llari xududiy bosh boshqarmasi va Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan qurilish ishchilarining ish haqqi, mashina va mexanizmlarning ekspluatatsiyasi, tovarlarni tashish, qurilish materiallari, pudratchining boshqa xarajatlari narxlari kelishuv bayonnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

Ish xajimlari qaydnomasiga asosan ishlab chiqilgan smeta xujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Ushbu loyiha, Surxondaryo viloyati Sherabod tumani "Boybuloq" MFY ichki yo'lini "Obod qishloq va Obod maxalla" qo'shimcha dasturi asosida 2022 yilda 1,900 km qismini joriy ta'mirlash ishlari amalga oshirish rejalashtirilgan.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ish xajimlari qaydnomasiga asosan, joriy ta'mirlashda ko'chalar

kesimida:

“Bobotepa” Paxtakor yo’nalishi ko’chasi  $L=1,200$  km  $B=4,0$ m bo’lib quyidagi ishlar bajarilishi lozim,

- QshA va 30% Chaqiq-tosh aralashmasidan 25 sm asos qatlam yotqizish
- Sementbeton qoplama ostidan polietilen plyonka to’shash ishlarini bajarish.
- B 20 markali sementbetondan 14sm qalinlikda kompozit armatura to’r(4/4 200/200 ASK 4) ustidan qoplama to’shash, yo’l chetini 10 sm qalinlikda QShA yordamida mustaxkamlash.

“G’o’rin buloq” ko’chasi  $L=0,700$  km  $B=4,5$ m bo’lib quyidagi ishlar bajarilishi lozim,

- QshA va 30% Chaqiq-tosh aralashmasidan 22 sm asos qatlam yotqizish
- Sementbeton qoplama ostidan polietilen plyonka to’shash ishlarini bajarish.
- B 20 markali sementbetondan 14sm qalinlikda kompozit armatura to’r(4/4 200/200 ASK 4) ustidan qoplama to’shash, yo’l chetini 10 sm qalinlikda QShA yordamida 1,0 m kenglikda mustaxkamlash.

### 3.1. Ta’mirlesh ishlarning davomiylik muddati

Ta’mirlesh ishlarining davomiylik muddati 60 kunni tashkil qiladi.

### 4. Loyihalanayotgan ob’ektning muhandislik ta’minoti:

### 5. Loyihani kelishilganligi to’g’risida hujjatlar.

### 6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida (lokal) ekspert xulosaning izohlariga muvofiq ishchi loyixani quyidagi asosiy tuzatishlar va qo’shimchalar kiritildi:

- Narxlar buyurtmachining qurilish materiallari va mashina mexanizm narxlari bayonnomasiga asosan to’g’irlandi
- Buyurtmachining boshqa xarajatlari aniqlashtirildi va to’g’irlandi.

### 6.2. Ta’mirlesh narxi sarxisobi:

Taqdim etilgan loyixani qurilish ishlari qiymati QQS (qo’shimcha qiymat solig’i) bilan **1 267 070,127ming so’mni** tashkil qilgan bo’lib, ekspertiza natijasiga ko’ra, taqdim etilgan qiymati **5 472.032 ming so’m** miqdorida kamaytirilib **1 261 598.095 ming so’mga** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, shu jmladan:

- Qurilish montaj ishlari- 1 044 801,735 ming so’m,
- Qo’shilgan qiymat solig’i - 156 720,260 ming so’m,
- Buyurtmachining boshqa xarajatlari - 60 076,100 ming so’m.

Ob’ektning umumiy qiymati ichida ko’chalar kesimidagi qiymati:

ming.so’mda

N p.p	Yo’llar nomi	Smeta bo’yicha jami	buyurtmachi b/x
1	“Bobotepa” Paxtakor yo’nalishi ko’chasi $L=1,2$ km	<b>774 849,624</b>	36 897,601
2	“G’o’rin buloq” ko’chasi $L=0,700$ km	<b>486 748,471</b>	23 178,499
<b>Jami</b>		<b>1 261 598,095</b>	<b>60 076,100</b>

6.3. Ushbu joriy ta’mir ishchi loyihasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ish xajimlari qaydnomasiga asosan tekshirildi va “Shaxarsozlik hujjatlari ekspertizasi” DUK nuqsonlar qaydnomasida keltirilgan ish xajimlarining haqqoniyliigi va asosligiga javobgarlikni o’z zimmasiga olmaydi.

6.4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-ilovasiga muvofiq ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan xujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchiligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyixa yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

## **7. Xulosalar.**

7.1. Ekspertiza natijalarini xisobga olgan holda "Surxondaryo viloyati Sherabod tumani "Boybuloq" MFY ichki yo'lini "Obod qishloq va Obod maxalla" qo'shimcha dasturi asosida 2022 yilda joriy ta'mirlash ishchi loyixasi bo'yicha qiymatini kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya qilinadi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 6 martdagi 261 sonli qaroriga va ShNK 04.01.06-09 asos tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

**Bosh mutaxassis:** MAXMUDOV ISMOIL SOATQUL O'G'LI
