

**Лойиха-смета ҳужжатларини тайёрлаш ишларини бажариш учун  
110-сонли Ш А Р Т Н О М А**

Наманган ш.

“16” 11 \_\_\_\_\_ 2022 йил

Бундан буён “Буюртмачи” деб аталувчи “Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК номидан Низом асосида иш юритувчи директор **О.О.Назаров** биринчи томондан ва иккинчи томондан “Бажарувчи” деб аталувчи “Наманганйўлойиха институти” МЧЖ директори **Н.Ахмедов** орқали Ўзбекистон Республикаси қонунларига асосан қуйидаги шартномани туздилар:

### 1. Шартнома предмети

1.1. “Буюртмачи” Наманган вилояти Наманган тумани **Ғайрат МФЙ Беруний кўчаси 1,5 км ва Азиз кўчаси 1,5 км жами 3 км қисмини асфальтлаш** ишларига асосан жорий таъмирлаш ишчи лойиха-сметаси ва экспертизадан ўтказиш ишларини топширади, “Бажарувчи” эса ўз зиммасига олади.

### 2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қоидалари

2.1. Ишларни амалга оширишнинг шартнома баҳоси ҚҚС билан **33 200 000 (Уттиз'уч миллион икки юз минг)** сўмни ташкил қилади.

2.2 “Буюртмачи” 10 (ўн) банк куни ичида шартнома баҳосининг 30% миқдорда аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Ишлар қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда ёки ишлар ҳажми “Буюртмачи” томонидан ўзгартирилганда шартнома баҳоси ўзгартирилиши мумкин.

### 3. Томонлар мажбуриятлари

3.1. “Бажарувчи” ишларни шартнома газначилик бошқармасидан руйхатдан утгандан сунг 30 кун муддатда бажаришни ўз зиммасига олади.

3.2. “Бажарувчи” лойиха смета ҳужжатлари қайта ҳисоблангандан сўнг лойиха ҳужжатларини экспертизадан ўтказишда иштирок этишни ўз зиммасига олади.

3.3. “Буюртмачи” ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни “Бажарувчи”нинг сўрови асосида тақдим қилиши шарт.

3.4. “Буюртмачи” шартномада кўзда тутилган шартлар ва тартиблар асосида тўловни амалга ошириш, ишларнинг шартномада кўрсатилган ҳажм ва шартларга мувофиқ бажарилишида “Буюртмачи” томонидан бажарилиши зарур бўлган ишларни бажариш, бажарилган ишлардан шартномада кўзда тутилган мақсадларда фойдаланишни ўз зиммасига олади.

“Буюртмачи” томонидан аванс тўлов ўз вақтида ўтказилмаган ҳолда ёки ишни амалга ошириш учун зарур бўлган бирламчи маълумотлар ва материалларни “Бажарувчи”нинг талабига асосан тақдим этмаганида ишларни бошлаш ва тугаллаш муддати ҳам аванс тўлови ва маълумотлар берилиши кечиктирилган вақтга қадар узайтирилади.

### 4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

4.1. Ишлар тугагандан сўнг “Бажарувчи” “Буюртмачи”га ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан топширади.

4.2. “Буюртмачи” ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномасини олгандан сўнг 10 кун мобайнида ишларни қабул қилиш ва “Бажарувчи”га имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборишни ўз зиммасига олади.

Агар “Буюртмачи” ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 кун муддат ичида “Бажарувчи”га камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини

юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда “Буюртмачи” ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини “Бажарувчи”га қайтариши шарт.

4.3. “Буюртмачи” ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун ичида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт. Ишларнинг тўхтатилиши томонлар учун Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексида кўзда тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади.

4.5. Томонлардан бири мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни тўхтатиш тўғрисида ёзма хабар берган вақт ўзаро ҳисоб-китоб қилиш вақти ҳисобланади.

4.6. Лозим топилган ҳолларда томонлар ҳолис экспертларга Лойиха бўйича ҳулоса учун мурожаат қилиши ёки қабул комиссияси ташкил қилиши мумкин.

## **5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш**

5.1. Ишлар бажарилиши даврида “Бажарувчи” ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни “Буюртмачи”дан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

## **6. Қўшимча шартлар**

6.1. “Бажарувчи” ишларни муддатидан олдин бажарган ҳолда, “Буюртмачи” уни мазкур шартноманинг 4-моддасига асосан қабул қилади ва тўла тўловни амалга оширади.

6.2. Шартномага томонлар розилиги асосида, ёзма равишда ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилиши мумкин.

6.3. “Бажарувчи” мазкур шартномада кўрсатилган ишларни бажариш вақтида ўз имкониятларидан келиб чиқиб, “Буюртмачи”ни хабардор қилмаган ҳолда учинчи шахсларни, жумладан юридик ва жисмоний шахсларни мустақил равишда жалб қилиш ҳуқуқига эга.

Мазкур шартноманинг шартлари шартнома предмети бўйича тарафларнинг шартнома тузишидан олдин вужудга келган муносабатларига ва “Бажарувчи”нинг объект бўйича бажарган ишларига нисбатан қўлланилади.

6.4. Мазкур шартнома амал қилиш давомида юзага келадиган тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йўли билан ҳал этилади.

Келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар Иқтисодий судда эътироз тартибига риоя қилган ҳолда кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз билдирилган томон олганидан кейин 1 (бир) ой муддатни ташкил этади. Мазкур шартнома бўйича низо келиб чиққан ҳолларда қонунда белгиланган тартибда ҳал қилинади.

6.5. “Буюртмачи” томонидан дастлабки тўлов ва “Бажарувчи” томонидан ишлар топширилганда шартлашилган ҳақи кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,2 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси шартнома баҳосининг 30 (ўттиз) фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш “Буюртмачи”ни тўловнинг кечикиши ёки хизматлар, ишларнинг асоссиз қабул қилинмаганлиги туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

6.6 Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига, хусусан Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юригувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий – ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикасининг қонунига мувофиқ белгиланади.

6.7. Шартнома ўзбек тилида икки нусхада тузилди ва ҳар иккала нусхаси ҳам бир хил юридик кучга эга бўлади.

6.8. Шартнома 31.12.2022 йилга қадар амал қилади.

6.9. Шартномага қўйидагилар илова қилинади:

- \* Шартнома баҳосини келишув баённомаси (1-илова)
- \* Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишни бажариш ва молиялаштириш жадвали. (2-илова)

## 7. Томонларнинг манзили ва ҳисоб рақамлари

### «БУЮРТМАЧИ»

"Наманган минтакавий йулларга буюртмачи хизмати" давлат унитар корхонаси  
Манзил: Наманган шаҳар Саноат кўча 19-уй  
ШХР: \_\_\_\_\_  
ИНН 304 893 929, ОКОНХ: 71120  
Ўзбекистон Республикаси Молия  
Вазирлиги Ғазначилиги  
х/р: 23 402 000 300 100 001 010  
МФО: 00014, ИНН: 201 122 919  
Банк: ХККМ МБ Тошкент шаҳри Бош  
бошқармаси

Директор \_\_\_\_\_

О.Назаров

Ҳуқуқшунос \_\_\_\_\_

### «БАЖАРУВЧИ»

«Наманган йуллойиҳа институти» МЧЖ  
Манзил: Наманган шаҳар Саноат куча 20  
х/р: 2020 8000 4002 0838 0001  
Банки: Узсаноатқурилишбанк Бош офиси  
Тошкент шаҳри. МФО: 00440  
ИНН: 200047379 ОКОНХ: 66 000  
ОКЭД: 71110

Директор: \_\_\_\_\_

Н.Ахмедов

Ҳуқуқшунос \_\_\_\_\_

2022 йил " 16 " 11 даги  
110 -соили шартномага  
2 -илова

Наманган вилояти Наманган тумани Гафрат МФЙ Бериш кўчаси 1,5 км ва Азиз кўчаси 1,5 км жами 3 км қисмини  
асфальтлаштиришнинг лойиҳа-смета ва экспертизадан ўтказиш учун


### БАЖАРИШ ВА МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

№	Бажариладиган ишларнинг номи	Қиймати	Бажариш		Молиялаштириш муддати
			муддати	қиймати	2022 йил
	Аванс миқдори				9 960,000
1	Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш	33 200,000	2022 йил 08 кун	33 200,000	23 240,000
	<b>Жами:</b>	<b>33 200,000</b>		<b>33 200,000</b>	<b>33 200,000</b>

Буюртмачи



Бажарувчи



**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 179578 на приобретение Наманган тумани Ғайрат МФЙ Беруний кўчаси 1,5 км ва Азиз кўчаси 1,5 км жами 3 км қисмини асфальтлашишларини лойиха-смета ва экспертизадан ўтказиш учун**

Способ проведения электронный

Дата 12.11.2022

Время рассмотрения 12.11.2022 00:11

Закупочная комиссия Наманган минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	Назаров Одилжон Олимжанович	директор	Наманган МЙБХ ДУК
<b>Секретарь комиссии</b>	Хабибуллаев Икромжон Нематуллаевич	мутахассис	Наманган МЙБХ ДУК
<b>Член комиссии</b>	Боёзов Дилшод Адхамжонович	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
<b>Член комиссии</b>	Алиматов Жасурбек Абдумаликович	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
<b>Член комиссии</b>	Ахмедов Нозим Носирович	бош муҳандис	Наманган МЙБХ ДУК
<b>Член комиссии</b>	Хакимбаев Ойбек Орифович	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
<b>Член комиссии</b>	Инамов Илхомхўджа Исломхўжаевич	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
<b>Член комиссии</b>	Тожибаев Акмалжон Алишерович	бош ҳисобчи	Наманган МЙБХ ДУК

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 12.11.2022 года № лота 179578.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по проведению экспертизы проектно-сметной документации
Подробное описание	Наманган тумани Ғайрат МФЙ Беруний кўчаси 1,5 км ва Азиз кўчаси 1,5 км жами 3 км қисмини асфальтлашишларини лойиха-смета ва экспертизадан ўтказиш учун
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	33 894 000.00
Стартовая сумма	33 894 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 1. Танлов таклифини таъминлаш тўғрисида декларация. 2, Лойиҳалаш (Курилиш) майдонини кўрганлик ва лойиҳани ўрганганлик тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: 1, Танлашда иштирок этиш буюртмасига декларация бўлмаганда таклиф кўриб чиқилмайди ва ҳужжатларнинг 2-йиғма жилди очилмасдан оферентга қайтарилади. 2, Қурилиш майдонини кўрганлиги ва ўрганиб чиқилганлиги Мухандислик коммуникацияларини ўрганиб чиққанлиги (МФЙ раисининг тасдиғи (имзо, мухр))

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
“NAMANGAN YO‘L-LOYIHA BYUROSI” МЧЖ	10	10	5	Экспертная		
НАМАНГАНЙУЛЛОЙИХА ИНСТИТУТИ МЧЖ	10	33200000	5	Экспертная		

Критерий №2 Лойихачи ташкилотнинг ташкилий структураси ва умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилот тўғрисида умумий маълумот Ташкилий структура. Иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли лойихалаш мутахассислигига эга бўлган раҳбарлардан 1 киши, Дипломли 5 йил иш стажига эга 2 кишидан иборат инженер-техник ходимлар, (ГИП, ГАП ) Доимий равишда ишловчи 10 та малакавий лойихачи мутахассислар Доимий равишда ишловчи 10 йиллик иш стажига эга 4 та малакавий лойихачи мутахассислар мавжудлиги(барча ходимлар бўйича тасдиқловчи ҳужжатлар: паспорт, диплом ва меҳнат дафтарчаси копиялари илова қилинади)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
“NAMANGAN YO‘L-LOYIHA BYUROSI” МЧЖ	25	25	25	Экспертная		
НАМАНГАНЙУЛЛОЙИХА ИНСТИТУТИ МЧЖ	25	33200000	25	Экспертная		

Критерий №3 Танлаш иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари, салоҳияти ( 2019-2020-2021 йиллар бўйича) тўловга қодирлиги ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш фондининг қиймати 100 млн. сўмгача ва ундан кўп Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги (Солиқдан қарздорлиги мавжуд эмаслиги ва муддати ўтган қарздорлик мавжуд эмаслиги тўғрисидаги маълумотлар илова қилинади) Ўтган йилда 20 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги Тўловга қодирлик коэффициенти ижобийлиги

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
“NAMANGAN YO‘L-LOYIHA BYUROSI” МЧЖ	20	20	20	Экспертная		
НАМАНГАНЙУЛЛОЙИХА ИНСТИТУТИ МЧЖ	20	33200000	20	Экспертная		

Критерий №4 Мавжуд оргтехника (компьютер, принтер, лойихалаш дастурлари ) ва бошқалар рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 5 та дан кам бўлмаган охирги 10 йилликда ишлаб чиқарилган компьютерлар мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги лойиҳа техникаларининг баллари 50% камайтирилади) Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган оргтехника воситаларини (принтерлар , плоттерлар, ксерокопия ва сканерлар ) мавжудлиги\*\* Лойиҳалаш программалари: - "Auto Cad"-2007-2020 - "Corel Draw X3-2005" - "3D MAX" - "Lira 9.4" - Смета программалари Мавжуд хизмат машиналари

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>"NAMANGAN YO'L-LOYIHA BYUROSI" МЧЖ</b>	20	20	20	Экспертная		
<b>НАМАНГАНЙУЛЛОЙИХА ИНСТИТУТИ МЧЖ</b>	20	33200000	20	Экспертная		

Критерий №5 Танлаш иштирокчисининг лойиҳалаш ишлари бўйича бажарган иш тажрибаси. Лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида ёрдамчи лойиҳа ташкилотни жалб қилиш тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлашда қўйилган объектга ўхшаш бўлган объектларни ЛСХсини бажариш: йилига N (N- кейинги икки йилда йилига 1та ва ундан кўп ), Бир йилда 10 тадан кам бўлмаган объектларнинг ЛСХни тайёрлаганлик Йўл қурилиши соҳаси объектлари ЛСХсини бажарилиши. Танлаш таклифларини баҳолашда ёрдамчи лойиҳачи ташкилотлардан жалб этилган машина ва механизмлар ҳисобга олинмайди

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>"NAMANGAN YO'L-LOYIHA BYUROSI" МЧЖ</b>	25	25	25	Экспертная		
<b>НАМАНГАНЙУЛЛОЙИХА ИНСТИТУТИ МЧЖ</b>	25	33200000	25	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>НАМАНГАНЙУЛЛОЙИХА ИНСТИТУТИ МЧЖ</b>	33 894 000.00	33 200 000.00 UZS	33 200 000.00	00.00	33 200 000.00	10.11.2022 20:00:33	10
<b>"NAMANGAN YO'L-LOYIHA BYUROSI" МЧЖ</b>	33 894 000.00	33 500 000.00 UZS	33 500 000.00	00.00	33 500 000.00	10.11.2022 18:42:15	9.91045

**Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей**

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>НАМАНГАНЙУЛЛОЙИХА ИНСТИТУТИ МЧЖ</b>	85.5	10	95.5
<b>"NAMANGAN YO'L-LOYIHA BYUROSI" МЧЖ</b>	85.5	9.91045	95.41045

BYUROSIF MЧЖ			
--------------	--	--	--

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 179578 от 12.11.2022 года на приобретение Наманган тумани Ғайрат МФЙ Беруний кўчаси 1,5 км ва Азиз кўчаси 1,5 км жами 3 км қисмини асфальтлашишларини лойиха-смета ва экспертизадан ўтказиш учун определила победителем:

НАМАНГАНЙУЛЛОЙИХА ИНСТИТУТИ МЧЖ  
200047379

и резервный исполнитель: "NAMANGAN YO'L-LOYIHA BYUROSIF" МЧЖ (306918884)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	Назаров Одилжон Олимжанович	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	Боёзов Дилшод Адхамжонович	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	Алиматов Жасурбек Абдумаликович	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	Ахмедов Нозим Носирович	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	Хакимбаев Ойбек Орифович	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	Тожибаев Акмалжон Алишерович	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	Инамов Илхомхўджа Исломхўжаевич	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



## МУХОКАМА АХБОРОТИ

110

16.11.2022 йил

Наманган шаҳри

Наманган вилояти ҳудудидаги Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК томонидан 11.11.2022 йилдаги 179578-сонли лотга асосан Ўзбекистон Республикасининг 22.04.2021 йилдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 56 ва 58 – моддалари талабларидан келиб чиқиб энг яхши таклифларни танлаш тури бўйича **Наманган тумани Ғайрат МФЙ Беруний кўчаси 1,5 км ва Азиз кўчаси 1,5 км жами 3 км қисмини асфальтлаш ишларини лойиха-смета ва экспертизадан ўтказиш учун харидлар амалга оширилиши режалаштирилган.** Шунга асосан белгиланган муддатлар асосида Ўзбекистон Республикасининг 22.04.2021 йилдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни – 60 ва 61-моддалари талабларидан келиб чиқиб танлов савдолари ўтказилди. Мазкур танлов савдолари якуни бўйича **"Наманган йўллойиха институти" МЧЖ** томонидан берилган таклифлар комиссия аъзолари иштирокидан энг мақбули деб топилди. Ушбу танлов жараёнлари бўйича расмийлаштирилган баённомалар “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 62-моддасига асосан давлат буюртмачиси томонидан у расмийлаштирилган кунда давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Шунга асосан икки иш кун ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмади. Юқоридаги ҳолатлардан келиб чиқиб, давлат буюртмачиси ва харид комиссияси томонидан ғолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкин ҳисобланиши белгилаб олинди. Муҳокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътирозлар харид комиссияси томонидан кўриб чиқилмайди.

**Наманган Минтақавий йўлларга  
буюртмачи хизмати ДУК директори:**




**О.Назаров**

**Корхона бош ҳисобчиси**



**А.Тожибаев**





"ТАСДИКЛАЙМАН"

Наманган вилоят ҳокимининг  
хаттаматининг  
қўриб чиқариши

С.Султанов

2022 й.

"ТАСДИКЛАЙМАН"

Наманган вилоят автомобиль йўллари  
худудий бош бошқармаси бошлиғи

А.Хамламов

2022 й.л.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сон қарори 1- иловаси ва Наманган вилояти Халқ Депутатлари Кенгашининг 2022 йил 3 ноябрдаги VI-34-133-6-0-К/22 қарори 1- иловасига асосан Наманган вилоятида 2022 йилда аҳолини узоқ йиллардан бўён қийнаб келаётган муаммоларини бартараф этиш бўйича қўшимча лойиҳа-қидирув ишлари учун

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

№	Лойиҳалаштриладиган объект номи ва манзили	Лойиҳалаштриладиган объект куввати (мос қиматларда)	Қуралниш ишлари бошланниш ва тугаш йили	Қурилишнинг тахминий ҳисобланган умумий қиймати	Лойиҳа босқичи ДТИА, ДТТИХ, ТИХ, ИЛ, ТИ, ДТТИХ, ТИХ, ИЛ, ТИ, ТХ	ЛҚИнинг объектлар бўйича қиймати	2022 йил 1 январь ҳолатига ЛҚИнинг қолдиқ қиймати	2022 йилда қўлга олинган ЛҚИ	ЛҚИ ларини буюртманга томонидан тасдиқлаштириш муддатлари	Лойиҳалаштриш учун асос, (ВМ) қарорлари, Фармойишлари, топириқлари ва х.к.)	Лойиҳаловчи институт номи	
1	Наманган шаҳри	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Лойиҳалаштриладиган объект номи ва манзили											
1	"Оби хаёт" МФЙ "Ибрат" кўчаси, 1-ўтиш йўлидаги 1,0 км ички йўлни асфальтлаш.	1,00	2022-2023	600,0	ИЛ	11,408			11,408	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
2	Бўстон МФЙ Тошкент кўчаси 0,4 метр, 2-3-4 ўтиш йўли Тошкент кўчалари 0,6 метр, Шохимардонов кўчаси 0,1 метр, 5 ўтиш йўли Шохимардонов кўчаси 0,2 км, 1 ўтиш йўли Шохимардонов кўчаси 0,1 км, жами 1,4 км кўчаларини асфальтлаш.	1,40	2022-2023	840,0	ИЛ	15,980			15,980	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
3	Марғилон МФЙ худудида 0,5 км ички йул асфальтлаш	0,50	2022-2023	300,0	ИЛ	5,695			5,695	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
4	Янги йул МФЙ Темир йул кўчаси, 0,7 км 7-Темир йул кўчаси 0,130 км асфальтлаш	0,83	2022-2023	450,0	ИЛ	8,551			8,551	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
5	Олтишо МФЙ Янги арик кўчасига 1,5 км асфальтлаш	1,50	2022-2023	825,0	ИЛ	15,694			15,694	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
6	Мажнунтол МФЙ М.Рахимов 1-ўтиш йули кўчасида 0,7 км асфальтлаш	0,70	2022-2023	380,5	ИЛ	7,227			7,227	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
7	Марғилон МФЙ худудида 0,2 км асфальтлаш	0,20	2022-2023	110,0	ИЛ	2,075			2,075	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида

млн.сўм



№	Лойihalаштирилган объект номи ва манзили	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Лойihalаштирилган объект куввати (мос киникларда)	Курлиш ишари бошланиш ва тугаш йили	Курлишнинг тахминий хисобланган умумий киникати	Лойиха босқичи ДТИА, ТИА, ДТТХ, ТИХ, ИЛ, ИХ, ТХ	ЛКНнинг объектар бўйича киникати	2022 йил 1 январь холатида бажарилган ЛКН	2022 йил 1 январь холатида ЛКН нини коллик киникати	2022 йилда кутурилатган ЛКН	ЛКН ларинин бююртмачига топириш, бююртмачи нини топириш тасдикланиш муддатлари	Лойihalаштириш учун Фармойишлари, асос, (ВМ карорлари, топириктари ва х.к.)	Лойihalачи инстиут номи
1	2											
17	Куйи Ровустон МФЙ Ёш кахрамон, Янги арик ва Акси кўчаларини 2 км қисмини асфальтлаш.	2,00	2022-2023	1100,0	ИЛ	20,932	20,932		20,932	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
18	Навабахор МФЙ Боғ кўчасини 4 км қисмига цемент-бетон қоплама ётқиизиш.	4,00	2022-2023	3000,0	ИЛ	88,994	88,994		88,994	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
19	Ўрта Ғирвон МФЙ Ш.Қори кўчаси 0,6 км, Н.Рахимов 0,6 км, М.Ахмаджон 0,5 км ва Х.Қаххаров 0,3 км кўчаларини асфальтлаш.	2,00	2022-2023	1100,0	ИЛ	20,932	20,932		20,932	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
20	Куйи Ғирвон МФЙ Абдусамат Қаюмов, Янгиарик ва Майна Хасанова кўчаларини жами 2 км қисмини асфальтлаш.	2,00	2022-2023	1100,0	ИЛ	20,932	20,932		20,932	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
21	Ўрта Ровустон МФЙ Анорзор, Шабнам ва Курмак кўчаларини 2,5 км қисмини асфальтлаш.	2,50	2022-2023	1375,0	ИЛ	26,170	26,170		26,170	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
22	Тўқувчи МФЙ Аэропорт-1 кўча ва Аэропорт-8 кўчаларини 2 км қисмини асфальтлаш.	2,00	2022-2023	1100,0	ИЛ	20,932	20,932		20,932	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
	жами:	14,50		8775,0		198,892	198,892		198,892			
	Минибулук тумани											
23	"Бешсерка" МФЙ Амир Темур кўчасини 1,3 км қисмини асфальтлаш	1,30	2022-2023	600,0	ИЛ	11,408	11,408		11,408	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
24	Ўзғариш МФЙ "Нурли йўл" кўчаси 0,550 км қисмини асфальтлаш	0,55	2022-2023	300,0	ИЛ	5,694	5,694		5,694	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
25	Қўғалиқул МФЙ Ёшлик кўчаси 2,5 км қисмига цемент-бетон қоплама ётқиизиш.	2,50	2022-2023	1875,0	ИЛ	55,608	55,608		55,608	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
26	Бирлашган МФЙ Момохон кўчаси 2 км ва Ардокли кўчаси 1 км қисмига цемент-бетон қоплама ётқиизиш.	3,00	2022-2023	2100,0	ИЛ	62,285	62,285		62,285	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида

№	Лойхалаштирилган объект номи ва манзили	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Лойхалаштирилган объект куввати (мос кийматларда)	Курлиш шари бошланш ва тугаш йили	Курлишнинг тахминий хисобланган умумий киймати	Лойха босқичи ДТН, ТНА, ДТНХ, ТИХ, ИЛ, ИХ, ТХ	ЛКИнинг объектлар бўйича киймати	2022 йил 1 январь холатида бажарилган ЛКИ	2022 йил 1 январь холатида ЛКИнинг коллик киймати	2022 йилда кутилаётган ЛКИ	ЛКХ ларнинг буюртмачига топширилган буюртмачи томонидан тасдиқланган мудатлари	Лойхалаштириш учун асос. (ВМ қарорлар, фармойишлари, топшириқлари ва х.к.)	Лойхаловчи институт номи
1	2											
27	Бозорбоши-МФЙ Заридор-1 ва Заридор-2 Сарбон кўчаларини асосий йўлларини 6 км қисмини қартасимон асфальтлаш	6,00	2022-2023	800,0	ИЛ	15,218			15,218	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
28	Мадияровул МФЙ Махалла марказидаги 1,5 км йўлни асфальтлаш.	1,50	2022-2023	750,0	ИЛ	14,266			14,266	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
29	Козоқовул МФЙ Гулистон кўчасида 1 км йўлни шағаллаш	1,00	2022-2023	160,0	ИЛ	3,027			3,027	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
30	Бешсерка МФЙ Амир Темура кўчасини 3,9 км қисмини шағаллаш	3,90	2022-2023	500,0	ИЛ	9,504			9,504	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
31	Ўзгариш МФЙ "Наврўз", "Олмазор", "Шифокор", "Сардор", "Самарқанд" ва "Хамид Олимжон" кўчаларини 2,7 км қисмини шағаллаш.	2,70	2022-2023	500,0	ИЛ	9,503			9,503	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
32	Кўғалиқул МФЙ Полволтўпи кўчасини 1,1 км қисмини шағаллаш.	1,10	2022-2023	200,0	ИЛ	3,789			3,789	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
33	Ойбек МФЙ худудидаги 9 та кўчаларни жами 5,6 км қисмини асфальтлаш.	5,60	2022-2023	3080,0	ИЛ	91,367			91,367	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
	жами:	29,15		10865,0		281,669			281,669			
	Косонсой тумани											
34	Хонкўрғон МФЙ "Қайтмас" кўчасини 3 км қисмини асфальтлаш	3,00	2022-2023	1800,0	ИЛ	53,383			53,383	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
35	А.Навой МФЙ Халқлар дўстлиги кўчасини 2 км қисмига цемент-бетон коплама ётқизиш	2,00	2022-2023	1200,0	ИЛ	22,837			22,837	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
36	С.Шерозий МФЙ "Сарчашма" ва "Олтиндиёр" кўчаларини 2,5 км қисмини асфальтлаш	2,50	2022-2023	1625,0	ИЛ	30,932			30,932	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
37	Ўрта кўча МФЙ худудидаги жами 2,6 км ички кўчаларни асфальтлаш	2,60	2022-2023	1560,0	ИЛ	29,694			29,694	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида

№	Лойihalаштирилган объект номи ва манзили	Лойihalаштирилган объект куввати (мос киматларда)	Курлиш шари бошланиш ва тугаш йили	Курлишнинг тахминий хисобланган умумий кимати	Лойика босқичи ДТИА, ТИА, ДТИХ, ТИХ, ИЛ, ИХ, ТХ	ЛКИнинг объектлар бўйича кимати	2022 йил 1 январь холатида бажарилган ЛКИ	2022 йил 1 январь холатида ЛКИнинг кодлик кимати	2022 йилда кўтилган ЛКИ	ЛСХ ларини буюртмачига топшириш тасдиқланган бўйича топишган мулатлари	Лойihalаштириш учун Фармойишлари, асос, (ВМ карорлари, топширқари ва х.к.)	Лойihalаштириш нотибонини нотибонини танлов асосида
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	С.Шерозий МФЙ худудидаги жами 0,8 км ички кўчаларни шагаллаш.	0,80	2022-2023	120,0	ИЛ	2,265			2,265	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
39	М.Аъзам МФЙ худудидаги 0,700 км ички йўлни шагаллаш.	1,10	2022-2023	165,0	ИЛ	3,122			3,122	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
40	Озод МФЙ Боғ кўча ва Гумбаз кўчаларини 2 км қисмини шагаллаш.	2,00	2022-2023	300,0	ИЛ	5,694			5,694	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
41	Мовароуннахр МФЙ Кўкалам кўчасини 2 км қисмини шагаллаш.	2,00	2022-2023	300,0	ИЛ	5,694			5,694	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
42	Боғишамол-1 МФЙ Хумхона-1, Олтин мерос ва Хумхона кўчаларини 3 км қисмини шагаллаш.	3,00	2022-2023	450,0	ИЛ	8,551			8,551	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
43	Ўрта кўча МФЙ худудида 3,3 км қисмини шагаллаш. (Д-100 мм.ли 1,5 км, Д-75 мм.ли 1,8 км, қисмига сув тортилгандан сўнг)	3,30	2022-2023	495,0	ИЛ	9,408			9,408	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
	жами:	22,30		8015,0		171,580			171,580			
	Наманган тумани											
44	Кўл буйи МФЙ Наманган ва Чек кўчаларида жами 2,3 км қисмини асфальтлаш	2,30	2022-2023	1265,0	ИЛ	24,075			24,075	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
45	Ғайрат МФЙ Беруний кўчаси 1,5 км ва Азиз кўчаси 1,5 км жами 3 км қисмини асфальтлаш	2,00	2022-2023	1800,0	ИЛ	53,383			53,383	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
46	Тева Қиёт МФЙ худудидаги 3 км ички йўлларни асфальтлаш	3,00	2022-2023	1650,0	ИЛ	31,408			31,408	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
47	Кичик курама МФЙ Шимолий Фаргона кўчасини 1,5 км қисмини асфальтлаш	1,50	2022-2023	825,0	ИЛ	15,694			15,694	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
48	Миришкор МФЙ худудидаги 3 км ички йўлларни асфальтлаш	3,00	2022-2023	1650,0	ИЛ	31,408			31,408	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
49	Маллаховуз МФЙ худудидаги 3,1 км ички йўлларни шагаллаш.	3,10	2022-2023	465,0	ИЛ	8,837			8,837	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида

№	Лойihalаштирилган объект номи ва манзили	Лойihalаштирилган объект кватра (м <sup>2</sup> )	Курилиш ишлари бошланиши ва тугаши йили	Курилишнинг тахминий хисобланган умумий киймати	Лойihalа босқичи ДТИА, ДТИА, ДТИХ, ТИХ, ИЛ, ИХ, ТХ	ЛКИнинг объектлар бўйича киймати	2022 йил 1 январь холатида бақарилган ЛКИ	2022 йил 1 январь холатида ЛКИнинг қолдиқ киймати	2022 йилда қўйилган ЛКИ	ЛСХ ларнинг бюрократча тошириш, бюрократча томондан тасдиқланган мулкларни	Лойihalаштириш учун асос (ВМ қарорлари, Фармойишлари, тошириқлари ва х.к.)	Лойihalа номи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	Эшобод МФЙ Корасув-2 ва Корасув-3 кўчаларини 2 км қисмини шағаллаш.	2,00	2022-2023	300,0	ИЛ	5,694			5,694	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
51	Қурама МФЙ худудидаги 2,2 км ички йўللарни шағаллаштириш	2,00	2022-2023	300,0	ИЛ	5,694			5,694	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
	<b>жами:</b>	<b>18,90</b>		<b>8255,0</b>		<b>176,193</b>			<b>176,193</b>			
	<b>Норин тумани</b>											
52	Дустлик МФЙ А.Авлоний кўчаси 1 км қисмини асфальтлаш.	1,00	2022-2023	600,0	ИЛ	11,408			11,408	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
53	Зардор МФЙ худудидаги 2,5 км ички йўллارни асфальтлаш.	2,50	2022-2023	1500,0	ИЛ	28,551			28,551	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
54	Бўстон МФЙ Увайсий кўчасини 1,0 км асфальтлаш	1,00	2022-2023	550,0	ИЛ	10,456			10,456	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
55	Навоий МФЙ Навоий кўчаси 0,8 км ва Тўқимачи кўчаси 1,2 км қисмини асфальтлаш.	2,00	2022-2023	1200,0	ИЛ	22,837			22,837	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
56	Яйдоқ МФЙ Жасорат, Шарк юлдузи ва Мукумий кўчаларини 2 км қисмини асфальтлаш.	2,00	2022-2023	1200,0	ИЛ	22,837			22,837	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
57	Ўзбекистон МФЙ С.Айний ва С.Адашев кўчаларини 1,6 км қисмини асфальтлаш.	1,60	2022-2023	960,0	ИЛ	18,265			18,265	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
58	Фуркат МФЙ "Фуркат", "Олмос" ва "Улуғбек" кўчаларини 2 км қисмига цемент-бетон қоплама ётқишиш.	2,00	2022-2023	1500,0	ИЛ	28,551			28,551	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
59	Мирсултончек МФЙ Олтин водий кўчасини 1 км қисмини асфальтлаш.	1,00	2022-2023	600,0	ИЛ	11,408			11,408	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
60	Катта яйдоқ МФЙ Мелибоев кўчасини 2,4 км қисмини асфальтлаш.	2,40	2022-2023	1320,0	ИЛ	25,122			25,122	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
61	Қорагери МФЙ Наврўз кўчасини 0,8 км қисмини асфальтлаш ва Подшолик кўчасини 0,3 км қисмини шағаллаш.	1,10	2022-2023	660,0	ИЛ	12,551			12,551	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида

№	Лойihalаштирилган объект номи ва манзили	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Лойihalаштирилган объект куввати (мос киматлари)	Курилиш ишлари бошланиши ва тугаши йили	Курилишнинг тахминий хисобланган умумий киммати	Лойиха босқичи ДТИА, ДТИХ, ТИХ, ИЛ, ИХ, ТХ	ЛКИнинг объектлар бўйича киммати	2022 йил 1 январь холатида бажарилган ЛКИ	2022 йил 1 январь холатида ЛКИнинг қолдиқ киммати	2022 йилда кутулаётган ЛКИ	ЛСХ ларининг бюртмачига томонидан тасдиқланган муддатлари	Лойihalаштириш учун асос. (ВМ қадрлари, Фармойишлари, топшириқлари ва х.к.)	Лойihalовчи институт номи
1	2								191,986	11		13
	жами:	16,60		10090,0		191,986			191,986			
	Поп тумани											
62	А.Каххор МФЙ худудидаги 2,8 км қисмини асфальтлаш.	2,80	2022-2023	2100,0	ИЛ	62,285			62,285	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
63	Кенагас МФЙ Боғ кўча 0,6 км, Гузар кўча 1,2 км, Истиклол кўча 0,8 км, Ёшлар кўча 0,8 км, Бунёдкор кўча 0,3 км ва Наврўз кўча 0,3 км жами 4 км қисмини шағаллаш.	4,00	2022-2023	600,0	ИЛ	11,408			11,408	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
64	Юқори Хонобод МФЙ худудидаги 3,5 км ички йўллارни шағаллаш.	3,50	2022-2023	525,0	ИЛ	9,980			9,980	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
65	Пахтакор МФЙ худудидаги 2,5 км ички йўллارни асфальтлаш.	2,50	2022-2023	1500,0	ИЛ	28,551			28,551	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
66	Янгиобод МФЙ худудидаги 3 км ички йўллارга цемент-бетон қоплама ётқизиш.	3,00	2022-2023	2250,0	ИЛ	66,736			66,736	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
67	Гузар МФЙ худудидаги 1,0 км ички йўлни асфальтлаш.	1,00	2022-2023	550,0	ИЛ	10,456			10,456	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
68	Бирлашган МФЙ худудидаги 3 км ички йўллارни асфальтлаш.	3,00	2022-2023	1650,0	ИЛ	31,408			31,408	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
69	Чолак боши МФЙ худудидаги 2 км ички йўллари асфальтлаш.	2,00	2022-2023	1100,0	ИЛ	20,932			20,932	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
	жами:	21,80		10275,0		241,756			241,756			
	Тўрақўрғон тумани											
70	Бордимқўл МФЙ Кўрик кўчаси 1 км қисмини асфальтлаш.	1,00	2022-2023	550,0	ИЛ	10,456			10,456	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
71	Мозорқўхна МФЙ Ойбек кўчасини 0,7 км қисмини асфальтлаш	0,70	2022-2023	385,0	ИЛ	7,313			7,313	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
72	Ўзбекистон МФЙ Ўзбекистон кўчасини 0,4 км қисмини асфальтлаш.	0,40	2022-2023	220,0	ИЛ	4,170			4,170	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида




№	Лойнашартирлагдсан объект ному ва манзили	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Лойнашартирлагдсан объект куввати (мос кинматларда)	Курлиш шугарни бошланши ва тугаш йили	Курлишининг тахминий хисоблагдсан умумий кинмати	Лойна боскич ДТГА, ТГА, ДПХ, ТИХ, ИЛ, ИХ, ТХ	ЛКЙнинг объеклар буйича кинмати	2022 йил 1 январь хотагтра бакарлган ЛКЙ	2022 йил 1 январь хотагтра ЛКЙ нинг колдик кинмати	2022 йилда кутгагстан ЛКЙ	ЛСХ ларининг бюртмачинга топириши, бюртмачинга томондан тасликланши мулатлари	Лойнашартирлиш учун фармойишлари, (ВМ карорлари, топириклари ва х.к.)	Лойнашартирлиш учун номни
1	2											
73	Паст найманча МФЙ худудида 1 км ички йулни цемент-бетон коллама ётқишиш.	1,00	2022-2023	750,0	ИЛ	14,265			14,265	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
74	Иброт МФЙ Дўстлик ва Тинчликсевар кўчаларини 1,5 км қисмини асфальтлаш	1,50	2022-2023	825,0	ИЛ	15,694			15,694	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
75	Еттикон МФЙ Гўзалобод кўчасини 2,0 км қисмини асфальтлаш	2,00	2022-2023	1100,0	ИЛ	20,932			20,932	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
76	Мажнунтол МФЙ Мажнунтол кўчасини 1 км қисмини асфальтлаш.	1,00	2022-2023	550,0	ИЛ	10,456			10,456	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
77	Темиркишлок МФЙ Арчазор, Темиркишлок ва Шарк кўчаларини жами 2 км қисмини шағаллаш.	2,00	2022-2023	300,0	ИЛ	5,694			5,694	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
78	Тепа Найманча МФЙ Гавхар кўчасини 0,4 км қисмини асфальтлаш.	0,40	2022-2023	220,0	ИЛ	4,170			4,170	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
79	Ахси МФЙ Боғ кўчасини 0,7 км қисмини асфальтлаш.	0,70	2022-2023	385,0	ИЛ	7,314			7,314	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
80	Поросмон МФЙ худудидаги жами 2,2 км ички йўллари асфальтлаш.	2,20	2022-2023	1210,0	ИЛ	23,027			23,027	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
81	Обод МФЙ Мустикаллик кўчасини 1 км қисмини асфальтлаш.	1,00	2022-2023	550,0	ИЛ	10,456			10,456	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
82	Ўртакишлок МФЙ худудидаги 1 км ички йўлни шағаллаш.	1,00	2022-2023	150,0	ИЛ	2,837			2,837	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
83	Катта Курама МФЙ худудидаги 1 км ички йўлни шағаллаш.	1,00	2022-2023	150,0	ИЛ	2,837			2,837	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
	жами:	15,90		7345,0		139,621			139,621			
	Ўйчи тумани											
84	Кўргонча МФЙ худудидаги 5 та кўчасини жами 4,5 км қисмини асфальтлаш.	4,50	2022-2023	2700,0	ИЛ	80,089			80,089	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
85	Гулбоғ МФЙ худудида 1 км ички йўллари асфальтлаш.	1,00	2022-2023	600,0	ИЛ	11,408			11,408	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида

№	Лойihalаштирилган объект номи ва манзили	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Лойihalаштирилган объект куввати (мос кинматрада)	Курлиш ишлари бошланиши ва тугаши йили	Курлишнинг тахминий хисобланган умумий кинмати	Лойиха босқичи ДТНА, ДТИХ, ТИХ, ТИ, ИХ, ТХ	ЛКИнинг объектлар бўйича кинмати	2022 йил 1 январь ҳолатига бажарилган ЛКИ	2022 йил 1 январь ҳолатига ЛКИнинг қолдиқ кинмати	2022 йилда кўтилган ЛКИ	ЛКХ ларинини буюртманинг томирини, тасдиқланган муддатлари	Лойihalаштириш учун Фармоишлари, (ВМ карорлари, томиринлари ва х.к.)	Лойihalаштириш учун номин
1	2											
86	Шифокор МФЙ худудида жами 2 км ички йўллarga цемент-бетон қолама ётқизиш.	2,00	2022-2023	1700,0	ИЛ	32,360			32,360	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
87	Қувурбоши МФЙ "Мусаффо" кўчаси 2,3 км, "Қувурбоши" кўчаси 1,7 км ва "Бархаёт" кўчаси 1,0 км жами 5,0 км ички йўллarnи асфальтлаш.	5,00	2022-2023	3000,0	ИЛ	88,994			88,994	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
	жами:	12,50		8000,0		212,851			212,851			
	Учкўрғон тумани											
88	Янгиер МФЙ Саноат кўчасини 1,3 км қисмини асфальтлаш.	1,30	2022-2023	780,0	ИЛ	14,837			14,837	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
89	Намуна МФЙ худудида 2,6 км ички йўллarnи шағаллаш.	2,60	2022-2023	780,0	ИЛ	14,837			14,837	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
90	Гулистон МФЙ Тараққиёт кўчаси 0,89 км ва Лолазор кўчаси 1,8 км жами 2,7 км қисмини шағаллаш.	2,70	2022-2023	810,0	ИЛ	15,408			15,408	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
91	Учкўрғон МФЙ худудидаги 1 км ички йўллarnи шағаллаш.	1,00	2022-2023	300,0	ИЛ	5,694			5,694	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
92	Туркистон МФЙ худудидаги 3 км ички йўллarnи шағаллаш.	3,00	2022-2023	900,0	ИЛ	17,123			17,123	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
93	Фаровон МФЙ худудидаги 2 км ички йўллarnи шағаллаш.	2,00	2022-2023	600,0	ИЛ	11,408			11,408	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
94	Мустақиллик МФЙ худудидаги 2,1 км ички йўллarnи шағаллаш.	2,10	2022-2023	630,0	ИЛ	11,980			11,980	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
95	Узун кўча МФЙ худудидаги 2,9 км ички йўллarnи асфальтлаш	2,90	2022-2023	1595,0	ИЛ	30,361			30,361	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
	жами:	17,60		6395,0		121,648			121,648			

№	Лойihalаштириладиган объект номи ва манзили	Лойihalаштириладиган объект куввати (мос кийматлар)	Кураниш ишлари бошланиш ва тугатилиши	Куранишнинг тахминий хисобланган умумий киймати	Лойihalа босқичи ДТТА, ЛТА, ДТХ, ТХ, ИЛ, ИХ, ТХ	ЛКИнинг объектлар бўйича киймати	2022 йил 1 январь холатида бақарилган ЛКИ	2022 йил 1 январь холатида ЛКИнинг қолдиқ киймати	2022 йилда қўйилган ЛКИ	ЛКХ ларининг буюртмачига тошириш тасдиқланган мўддатлари	Лойihalаштириш уйун асос, (ВМ қарорлари, Фармойишлари, Тошириқлари ва х.к.)	Лойihalовчи институт номи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Чортоқ тумани											
96	Юқалиш МФЙ худудидаги 1 км ички йўللارни асфальтлаш, 0,5 км ички йўллارга цемент-бетон қоплама ётқизиш.	1,50	2022-2023	925,0	ИЛ	17,599			17,599	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
97	Арбағиш МФЙ худудидаги 3 км ички йўллارни асфальтлаш.	3,00	2022-2023	1650,0	ИЛ	31,408			31,408	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
98	Тинчлик МФЙда худудидаги 1,1 км ички йўллارни асфальтлаш, 1,3 км қисмини шағаллаш.	2,40	2022-2023	745,0	ИЛ	14,170			14,170	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
99	Наврўз МФЙ худудидаги 1 км ички йўллارни асфальтлаш.	0,80	2022-2023	440,0	ИЛ	8,360			8,360	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
100	Бағрикенглик МФЙ Гулистон кўчаси 1,2 км қисмини асфальтлаш.	1,20	2022-2023	660,0	ИЛ	12,551			12,551	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
101	Сохибқор МФЙ Бодомзор 1-2- кўчаларда жами 3,5 км қисмини шағаллаш.	3,50	2022-2023	525,0	ИЛ	9,980			9,980	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
102	Сарқор МФЙ Р.Ортиқов, Чорвадор ва Р.Низамов кўчаларини 4,5 км қисмини шағаллаш.	4,50	2022-2023	675,0	ИЛ	12,837			12,837	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
103	Ўзбекистон МФЙ худудидаги 1,0 км ички йўллارни асфальтлаш, 0,5 км.ички йўллارга цемент-бетон қоплама ётқизиш.	1,50	2022-2023	925,0	ИЛ	17,599			17,599	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
104	Ҳазратишоҳ МФЙ Юртлош кўчасини 0,5 км ички йўлларни асфальтлаш, 0,5 км.ички йўллارга цемент-бетон қоплама ётқизиш.	1,00	2022-2023	650,0	ИЛ	12,360			12,360	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
105	Бозорбоши МФЙ худудидаги 4,3 км ички йўлларни шағаллаш.	4,30	2022-2023	645,0	ИЛ	12,265			12,265	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
106	Қомиллик МФЙ Кўлобод кўчаси 1,5 км қисмини асфальтлаш, 0,5 км қисмига цемент-бетон қоплама ётқизиш.	2,00	2022-2023	1200,0	ИЛ	22,837			22,837	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида

№	Лойхалаштирилган объект номи ва манзили	Лойхалаштирилган объект қуввати (кВт (кВТ))	Қурилиш ишлари бошланиш ва тугаш йили	Қурилишнинг тахминий хисобланган умумий қиймати	Лойиха босқичи ДТИА, ДТИХ, ТИХ, ИЛ, ИХ, ТХ	ЛКИнинг объектлар бўйича қиймати	2022 йил 1 январь ҳолатига бақарилган ЛКИ	2022 йил 1 январь ҳолатига ЛКИнинг қолдиқ қиймати	2022 йилда қўйилган ЛКИ	ЛСХ ларинин бюжетдан томонидан тасдиқланган муддатлари	Лойхалаштириш учун асос. (ВМ қарорлари, Фармойишлари, тошпиқирлари ва х.к.)	Лойхалаштириш номи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	жами:	25,70		9040,0		171,966		171,966				
	Чуст тумани											
107	Шувар МФЙ худудидаги 3,0 км ички йўлларни шағаллаш.	3,00	2022-2023	450,0	ИЛ	8,551		8,551	8,551	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
108	Қайрма МФЙ худудидаги 2,0 км ички йўлларни шағаллаш.	2,00	2022-2023	300,0	ИЛ	5,694		5,694	5,694	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
109	Хисорак МФЙ худудидаги 6,0 км ички йўлларни шағаллаш.	6,00	2022-2023	900,0	ИЛ	17,123		17,123	17,123	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
110	Тоймас МФЙ худудидаги 2,5 км ички йўлларни асфальтлаш.	2,50	2022-2023	1500,0	ИЛ	28,551		28,551	28,551	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
111	Майдон МФЙ Обиравон кўчаси 1,5 км, Шағаласун кўчаси 4 км ва Лабисой кўчаси 1 км жами 7,5 км ички йўлларни шағаллаш.	7,50	2022-2023	975,0	ИЛ	18,551		18,551	18,551	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
112	Дам МФЙ Жайдок-1 кўчаси 1,2 км, Жайдок-2 кўчаси 0,3 км, Иттифок кўчаси 1,3 км, Навқирон кўчаси 1,8 км, Қўқон кўчаси 1,6 км ва Юқори кўча 2,4 км жами 8,6 км ички йўлларни шағаллаш.	8,60	2022-2023	1290,0	ИЛ	24,551		24,551	24,551	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
113	Тепакўрган МФЙ худудидаги 1,4 км ички йўлларни асфальтлаш	1,40	2022-2023	840,0	ИЛ	15,980		15,980	15,980	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
114	Қалъаи Поён МФЙ худудидаги 2,5 км ички йўлларни шағаллаш.	2,50	2022-2023	375,0	ИЛ	7,122		7,122	7,122	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
	жами:	33,50		6630,0		126,123		126,123	126,123			
	Янгиқўрган тумани											
115	Нов МФЙ Шаршара кўчасида 1,5 км ички йўлларга цементбостон қоплама ётқизиш.	1,50	2022-2023	900,0	ИЛ	17,122		17,122	17,122	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида

№	Лойihalаштирилган объект номи ва манзили	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Лойihalаштирилган объект куввати (мос кийматларда)	Курилиш шартини бошланган ва тугатилган йили	Курилишнинг тахминий хисобланган умумий киймати	Лойihalа босқичи ДТИА, ДТИА, ДТХ, ИЛ, ИХ, ТХ	ЛКИнинг объектлар бўйича киймати	2022 йил 1 январь холатида бажарилган ЛКИ	2022 йил 1 январь холатида ЛКИнинг қолдиқ киймати	2022 йилда Қўшма Республикаси ЛКИ	ЛСХ ларини буюртмачи томонидан тасдиқланган муҳлатлари	Лойihalаштириш учун асос (ВМ кардлари, фармойишлари, топшиқлари ва х.к.)	Лойihalа шартининг нисбатини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
116	Октепа МФЙ Эгартлош кўчасини 1 км қисмини асфальтлаш ва 1 км қисмини шағаллаш ҳамда Миробод кўчасида 2 км йўлни шағаллаш.	4,00	2022-2023	1050,0	ИЛ	19,980			19,980	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
117	Водий МФЙ Ёғду кўчаси 1,2 км ва Сарбаланд кўчаси 1,7 км жами 2,9 км ички йўллари асфальтлаш.	2,90	2022-2023	1740,0	ИЛ	33,122			33,122	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
118	Зарбдор МФЙ Зарбдор, Бинокор ва Камалак кўчаларини 3 км қисмини асфальтлаш.	3,00	2022-2023	1650,0	ИЛ	31,408			31,408	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
119	Бунёдкор МФЙ Зарафшон ва Фидокор кўчаларини 2,5 км қисмини шағаллаш.	2,50	2022-2023	375,0	ИЛ	7,122			7,122	2022 йил	2022 йил 25 октябр, ПҚ-408-сонли	Танлов асосида
	жами:	13,90		5715,0		108,754			108,754			
	Хаммаси:	273,93		112271,0		2429,303			2429,303			

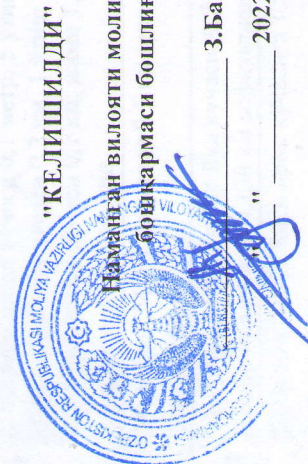

"КЕЛИШИЛДИ"

Наманган вилояти молия бош бошқармаси бошлиғи

З.Бахриддинов

2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"

Наманган вилояти иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқартриш бош бошқармаси бошлиғининг ўринбосари

И.Абдуғаниев

2022 й.

"КИРИТИЛДИ"

Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати" ДУК директори

О.Назаров

2022 й.
