

Объектда жорий таъмирлаш ишларини бажаришга тузилган 420/15-4/22 -сонли

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

Тошкент шаҳри

2022 йил « 02 » 12

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган «ТОШКЕНТ ШАҲРИ МИНТАҚАВИЙ ЙУЛЛАРГА БУЮРТМАЧИ ХИЗМАТИ» ДУК номидан Устав асосида иш юритувчи директор О.Абдуназаров бир томондан ва «BDS BEST ROAD» МЧЖ (кейинги ўринларда «Пудратчи») номидан Устав асосида иш юритувчи Бош директор Д.Балтаев иккинчи томондан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги 2022-2026-йилларда "Обод кишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисидаги №ПҚ-172 сонли қарори бўйича бюджет маблағлари ҳисобидан Юнусобод тумани "Катта Хасанбой" МФЙ Катта Хасанбой 2-тор кўчаси жорий таъмирлаш ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги «Давлат харидлари тўғрисидаги 684-сонли қонунига асосан <https://xarid.uzex.uz> махсус ахборот портали орқали (Лот рақами 22110012195746) эълон қилинган ва «Тошкент шаҳри минтақавий йуларга буюртмачи хизмати» ДУК харид комиссиясининг 2022 йил 02 12 баённомасига асосан қуйидаги шартномани туздилар.

I. ТАЪРИФЛАР

1.1. Мазкур шартномада қуйидаги таърифлар қўлланилади:

ижро ҳужжатлари - натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект жорий таъмирига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим маъсулиятли конструкциялар оралиқ даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

қурилиш майдони - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича «Буюртмачи» томонидан «Пудратчи»га ажратилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

вақтинчалик иншоотлар - «Пудратчи» томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган ҳар қандай типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар;

беркитиладиган ишлар - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

шартнома нарҳини бўлиб чиқиш - ишларнинг ҳар бир босқичи ва/ёки турлари қийматини аниқ белгилаган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

2.1. «Пудратчи» мазкур шартнома бўйича объектда жорий таъмирлаш ишларини лойиҳа-смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, «Буюртмачи» эса «Пудратчи»га жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва молиялаштириш манбаи Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги ёки Тошкент шаҳар маҳаллий бюджети томонидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ

таъминланиши билан тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3.1. Мазкур шартнома бўйича объектда бажариладиган ишлар қиймати барча ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда амалдаги нархларда шартноманинг умумий қиймати ҚҚС билан **74 300 555 (етмиш турт миллион уч юз минг беш юз элик беш сум) сўми** шу жумладан **ҚҚС 9 691 376,74 (тўққиз миллион олти юз тўқсон бир минг уч юз етмиш олти сум 74 тийин)** ташкил этади.

3.2. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, куйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- объектнинг (ундаги сунъий иншоотлар, кўприклар ва тоннелларнинг) жорий таъмирлаш ишлари қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;
- ишлар ҳажми «Буюртмачи» томонидан ўзгартирилганда;
- объектнинг жорий таъмирлаш ишлари муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилиши мумкин.

3.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда санаб ўтилган ўзгартиришлар «Буюртмачи» билан «Пудратчи» ўртасидаги шартномага қўшимча келишув тузиш билан расмийлаштирилади.

IV. «ПУДРАТЧИ»НИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартнома бўйича «Пудратчи» шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

жорий таъмирлаш ишлари бошланишдан олдин объектда жорий таъмирлаш ишларини олиб бориш даври учун, «Буюртмачи» иштирокида жорий таъмирлаш олиб борилаётган йул қисмини ва ундаги мавжуд йул элементларини ўрнатилган тартибда далолатнома асосида йулдан фойдаланувчи ташкилотдан қабул қилиб олади ва таъмирлаш ишлари якунлангандан сўнг фойдаланувчи ташкилотга топширади;

зарур ҳолларда айрим иш турларининг бажарилишида лойиҳа-смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўриндош машина-механизмлардан фойдаланилиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаслигини кўрсатувчи сифат лабораторияси ҳулосаси асосида амалга оширилиши мумкин;

лойиҳа-смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари «Пудратчи» томонидан тўлиқ ва сифатли қилиб бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва ҳаражатлар смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни мазкур объектнинг айрим ҳаражатлари бўйича кўрилиши мумкин бўлган зарарни ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари ҳаражатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида «Буюртмачи»нинг руҳсати билан йуналтириши мумкин;

объектнинг ижро ҳужжатларини расмийлаштириш ва «Буюртмачи»га топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификати, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини тақдим этади;

шартнома шартларига асосан объектни «Буюртмачи»га тасдиқланган лойиҳага мувофиқ топширади;

«Пудратчи» қурилиш давомида лойиҳа-смета ҳужжатларида ҳисобга олинмаган ишларни ва шу муносабат билан қўшимча ишларни бажариш ва қурилишнинг смета қийматини ошириш зарурлигини аниқласа, бу тўғрида «Буюртмачи»га хабар бериши шарт;

барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасида белгиланган, ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажм ва муддатларда, қурилиш қоидалари ва меъёрларига, белгиланган стандартларга амал қилган ҳолда сифатли бажариш ҳамда ишни «Буюртмачи»га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади;

объектга зарур қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, бошқа хом-ашёлар ва қурилиш техникасини ўз вақтида ҳамда зарур ҳажмларда етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, омборга жойлаш ва сақлашни амалга оширади;

зарур ҳолларда қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуради;

қурилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтказилган дарахтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирларнинг бажарилишини таъминлайди;

мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатади;

қурилиш майдони қўриқланишини таъминлайди;

мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни ўз вақтида ва тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади;

лойиҳа-смета ҳужжатларига асосан муҳандислик коммуникацияларини қуриш, кўчириш (газ, алоқа, сув, канализация, электр ўтказиш тармоқлари ва ҳаказо) бўйича махсус ёрдамчи пудрат ташкилотларини жалб қилган ҳолда қурилиш-монтаж ишларини бажаришни ўз зиммасига олади.

4.2. «Пудратчи» мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ёки ўрнатилган тартибда «Ёрдамчи пудратчи» ёллаган ҳолда, зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун «Буюртмачи» олдида тўлиқ мулкий жавоб беради.

Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йул қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

4.3. «Пудратчи» ташкилот томонидан қурилиш-таъмирлаш ишлари (лаборатория хулосаси) якунлангандан сўнг 10 (ўн) кун муддатда фойдаланишга топшириш ишчи комиссия далолатномаси топширилади.

4.4. «Буюртмачи» томонидан тегишли Ғазначилик бошқармасидан рўйхатдан утказиш учун жўнатилган электрон шартнома «Пудратчи» ташкилот томонидан ўз вақтида қабул қилиши шарт (жўнатилган вақтдан 3 кун муддатдан кечиктирмасдан).

V. «БУЮРТМАЧИ»НИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун «Буюртмачи»:

ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган «Пудратчи» томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, «Пудратчи»дан тугалланган ишларни, амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш;

«Пудратчи»нинг барча мурожаатларини ўн беш кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

Молиялаштириш жадвалига биноан «Пудратчи»га молиялаштириш манбаи бўлган Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги ёки Тошкент шаҳар маҳаллий бюджети томонидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан 30 % (ўттиз фоиз) миқдорда бўнак (аванс) бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

«Буюртмачи» «Пудратчи»га ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

«Буюртмачи» 5 кунлик муддат ичида «Пудратчи» томонидан тақдим қилинган ҳисоб-фактураларни расмийлаштириб беришни ўз зиммасига олади. Агарда тақдим қилинган ҳужжатларда камчиликлар аниқланса, уларни кўрсатган ҳолда «Пудратчи»га қайтариб беради.

Агар техник ҳужжатларга ўзгартиришлар киритиш туфайли бажарилиши керак бўладиган қўшимча ишлар қиймати жиҳатидан сметада кўрсатилган қурилиш умумий қийматининг ўн

фоиздан ошиб кетмаса ва курилиш-пудрат шартномасида назарда тутилган ишларнинг хусусиятини ўзгартирмаса, Буюртмачи-Лойихачи техник ҳужжатларга ўзгартиришлар киритишга ҳақли.

Техник ҳужжатларга ўзгартиришлар ўн фоиздан каттароқ ҳажмда ўзгартиришлар киритиш тарафлар келишган қўшимча смета асосида амалга оширилади.

Мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

6.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб кундан бошлаб кучга киради ҳамда 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

6.2. «Пудратчи» мазкур шартнома кучга кирган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

6.3. Мазкур шартнома бўйича жорий таъмирлаш ишларининг муддати бажариш жадваллари бўйича амалга оширилади.

6.4. «Пудратчи» ишни бажаришнинг бошланғич ва охири, шунингдек оралиқ муддатларини бузганлик учун жавобгар бўлади.

VII. ТЎЛОВ ВА ҲИСОБ КИТОБЛАР

7.1. «Буюртмачи» «Пудратчи»га шартноманинг 5.1.-бандига асосан шартноманинг 2-иловасига мувофиқ бунак (аванс) маблағи ўтказилади.

7.2. Мазкур пудрат шартномаси кучга кирган кундан «Пудратчи» томонидан ишларни бажариш жадвалига мувофиқ ўз имконияти ҳисобидан объектда жорий таъмирлаш ишларини бошлайди.

7.3. «Буюртмачи» ва «Пудратчи» томонидан ҳар ойда бажарилган жорий таъмирлаш ишларини «Маълумотнома-ҳисоб-фактура» билан расмийлаштирилади, бунда ишларнинг конструктив элементлари (турлари) бўйича физик ва қиймат курсаткичлари 1-иловага асосан акс эттирилади ва 2-иловага асосан молиялаштириш манбаи бўлган Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги ёки Тошкент шаҳар маҳаллий бюджети томонидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминланиши билан молиялаштирилади.

7.4. Бажарилган жорий таъмирлаш ишлари белгиланган тартибда расмийлаштирилган «Маълумотнома-ҳисоб-фактура»га асосан молиялаштирилади. Бунда жорий молиялаштириш ҳар ойда, ажратилган авансни мутаносиб равишда ушлаб қолишни ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 100 фоизигача жорий молиялаштирилиши амалга оширилади.

7.5. Объект ишчи комиссия томонидан фойдаланишга қабул қилиб олинган кундан 12 (ўн икки) ойлик кафолат муддати ўтгунга қадар «Пудратчи» бажарилган ишларнинг сифати учун жавоб беради.

7.6. «Пудратчи» объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект фойдаланувчи ташкилотга топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йуқ қилиниши ва шикастланиши хавфи «Пудратчи»нинг зиммасида бўлади.

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

8.1. «Буюртмачи» объектда ўз вакилини - техник кузатувчини тайинлайди, у «Буюртмачи»нинг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

8.2. Техник кузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

8.3. «Пудратчи» техник кузатувчини ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник кузатувчи «Пудратчи» томонидан ўтказиладиган, таъмирлаш объектида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

8.4. «Пудратчи» таъмирлаш даврида «Буюртмачи»нинг вакилини (техник кузатувчини) объектда иш жойи билан таъминлашни ўз зиммасига олади.

8.5. «Пудратчи» объектда бажарилган ишларнинг ҳажмларини бажариш ҳужжатларини, қилинган сарф-ҳаражатларни «Буюртмачи» томонидан мазкур объект учун бириктирилган техник кузатувчи билан ҳар ойнинг 25 кунидан ойнинг охиригача объектнинг ўзида кўриб чиқади ва тўлиқ маълумотни (белгиланган шаклларда ижро ҳужжатлари билан) кейинги ойнинг биринчи кунига қадар «Буюртмачи»га топширади.

8.6. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик хато ва бошқа камчиликларга йул қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларда шартнома амал қилиш муддатидан кечикмаган ҳолда бажарилган иш ҳажмлари тегишли ўзгартиришлар (корректировка) киритилган ҳолда расмийлаштирилади.

8.7. Ишларни бажариш жараёнида, ишлаш технологияси ва сифатини бузмаган ҳолда, ўз имкониятлардан келиб чиқиб ишлаш усули ва машина –механизмларнинг бир туридан бошқа ишлаб чиқариш қуввати билан механизмларга алмаштириш ва амалда бажарилган иш ҳажмлари баҳосини аниқлашда «Пудратчи» амалдаги нарх ва механизмлар бўйича лойиҳа смета ҳужжатларида ажратилган маблағдан чиқмаган ҳолда расмийлаштириш ҳуқуқига эга.

8.8. «Пудратчи» ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

«Пудратчи» объектда ишларни олиб бориш тартибини ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси Транспорт Вазирлиги ҳузуридаги Йул қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекцияси билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

8.9. Объектда умумий тартибни таъминлаш «Пудратчи»нинг вазифаси ҳисобланади.

8.10. «Пудратчи» геодезия нуқталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги, тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

8.11. Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган бўлиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, «Пудратчи» «Буюртмачи» билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

8.12. «Пудратчи» геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича «Буюртмачи»га беради.

8.13. «Пудратчи» ўзи томонидан таъмирлашда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификасияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

8.14. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин «Пудратчи» «Буюртмачи»ни ва ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси Транспорт Вазирлиги ҳузуридаги Йул қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

8.15. Ёпилиб кетадиган ишларни уларнинг ҳар бир тури (босқичи) бўйича қабул қилиб олиш уларнинг кейинги тур (босқич) ишлари бошлангунга қадар бажарилишига қараб амалга оширилади.

Ишларни қуйидаги таркибдаги комиссия қабул қилиб олади:

«Буюртмачи»нинг вакили – техник назоратчи (раис), «Пудратчи» ташкилот вакили – иш бажарувчи ёки уста, лаборант ва геодезист (зарур ҳолларда), йулга хизмат кўрсатадиган йул ташкилоти вакили, лойиҳа ташкилоти вакили (кўтариб турувчи конструкцияларни қабул қилиб олишда).

Ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш натижалари ўрнатилган шакл бўйича далолатнома билан расмийлаштирилади, унда қабул қилинадиган ишларнинг лойиҳа, норматив-

техник хужжатлар, стандартлар талабларига мувофиқлик даражаси акс эттирилади, шунингдек қабул қилинадиган ишларга баҳо ва ишларнинг кейинги турларини бажаришга рухсат берилади. Далолатномага ўлчовлар қайдномаси ва лаборатория синовлари натижалари илова қилинади.

8.16. «Пудратчи» «Буюртмачи»нинг қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтларига киритилган ёзма рухсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

8.17. Агар беркитиладиган ишлар «Буюртмачи»нинг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича «Пудратчи» «Буюртмачи»нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

«Пудратчи» «Буюртмачи»нинг манфаатларига жиддий таъсир қилмайдиган иш хужжатларидан майда четга чиқишларни «Буюртмачи»нинг розилиғисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига ва қийматига таъсир этмаганлигини исботласа жавобгар ҳисобланмайди.

Объектни жорий таъмирлаш жараёнида технологик жараён олиб борилишининг тўғрилиги, бажариладиган ишлар ҳамда фойдаланиладиган материалларнинг сифати юзасидан техник назоратни амалга ошириш, шунингдек ёпилиб кетадиган ва оралик ишларни қабул қилиб олишда «Буюртмачи» томонидан комиссия таркибида иштирок этиш учун ушбу объектга хизмат кўрсатадиган йул ташкилоти жалб этилиши мумкин.

Объектнинг бажарилган ишлари ва тугалланган объектларини ойлик (оралиқ) қабул қилиб олиш «Буюртмачи» ва «Пудратчи» томонидан расмийлаштирилади. Бажарилган ишлар ва объектнинг тугалланган конструктив элементларини ойлик (оралиқ) қабул қилиб олиш натижалари белгиланган шаклда маълумотнома-ҳисоб-фактура билан, миқдор ва қиймат кўрсаткичлари ҳисоб-китоб жадвалида акс эттирилган ҳолда белгиланган шаклда расмийлаштирилади.

8.18. Агар «Буюртмачи» «Пудратчи» ва (ёки) унинг «Ёрдамчи пудратчи»лари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда «Пудратчи» ўз кучлари ва маблағлари ҳисобидан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

8.19. «Пудратчи» қурилиш майдонини ва унга туташ йул участкалари ва йулакларнинг озодалигини таъминлайди.

8.20. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунга қадар «Пудратчи» жорий таъмирлаш ишларини бажарилишини юритиш дафтларини юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, «Буюртмачи» ва «Пудратчи»нинг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi, ўтказилган синовлар, кунлик ўртача ҳаво ҳарорати ва ёғингарчиликлар, шунингдек қурилишни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар, ҳамда объектга қабул қилинаётган асфальтобетон маҳсулотининг заводдан чиқиш ҳарорати ва йулга қабул қилинаётган ҳарорати) акс эттирилади.

Агар «Буюртмачи» ишларнинг бориши ва сифатидан ёки «Пудратчи»нинг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

«Пудратчи» дафтарда «Буюртмачи» томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни кўрсатилган муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

IX. ИШЛАРНИ ҚЎРИҚЛАШ

9.1. «Пудратчи» таъмирлаш ишлари бошланишидан тугаллангунгача ва жорий таъмири тугалланган объект «Буюртмачи» томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудида материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

X. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

10.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги форс-мажор ҳолатлари (фавқулодда вазиятлар, фавқулодда ҳолат, юқори турувчи давлат органларининг қарори ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч) натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

«Пудратчи»нинг мазкур шартномани бажариш учун бошқа шартлашуви шериклари томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда ёқлиги, «Пудратчи»да зарур пул маблағларининг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига кирмайди.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

10.2. Агар форс-мажор ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда «Пудратчи» ва «Буюртмачи» ишларни давом эттириш ёки уларни консервасия қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

XI. ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ҚАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

11.1. Жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек жорий таъмирлаш тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олиш шаҳарсозлик нормалари, қоидалари ва стандартларига асосан амалга оширилади.

Жорий таъмирланган объект ёки унинг участкалари (ишга тушириш мажмуалари) объектнинг тугалланганлиги ва у қабул қилиб олишга тайёрлиги тўғрисида «Пудратчи» ташкилотнинг хабарномасидан кейин ишчи комиссия томонидан фойдаланишга қабул қилинади.

«Пудратчи» ташкилот ишчи комиссияга қуйидаги ҳужжатларни тақдим этади:

- қурилиш-монтаж ишларини амалга оширишда иштирок этган ташкилотлар томонидан бажарилган ишларнинг турлари ва ҳажмлари ҳамда маъсул ижрочилари кўрсатилган ҳолдаги рўйхати;
- қабул қилишга тақдим этилган йулнинг техник лойиҳаси ва ишчи чизмалари тўплами, ижро схемалари;
- ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш далолатномалари;
- йул-қурилиш материаллари ва йул тўшамаларининг конструктив қатламларидан кесиклар (тупроқ жинслари) синовлари журналлари, мувофиқлик сертификатлари;
- ишларни бажариш ва муаллифлик назорати журналлари;
- ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси Транспорт Вазирлиги ҳузуридаги Йул қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекциясини томонидан кўрсатилган камчиликларни бартараф қилинганлиги тўғрисидаги далолатномалари.

11.2. Объектларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида «Пудратчи»нинг ёзма билдиришномаси асосида «Буюртмачи» томонидан белгиланган тартибда қабул қилиб олинади.

11.3. «Пудратчи» жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ «Буюртмачи»га «Буюртмачи» томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. «Пудратчи» «Буюртмачи»га ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

11.4. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект давлат мулкига айланади ва ўрнатилган тартибда йуллардан фойдаланиш корхонаси балансига ўтади.

XII. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ШАРТ

12.1. Томонлар:

Томонлар, уларнинг афилланган (ўзаро боғланган) шахслари ва ходимлари, ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришлари давомида коррупцияга қарши курашиш соҳасидаги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари талабларининг бузулишига олиб келинадиган ва/ёки коррупция характериға эға бўлган, шу жумладан (аммо бу билан чекланмай) пора бериш ёки беришни ваъда қилиш, таъмағирлик, пора олишға бевосита ёки билвосита рози бўлиш хатти ҳаракатлари/ҳаракатсизликларини содир этмайдилар.

Томонлар, уларнинг афилланган (ўзаро боғланган) шахслари ва ходимлари бошқа томоннинг ходимлари ёки ваколатланган вакилларини қандайдир тарзда рағбатлантиришдан, шу жумладан пул суммалари, совғаларни тақдим этиш, уларнинг манзилиға хизматларини беғараз кўрсатиш ёки бу ходим ёки ваколатланган вакил томонидан уни рағбатлантирувчи томон фойдасиға қандайдир хатти ҳаракатларни/ ҳаракатсизликлар бажарилишини таъминлашға қаратилган ишларни бажаришдан воз кечадилар деб маълум қиладилар.

12.2. Томонлар ушбу илованинғ 5.1 бандидаги талабларни бузиш содир этилганлиги ёки содир этилиши мумкинлиги тўғрисидаги шубҳалар юзаға келган ҳолда, тегишли томон бу ҳақда иккинчи томонни хабардор қилиш, коррупция билан курашиш соҳасидаги Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларининг нормалари бузилганлиги фактининг рад этиб бўлмайдиган далиллари мавжуд бўлган ҳолда эса амалдаги қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ваколатланган органларни ҳам хабардор қилиш мажбуриятини ўз зиммасиға олади.

ХIII. КАФОЛАТЛАР

13.1. «Пудратчи»:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

лойиҳа-смета ҳужжатлариға, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ҳамда техник шартларға мувофиқ барча ишларни сифатли бажаришни;

ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларға, давлат стандартлариға ҳамда техник шартлариға мувофиқлигини;

шартномада белгиланган кафолат муддати мобайнида объектдан фойдаланиш жараёнида нуқсонлар ва чала қилинган ишлар аниқланганда, ўз ҳисобидан бартараф этишни;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидалариға мувофиқлигини кафолатлайди.

13.2. Объект ва унга кирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб 12 ой этиб белгиланади.

13.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли муддатида аниқланиб, улар бартараф этилгунға қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш давриға узайтирилади. Нуқсонлар «Пудратчи» томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари «Пудратчи» ва «Буюртмачи»нинг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар «Пудратчи» бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, Ўзбекистон Республикаси томонидан қабул қилинган қонун ва меъёрий ҳужжатларға асосан жавобгарликка тортиш тўғрисида урнатилган тартибда қонунни муҳофаза қилувчи муассасаларға мурожаат қилиш ҳуқуқиға эға.

13.4. «Пудратчи» нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси Транспорт Вазирлиги ҳузуридаги Йул қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспексияси томонидан амалға оширилади, бу томонларнинг

ушбу масала бўйича Хўжалик Судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

XIV. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

14.1. Мазкур шартнома «Буюртмачи» ва «Пудратчи»нинг ўзаро келишуви асосида бекор қилиниши мумкин, агарда келишув бўлмаса Тошкент Туманлараро Иқтисодий Судида кўриб чиқилади.

XV. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

15.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатларида, ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда жавобгарликка тортилади;

ётиқ чизиклар чизиш ишларини олиб бораётган «Пудратчи» ташкилот қонунчиликка ва ушбу шартномага мувофиқ «Буюртмачи» олдида қуйидаги ишлар бўйича мулкый жавобгардир:

сифатсиз бажарилган қурилиш-монтаж ишлари;

объектни ҳамда унинг босқичлари ва навбатларини белгиланган муддатда тугалланмаганлиги;

«Буюртмачи» билан тузилган шартнома асосида қурилиш-монтаж ва бошқа ихтисослаштирилган ташкилотлар томонидан ускуналарни монтаж қилиш муддатларининг бузилиши;

объектнинг лойиҳа-смета ҳужжатларида белгиланган ерларни рекультивация қилиш ишларини бажариш ҳажмлари ва муддатларининг бузилиши;

ётиқ чизиклар чизиш жараёнида ёки оралиқ қабул қилишда «Пудратчи» муаллифлик назорати ва бошқа назорат органлари томонидан аниқланган конструкция ва ишлардаги йул қўйилган камчиликлар ва нуқсонларни бартараф этишни орқага суриш;

шартномада кўзда тутилган бошқа мажбуриятларни бажармагани ёки тўла-қонли бажармагани;

«Пудратчи» ташкилот томонидан ишларнинг бажарилишида пудрат шартномасидан чекиниш ёки бошқа камчиликлар мавжудлигида «Буюртмачи», «Пудратчи»дан ўз ихтиёрига кўра қуйидагиларни талаб қилиш ҳуқуқига эга:

Агар «Пудратчи» ташкилот нуқсонларни келишилган муддатларда бартараф этмаса, «Буюртмачи» ёки йулдан фойдаланувчи ташкилот ўз кучи билан «Пудратчи» ҳисобидан нуқсонларни бартараф этиш ҳамда нуқсонларни ўз вақтида бартараф этилмаганлигидан келтирилган зарарни ва бажарилган иш қийматини ундириш ҳуқуқига эга.

15.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун «Буюртмачи» «Пудратчи»га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши «Буюртмачи»ни шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

15.3. «Пудратчи» томонидан объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича мажбуриятлар бузилган бўлса, «Пудратчи» «Буюртмачи»га муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1% (фоизи) миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20% (фоизи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш «Пудратчи»ни ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

15.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари, иш хужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда «Буюртмачи» ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси Транспорт вазирлиги ҳузуридаги Ё'л қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекциясини хулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек «Пудратчи»дан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси қонунларда белгиланган миқдорда жарима ундириш ҳуқуқига эга. «Буюртмачи» томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун «Пудратчи» «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 26-моддасига асосан сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20% (фоизи) миқдорда жарима тўлайди.

15.5. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги, ёки лозим даражада бажарилмаганлиги мазкур бандда назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган ҳаражатларда, мол-мулкнинг йуқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

«Буюртмачи» «Пудратчи»нинг бажарилган ишлари ҳажмидан ёки молиявий ҳисоб-китобларлардан аниқланган камчиликлар натижасида «Буюртмачи»га қайтариладиган маблағлар ва бошқа тўловлар бўйича мажбуриятларини ўз вақтида бажармаса, «Буюртмачи» ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегириб қолиш ҳуқуқига эга.

15.6. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XVI. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

16.1. Ушбу пудрат шартномаси амал қилиш давомида юзага келадиган низолар томонлар тарафидан ўзаро музокара йули билан ҳал этилади.

Низолар музокара натижасида келишувга эришилмаган тақдирда даъво қилувчи томон юзага келган низо юзасидан Тошкент туманлараро иқтисодий судига ўрнатилган тартибда даъво аризаси билан мурожаат қилади.

XVII. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

17.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йуқотади.

17.2. «Пудратчи» қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш хужжатларини «Буюртмачи»нинг ёзма рухсатисиз, ёрдамчи «Пудратчи»лардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

17.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

17.4. «Буюртмачи» билан «Пудратчи» ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар, ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

17.5. Агар «Пудратчи» шартнома бўйича ишлар яқунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда «Буюртмачи» «Пудратчи» қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

17.6. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

17.7. Мазкур шартнома томонлар тарафидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб кучга киради ҳамда томонлар ўз мажбуриятини тўлиқ бажарганига қадар амал қилади.

17.8. Шартнома кучга кирган кундан бошлаб томонлар ўз вазифаларини бажаришга киришади, шунингдек мазкур шартнома бўйича ҳуқуқ ва мажбуриятлари вужудга келади.

17.9. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳолатлар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

17.10. Мазкур шартномага қуйидагилар илова қилинади;

1-илова – Бажариш жадвали.

2-илова – Молиялаштириш жадвали.

ХVIII ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ

«БУЮРТМАЧИ»

**«ТОШКЕНТ ШАХРИ МИНТАҚАВИЙ
ЙУЛЛАРГА БУЮРТМАЧИ ХИЗМАТИ»**

ДУК

Манзил: 100000, Тошкент шаҳри,
Мустақиллик шох кўчаси, 68 уй
Ш/х: 3045 2186 0262 6970 4512 911 8596
СТИР: 304 893 532 ОКЕД 71120
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги
Ғазначилигининг Амалиёт бошқармаси
х/р 23 402 000 300 100 001 010
МФО: 00014 СТИР: 304 893 532
МБ Тошкент шаҳар бўйича ББХКМ




Директор

О. Абдуназаров

«ЛУДРАТЧИ»

«BDS BEST ROAD» МЧЖ

Манзил: Тошкент ш. Янги ҳаёт тумани
Дўстлик 2 мавзеси 10-уй 49-хонадон
Ш/х: 2020 8000 5054 2835 8001;
АТБ «O'zsanoatqurilish» г.Ташкент
МФО: 00403
ИНН: 308788248
ОКПО: 31082782, ОКЭД: 42110
Тел:
e-mail:



Бош Директор

Д. Балтаев

Юристинг Ассистент - М. Каюмов


Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги 2022-2026 йилларда "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисидаги №ПҚ-172 сонли ҳамда Халқ депутатлари Тошкент шаҳар кенгашининг 2022 йил 13 октябрдаги VI-71-270-14-0-К/22 сонли қарорига асосан таъмирлаши белгиланган кўчалар

Юнусобод тумани Катта Хасанбой МФЙ даги Катта Хасанбой 2-тор кўчаси жорий таъмирлаш

МОЛИЯЛАШТИРИШ РЕЖАСИ

Х/Р	3045218600262697045129118596	Йил	2022	хисобланган аванс маблағи	2022 йил												Жами	
					январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр		
		2022	74 300,555	22 290,167														22 290,167
8607		2022																22 290,167
		2022																52 010,389
		2022	74 300,6	22 290,2	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	74 300,555	
		Жами																74 300,555

74 300 555 (Етмиш тўрт миллион уч юз минг беш юз еллик беш) сўм

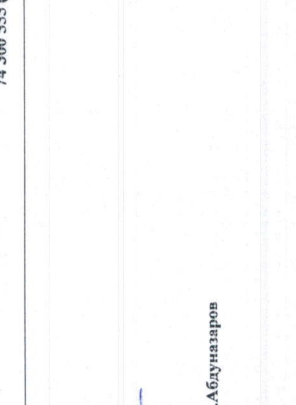

Директори
О. Абдуназаров




Директори
Д. Балтаев

2022 йил 07 12 даги 220/12 сонли шартномага
1-илова

Объект: Юнусobod тумани "Катта Хасанбой" МФЙ Катта Хасанбой 2-тор кўчаси жорий таъмирлаш

БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

№	Амалга ошириладиган ишлар	Йил	2022 йил												Умумий қиймати		
			I-чорак			II-чорак			III-чорак			IV-чорак					
			январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр			
1	Курилиш-монтаж ишлари	2022														74 300 555	74 300 555
	Жами															74 300 555	74 300 555

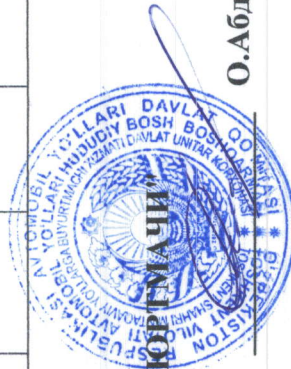

Директор

О. Абдуназаров



Директор

**195746 лот юзасидан шакланган дастлабки
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилди.

Муҳокама тугаган сана:

07.12.2022 12:37

Комиссия раиси:

ABDUNAZAROV OYBEKJON UYG'UNJON UG'LI



"КЕЛИШИЛДИ"

Ташкент шаҳар Иқтисодий тараққиёт ва инфратармоқлар вазирлиги қисқартirilgan бош бошқармаси

Ш.Шукуров
2022 й.

МАНЗИЛИ РЎЙХАТИ

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги 2022-2026 йилларда "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисидаги №172 сонли қарарга Ташкент шаҳар ҳокимининг 2022 йил 19 июльдаги VI-67-192-14-0-Қ22 сонли қарори бўйича

Мил.Сўмида

№	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати тегишли ўлчов бирликларда (км)	Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари				01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ молдавлантирини, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил жамий қиймати қўшимчалар	Шу жумладан:			Қуввати (км)	Қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ молдавлантирини	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лойиҳачи таъинловлари			
				Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Жизоз	Буюртмачининг бошқа харажатлари	Буюртмачи харажатлари					Асосий фондларни ишла туширилгани	қиймати											
1	ЖАМНИ:		43,299	33 339,959	33 339,959	33 339,959	33 339,959	33 339,959	33 339,959															
72	Мирзо Улутбек тумани		12,071	3 200,947	3 200,947	3 200,947	3 200,947	3 200,947	3 200,947															
1	Амир Темур МФЙдаги жамий:		1,333	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000															
1	Амир Темур МФЙдаги Урта Осиё, Соғдиқхон 2-3-тор, Амир Темур кўчалари	2022 йил	1,333							150,000											18.03.2022й №ЛПК-172	Танлов асосида		
1	Мушавирхона МФЙдаги жамий:		0,193	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000												18.03.2022й №ЛПК-172	Танлов асосида		
2	Қасба кўчаси	2022 йил	0,193							13,111												18.03.2022й №ЛПК-172	Танлов асосида	
	Дархон МФЙдаги жамий:		6,880	1 739,809	1 739,809	1 739,809	1 739,809	1 739,809	1 739,809													18.03.2022й №ЛПК-172	Танлов асосида	
3	Дархон МФЙдаги Катта Дархон 2-3-тор, Қумушхон, Юқори Дархон, Юқори Дархон 1-тор кўчалари	2022 йил	3,440	39,264	39,264	39,264	39,264	39,264	39,264	1 126,958	1 087,694										08.11.2022й № 68926	18.03.2022й №ЛПК-172	Танлов асосида	
4	Киев, Қишлоқ, Катта дархон, Қоҳнаим, Қоҳнаим 1-2-тор кўчалари	2022 йил	3,440	612,851	612,851	612,851	612,851	612,851	612,851	612,851	582,731										08.11.2022й № 68923	18.03.2022й №ЛПК-172	Танлов асосида	
	Оқсуғрон МФЙдаги жамий:		1,255	550,821	550,821	550,821	550,821	550,821	550,821		502,384	0,000										08.11.2022й № 69028	18.03.2022й №ЛПК-172	Танлов асосида
5	Оқсуғрон МФЙдаги Оқсуғрон 1-тор, Мадиначилар кўчалари	2022 йил	0,935	456,037	456,037	456,037	456,037	456,037	456,037	456,037	412,700											08.11.2022й № 69028	18.03.2022й №ЛПК-172	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланғич ва тугалланган йили	Лойиҳавий қуввати тегишли ўлчов бирликларда (кВт)	Шу жумладан:								Ассетий фондларини ишла туширишнинг			2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ молиялаштириш	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер шартномаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лойиҳачин таъинловчилари	
				Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ молиялаштириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил янми капитал қўйилмавлар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Жоғ	Буюртмачининг бошқа харажатлари	Буюртмачи харажатлари	Қуввати (кВт)	қиймати						
1																				
6	Оқсуғрон 3-тор кўчаси	2022 йил	0,170	94,784 5,100	94,784 5,100	94,784 5,100	94,784 5,100	94,784	94,784	89,684		5,100	3,060	0,170	94,784		08.11.2022й № 69024	18.03.2022й №ПК-172	Танлов ассоцида	
7	Динамо стадионига кириш бўли	2022 йил	0,150					15,000				15,000	9,000					18.03.2022й №ПК-173	Танлов ассоцида	
8	Юнвякий Маъваси катта кўчалари	2022 йил	0,620	124,006 124,006 34,314	124,006 124,006 34,314	124,006 124,006 34,314	124,006 124,006 34,314	124,006	124,006	89,692		34,314	20,588	0,620	124,006		08.11.2022й № 68930	18.03.2022й №ПК-172	Танлов ассоцида	
9	Неъмат Берк кўчаси	2022 йил	0,760	786,311 47,491	786,311 47,491	786,311 47,491	786,311 47,491	786,311	786,311	738,820		47,491	31,661	0,760	786,311		24.10.2022й № 66722	18.03.2022й №ПК-172	Танлов ассоцида	
10	Х.Олимжон МФЙдаги Нисабек кўли, Пушкинская 2-Берк, Достоевский кўчалари	2022 йил	1,030	0,000	0,000	0,000	0,000	39,888	0,000	0,000		39,888	23,933	0,000	0,000			18.03.2022й №ПК-172	Танлов ассоцида	
2	Миробод тумани		1,326	409,600	409,600	409,600	409,600	409,600	409,600	369,820	0,000	39,780	23,868	1,326	409,600					
	А.Ақолий МФЙдаги:		1,326	409,600	409,600	409,600	409,600	409,600	409,600	369,820	0,000	39,780	23,868	1,326	409,600					
11	А.Авлоний МФЙ кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 йил	1,326	409,600 39,780	409,600 39,780	409,600 39,780	409,600 39,780	409,600	409,600	369,820		39,780	23,868	1,326	409,600		08.11.2022й № 68921	18.03.2022й №ПК-172	Танлов ассоцида	
3	Олмазор тумани		5,428	5 274,608	5 274,608	5 274,608	5 274,608	5 274,608	5 274,608	5 068,836	0,000	205,772	123,463	5,428	5 274,608					
	Гулдор МФЙдаги:		4,139	4 503,099	4 503,099	4 503,099	4 503,099	4 503,099	4 503,099	4 354,041	0,000	149,058	89,435	4,139	4 503,099					
12	41-Хулуд кўчаси	2022 йил	2,381	2 684,474 81,022	2 684,474 81,022	2 684,474 81,022	2 684,474 81,022	2 684,474	2 684,474	2 603,452		81,022	48,613	2,381	2 684,474		20.10.2022й № 66151	18.03.2022й №ПК-172	Танлов ассоцида	

№	Объектлар номи ва хизмати	Қурилиш ишларининг бошланishi ва тугалланishi йили	Лойиҳавий қуввати тегинли ўлчов бирликларда (кв)	Шу жумладан:													Асосий фондларни ишла туширилishi		2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ молиялаштириши	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари байномаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лойиҳачи ташкилотлари
				Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ молиялаштириши, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил янми қиймати	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Жиҳоз	Буюртмачининг бошқа харажатлари	Буюртмачи харажатлари	шундан:	Қуввати (кв)	қиймати								
1	Ушкоровой МФЙ жамии:		0,972	836,857	836,857	836,857	836,857	836,857	836,857	776,141	0,000	60,716	36,430	1,072	836,857	0,000	0,000						
19	Янги кўйлик кўчаси	2022 йил	0,972	643,619	643,619	643,619	643,619	643,619	643,619	595,503		48,116	28,870	0,972	643,619			28.10.2022Й № 66904	18.03.2022Й №ПК-172	Танлов асосида			
20	Сергеи туманидаги суд олдн	2022 йил	0,100	193,238	193,238	193,238	193,238	193,238	193,238	180,638		12,600	7,560	0,100	193,238			24.10.2022Й № 66741	18.03.2022Й №ПК-172	Танлов асосида			
5	Учгена тумани		5,855	779,122	779,122	779,122	779,122	779,122	779,122	794,145	0,000	404,977	242,986	5,855	779,122	0,000	0,000						
	Ўрматор МФЙ жамии:		1,234	995,530	995,530	995,530	995,530	995,530	995,530	952,950	0,000	42,580	25,548	1,234	995,530	0,000	0,000						
21	Боситхон кўчаси	2022 йил	1,234	995,530	995,530	995,530	995,530	995,530	995,530	922,950		42,580	25,548	1,234	995,530			14.10.2022Й № 65328	18.03.2022Й №ПК-172	Танлов асосида			
	Қипша Қипша МФЙ жамии:		2,352	2 021,211	2 021,211	2 021,211	2 021,211	2 021,211	2 021,211	1 925,355	0,000	95,856	57,514	2,352	2 021,211	0,000	0,000						
22	Изаа 1-тор А кўчаси	2022 йил	1,132	991,688	991,688	991,688	991,688	991,688	991,688	943,130		48,558	29,135	1,132	991,688			14.10.2022Й № 65322	18.03.2022Й №ПК-172	Танлов асосида			
	Изаа 1-тор В кўчаси	2022 йил	1,220	1 029,523	1 029,523	1 029,523	1 029,523	1 029,523	1 029,523	982,225		47,298	28,379	1,220	1 029,523			14.10.2022Й № 65313	18.03.2022Й №ПК-172	Танлов асосида			
	Изааи МФЙ жамии:		0,455	1 087,795	1 087,795	1 087,795	1 087,795	1 087,795	1 087,795	997,328	0,000	90,467	54,280	0,455	1 087,795	0,000	0,000						
24	Навман кўчаси Бордюр ишлари бн	2022 йил	0,455	1 087,795	1 087,795	1 087,795	1 087,795	1 087,795	1 087,795	997,328		90,467	54,280	0,455	1 087,795			24.10.2022Й № 66667	18.03.2022Й №ПК-172	Танлов асосида			
	Биргачи МФЙ жамии:		0,600	2 663,351	2 663,351	2 663,351	2 663,351	2 663,351	2 663,351	2 538,351	0,000	125,000	75,000	0,600	2 663,351	0,000	0,000						
25	Қатта Хирмонгана кўчаси	2022 йил	0,600	2 663,351	2 663,351	2 663,351	2 663,351	2 663,351	2 663,351	2 538,351		125,000	75,000	0,600	2 663,351			15.11.2022Й № 69911	18.03.2022Й №ПК-172	Танлов асосида			

№	Объектлар номи ва манзили	3	4	5	6	7	8	9	Шу жумладан:			13	Асосий фондларни ишга туширилгани		16	17	18	19	20	
									10	11	12		шумари:	Куввати (см)						қиймати
1																				
	Богобод МФЙ жамғи:		1,014	802,964	802,964	802,964	802,964	802,964	802,964	764,390	0,000	38,574	23,144	1,014	802,964	0,000	0,000			
26	Богобод МФЙ инки кўчалари	2022 йил	1,014	802,964	802,964	802,964	802,964	802,964	802,964	764,390	0,000	38,574	23,144	1,014	802,964	0,000	0,000	31.10.2022Й №67856	18.03.2022Й №ПК-172	Танлов асосида
	Корёён МФЙ жамғи		0,200	228,271	228,271	228,271	228,271	228,271	228,271	215,771	0,000	12,500	7,500	0,200	228,271	0,000	0,000			
27	Зиёсиз кўчаси	2022 йил	0,200	228,271	228,271	228,271	228,271	228,271	228,271	215,771	0,000	12,500	7,500	0,200	228,271	0,000	0,000	02.11.2022Й №68158	18.03.2022Й №ПК-172	Танлов асосида
6	Чилонзор тумани		2,246	1 500,293	1 500,293	1 500,293	1 500,293	1 510,913	1 442,381	0,000	68,532	41,119	2,199	1 500,293	0,000	0,000				
	Зарфўрган МФЙ жамғи:		0,047	0,000	0,000	0,000	0,000	2,520	0,000	0,000	2,520	- 1,512	0,000	0,000	0,000	0,000				
28	368-МТТ ён кюски	2022 йил	0,047	0,000	0,000	0,000	0,000	2,520	0,000	0,000	2,520	1,512	0,000	0,000	0,000	0,000			18.03.2022Й №ПК-172	Танлов асосида
	Кожиробод МФЙ жамғи:		2,049	1 219,301	1 219,301	1 219,301	1 219,301	1 227,401	1 167,689	0,000	59,712	35,827	2,049	1 219,301	0,000	0,000				
29	Нурхон 3-тор кўчаси	2022 йил	0,286	127,932	127,932	127,932	127,932	127,932	115,920	0,000	12,012	7,207	0,286	127,932	0,000	0,000	16.10.2022Й №65470	18.03.2022Й №ПК-172	Танлов асосида	
30	Жилонота кўчаси 1-13 уйлар	2022 йил	0,330	245,822	245,822	245,822	245,822	245,822	236,222	0,000	9,600	5,760	0,330	245,822	0,000	0,000	16.10.2022Й №65471	18.03.2022Й №ПК-172	Танлов асосида	
31	Қорқома 11-17-уйлар олди	2022 йил	0,000					2,100			2,100	1,260						18.03.2022Й №ПК-172	Танлов асосида	
32	Террафик 21-27-уйлар олди	2022 йил	0,000					2,400			2,400	1,440						18.03.2022Й №ПК-172	Танлов асосида	
33	Чилонзор 83-уйлар олди	2022 йил	0,000					2,400			2,400	1,440						18.03.2022Й №ПК-172	Танлов асосида	

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш йилларининг бошланғич ва тугалланғич йили	Лойиҳавий қуввати тегишли ўлчов бирликларда (квм)	Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисобланган кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисобланган кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил жами қийматлари	Шу жумладан:			Асосий фондларни ишла туширилгани		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати молиялаштириши	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Теңдер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лойиҳачи таъкилотлари		
									Курслани-мониторинг ўлчовий қиймати	Жиҳоз	Буюртмачининг бошқа харажатлари	Буюртмачи харажатлари	Қуввати (квм)						қиймати	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
34	Чўпонота б-ўй олдн	2022 йил	0,000					1,200				1,200	0,720						18.03.2022й №ПК-172	Танлов асосида
35	Катта Қозғиробол қабристонн қўчаси	2022 йил	1,116	618,989	618,989	618,989	618,989	618,989	600,989			18,000	10,800	1,116	618,989			16;10;2022й № 65468	18.03.2022й №ПК-172	Танлов асосида
36	Илгор қўчаси (1-25 ўйвар олдн)	2022 йил	0,317	226,558	226,558	226,558	226,558	226,558	214,558			12,000	7,200	0,317	226,558			16;10;2022й № 65469	18.03.2022й №ПК-172	Танлов асосида
37	Бердах қўчаси	2022 йил	0,150	280,992	280,992	280,992	280,992	280,992	274,692			6,300	3,780	0,150	280,992			17.10.2022й № 65557	18.03.2022й №ПК-172	Танлов асосида
7	Шайхонтоҳур тумани		0,419	326,567	326,567	326,567	326,567	326,567	276,767			49,800	29,880	0,419	326,567					
	Бўстон МФЙ		0,369	260,155	260,155	260,155	260,155	260,155	215,155			45,000	27,000	0,369	260,155					
38	Ал-Хоразмий 1-2-тор қўчалари	2022 йил	0,369	260,155	260,155	260,155	260,155	260,155	215,155			45,000	27,000	0,369	260,155			08.11.2022й № 68934	18.03.2022й №ПК-172	Танлов асосида
	Зафаров МФЙ жамии:		0,050	66,412	66,412	66,412	66,412	66,412	61,612			4,800	2,880	0,050	66,412					
39	Шуманай 3-тор қўчаси		0,050	66,412	66,412	66,412	66,412	66,412	61,612			4,800	2,880	0,050	66,412			08.11.2022й № 68938	18.03.2022й №ПК-172	Танлов асосида
8	Юнусобол тумани		4,785	7 549,562	7 549,562	7 549,562	7 549,562	7 544,288	7 352,659			211,629	126,978	5,502	7 549,562					
	Текстаниш МФЙ жамии:		0,600	667,382	667,382	667,382	667,382	667,382	649,982			17,400	10,440	0,600	667,382					
40	Нуртена қўчаси	2022 йил	0,600	667,382	667,382	667,382	667,382	667,382	649,982			17,400	10,440	0,600	667,382			17.10.2022й № 65670	18.03.2022й №ПК-172	Танлов асосида
	Катта Хасанбой МФЙ жамии:		0,961	213,367	213,367	213,367	213,367	213,367	183,971			29,396	17,638	0,961	213,367					

№	Объектлар номи ва манзили	3	4	5	6	7	8	9	Шу жумладан:				13	Асосий фондларни ишга туширилгани		16	17	18	19	20	
									10	11	12	шундан:		куват (км)	қиймати						
41	Катта Хасанбой 2-тор кўчаси	2022 йил	0,161	80,446 5,796	80,446 5,796	80,446 5,796	80,446 5,796	80,446 5,796	80,446	74,650	Жиҳоз	5,796	3,478	0,161	80,446	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	0,000	0,000	19.10.2022Й № 65966	18.03.2022Й МЭПҚ-172	Танлов асосида
42	Туракўрғон кўчаси	2022 йил	0,800	132,921 23,600	132,921 23,600	132,921 23,600	132,921 23,600	132,921	109,321		Буюртмачи харajatлари	23,600	14,160	0,800	132,921	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	0,000	0,000	19.10.2022Й № 65969	18.03.2022Й МЭПҚ-172	Танлов асосида
43	Оромтоқ кўчаси	2022 йил	0,100	63,490 9,000	63,490 9,000	63,490 9,000	63,490 9,000	63,490	54,490		Буюртмачи харajatлари	9,000	5,400	0,100	63,490	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	0,000	0,000	17.10.2022Й № 65664	18.03.2022Й МЭПҚ-172	Танлов асосида
44	Бочча 2-тор кўчаси (Руднева)	2022 йил	0,178	132,751 6,588	132,751 6,588	132,751 6,588	132,751 6,588	132,751	126,163		Буюртмачи харajatлари	6,588	3,953	0,178	132,751	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	0,000	0,000	17.10.2022Й № 65667	18.03.2022Й МЭПҚ-172	Танлов асосида
45	Обод МФЙ жасди:		0,419	321,749	321,749	321,749	321,749	321,749	309,175		Буюртмачи харajatлари	12,574	7,544	0,419	321,749	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	0,000	0,000	16.10.2022Й № 65466	18.03.2022Й МЭПҚ-172	Танлов асосида
46	Туркистон МФЙ жасди:		0,698	589,085	589,085	589,085	589,085	589,085	574,409		Буюртмачи харajatлари	14,676	8,806	0,698	589,085	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	0,000	0,000	14.10.2022Й № 65255	18.03.2022Й МЭПҚ-172	Танлов асосида
47	Кулолқўрғон МФЙ жасди:		0,695	300,330	300,330	300,330	300,330	300,330	290,890		Буюртмачи харajatлари	19,406	11,644	0,402	300,330	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	0,000	0,000	19.10.2022Й № 65974	18.03.2022Й МЭПҚ-172	Танлов асосида
48	Кулолқўрғон 6-тор кўчаси	2022 йил	0,293	300,330	300,330	300,330	300,330	300,330	290,890		Буюртмачи харajatлари	9,440	5,664	0,402	300,330	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	0,000	0,000	19.10.2022Й № 65974	18.03.2022Й МЭПҚ-172	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва мивиди	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Шу жумладан:			Асосий фондларни ишла туширилгани		16	17	18	19	20	
											10	11	12	13	14						15
1																					
	Уста Ширин МФЙ жамия:				0.132	78,496	78,496	78,496	78,496	78,496	73,096	0.000	5,400	3,240	0.132	78,496	0.000	0.000			
49	Акмад пўлат кўчаси			2022 йил	0.132	78,496	78,496	78,496	78,496	78,496	73,096	0.000	5,400	3,240	0.132	78,496	0.000	0.000	19.10.2022Й №65978	18.03.2022Й №ПК-172	Танлов асосида
	Олчипор-1 МФЙ жамия:				0.100	71,579	71,579	71,579	71,579	71,579	64,529	0.000	7,050	4,230	0.100	71,579	0.000	0.000			
50	Хитой 1-тор кўчаси			2022 йил	0.100	71,579	71,579	71,579	71,579	71,579	64,529	0.000	7,050	4,230	0.100	71,579	0.000	0.000	19.10.2022Й №65975	18.03.2022Й №ПК-172	Танлов асосида
	Шарк Хайкалти МФЙ жамия:				0.136	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4,760	2,856	0.000	0.000	0.000	0.000			
51	Янгиқўрғон кўчаси			2022 йил	0.136	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4,760	2,856	0.000	0.000	0.000	0.000			
	Янгишарош МФЙ жамия:				0.406	329,240	329,240	329,240	329,240	329,240	318,273	0.000	10,967	6,580	0.406	329,240	0.000	0.000			
52	Чинарбол 3-тор ва Фирдавсий кўчаси			2022 йил	0.406	329,240	329,240	329,240	329,240	329,240	318,273	0.000	10,967	6,580	0.406	329,240	0.000	0.000	24.10.2022Й №66716	18.03.2022Й №ПК-172	Танлов асосида
	Янгишарк МФЙ жамия:				0.360	168,372	168,372	168,372	168,372	168,372	157,572	0.000	10,800	6,480	0.360	168,372	0.000	0.000			
53	Ифтихор 6-тор кўчаси			2022 йил	0.360	168,372	168,372	168,372	168,372	168,372	157,572	0.000	10,800	6,480	0.360	168,372	0.000	0.000	14.10.2022Й №65257	18.03.2022Й №ПК-172	Танлов асосида
	Регистон МФЙ жамия:				1.146	4 613,721	4 613,721	4 613,721	4 613,721	4 613,721	4 550,109	0.000	63,612	38,167	1.146	4 613,721	0.000	0.000			
54	Регистон шох кўчаси			2022 йил	0.740	3 426,914	3 426,914	3 426,914	3 426,914	3 426,914	3 381,914	0.000	45,000	27,000	0.740	3 426,914	0.000	0.000	15.11.2022Й №69906	18.03.2022Й №ПК-172	Танлов асосида
55	Регистон 1-тор кўчаси			2022 йил	0.206	179,624	179,624	179,624	179,624	179,624	170,612	0.000	9,012	5,407	0.206	179,624	0.000	0.000	17.10.2022Й №64732	18.03.2022Й №ПК-172	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланishi ва тугаллаinish йили	Лойиҳавий қуввати тегишли ўлчов бирликларида (км)	Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил янми капиталда қўшилганлар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишла тушириш		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ молиялаштириши	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тешер савдолари байномаси тасдиқланган санаси ва рақами	Дойишми таъминотлари	
									Қурилиш-мониторинг ишларининг умумий қиймати	Жилоз	Буюртмачининг бошқа харажатлари	Буюртмачи харажатлари шундан:	Қуввати (км)	қиймати						
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
56	Жумамасқид кўчаси	2022 йил	0.200	1 007,183 9,600	1 007,183 9,600	1 007,183 9,600	1 007,183 9,600	1 007,183	997,583			9,600	5,760	0.200	1 007,183			14.10.2022й № 65249	18.03.2022й №ТК-172	Танлов асосида
9	Яккасарой тумани		0.603	331,137	331,137	331,137	331,137	331,137	316,757	0.000		14,380	8,622	0.603	331,137	0.000	0.000			
✓	Рақат МФЙ жамии:		0.192	145,886	145,886	145,886	145,886	145,886	141,076	0.000		4,810	2,880	0.192	145,886			27.10.2022й № 66773	18.03.2022й №ТК-172	Танлов асосида
✓	Ал-Фарғоний кўчаси	2022 йил	0.192	145,886 4,810	145,886 4,810	145,886 4,810	145,886 4,810	145,886	141,076			4,810	2,880	0.192	145,886			27.10.2022й № 66773	18.03.2022й №ТК-172	Танлов асосида
✓	Декўбгўк МФЙ жамии:		0.411	185,251	185,251	185,251	185,251	185,251	175,681	0.000		9,570	5,742	0.411	185,251	0.000	0.000			
✓	Шота Руставелин 1-тор кўчаси	2022 йил	0.411	185,251 9,570	185,251 9,570	185,251 9,570	185,251 9,570	185,251	175,681			9,570	5,742	0.411	185,251			27.10.2022й № 66774	18.03.2022й №ТК-172	Танлов асосида
10	Янги хавёт тумани		0.240	212,314	212,314	212,314	212,314	212,314	204,016	0.000		8,298	4,979	0.240	212,314	0.000	0.000			
✓	Олмасор МФЙ жамии:		0.240	212,314	212,314	212,314	212,314	212,314	204,016	0.000		8,298	4,979	0.240	212,314	0.000	0.000			
✓	Ерени хавёт 4-тор кўчаси	2022 йил	0.240	212,314 8,298	212,314 8,298	212,314 8,298	212,314 8,298	212,314	204,016			8,298	4,979	0.240	212,314			24.10.2022й № 65728	18.03.2022й №ТК-172	Танлов асосида
11	Яшнобода тумани		9.045	5 707,980	5 707,980	5 707,980	5 707,980	5 729,518	5 401,400	0.000		328,118	196,872	9.586	5 707,980	0.000	0.000			
✓	Мўминлар МФЙ жамии:		1.103	609,739	609,739	609,739	609,739	609,739	579,091	0.000		30,648	18,389	1.103	609,739	0.000	0.000			
✓	Охтинрабо кўчаси	2022 йил	1.103	609,739 30,648	609,739 30,648	609,739 30,648	609,739 30,648	609,739	579,091			30,648	18,389	1.103	609,739			01.11.2022й № 68069	18.03.2022й №ТК-172	Танлов асосида
✓	Олмас МФЙ жамии:		0.058	0.000	0.000	0.000	0.000	2,842	0.000	0.000		2,842	1,705	0.000	0.000	0.000	0.000			
61	Кўнгулгой 2-тор кўчаси	2022 йил	0.058					2,842	0.000			2,842	1,705	0.000	0.000				18.03.2022й №ТК-172	Танлов асосида

№	Объектлар номи ва мавқани	Қурилиш ишларининг бошланиш ва тугаллиниш йили	Лоийҳавий қуввати тегишли ўлчов бирликларда (кВт)	Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисобланган кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисобланган қиймат, шу жумладан молиялаштириши, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил жами қийматлари	Шу жумладан:				Асосий фондларни илга туширилгани		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ молиялаштириши	Лоийҳа экспертиза санаси ва рақами	Теңдер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лоийҳачи таъкиқлогларни
									Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Жиҳоз	Буюртмачининг бошқа харажатлари	шундан:	қуввати (кВт)	қиймати					
1																			
62	Бунёккор МФЙ жамғи:	2022 йил	0.303	262,830	262,830	262,830	262,830	262,830	249,738	0.000	13,092	7,855	0.303	262,830	0.000	0.000	01.11.2022Й № 68064	18.03.2022Й №172	Танлов асосида
63	Хатирчи кўчаси	2022 йил	0.638	495,862	495,862	495,862	495,862	472,684	23,178	13,907	0.638	495,862	0.000	0.000	24.10.2022Й № 66744	18.03.2022Й №172	Танлов асосида		
64	Бирлашган МФЙ жамғи:	2022 йил	1.204	820,734	820,734	820,734	820,734	784,208	36,526	21,916	1.204	820,734	0.000	0.000	24.10.2022Й № 66739	18.03.2022Й №172	Танлов асосида		
65	Имом Бухорийи кўчаси	2022 йил	1.206	735,397	735,397	735,397	735,397	700,329	35,068	21,041	1.206	735,397	0.000	0.000	01.11.2022Й № 68059	18.03.2022Й №172	Танлов асосида		
66	Чинор МФЙ жамғи:	2022 йил	0.505	0.000	0.000	0.000	16,296	0.000	16,296	9,778	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	18.03.2022Й №172	Танлов асосида		
67	Сокини кўчаси	2022 йил	0.500	546,989	546,989	546,989	546,989	509,789	37,200	22,320	0.500	546,989	0.000	0.000	27.10.2022Й № 66772	18.03.2022Й №172	Танлов асосида		

№	Объектлар номи ва мавзиси	3	4	5	6	7	8	9	Шу жумладан:				Асосий фондларни нига туширишни		16	17	18	19	20	
									10	11	12	13	куватни (км)	қиймати						
1																				
	А.Ясаевий МФЙ жамғи:		1.732	878.503	878.503	878.503	878.503	880.903	822.235	0.000	58.668	35.201	1.632	878.503	0.000	0.000				
68	А.Ясаевий МФЙ Гижлувои кўчаси	2022 йил	0.382	247.172 9.168	247.172 9.168	247.172 9.168	247.172 9.168	247.172	238.004		9.168	5.501	0.382	247.172			28.10.2022Й № 66902	18.03.2022Й №ПК-172	Танлов асосида	
69	А.Ясаевий МФЙ Кўприкчи кўчаси	2022 йил	0.450	191.835 13.500	191.835 13.500	191.835 13.500	191.835	191.835	178.335		13.500	8.100	0.450	191.835			24.10.2022Й № 65735	18.03.2022Й №ПК-172	Танлов асосида	
70	А.Ясаевий МФЙ Хаваз кўчаси	2022 йил	0.800	439.496 33.600	439.496 33.600	439.496 33.600	439.496	439.496	405.896		33.600	20.160	0.800	439.496			24.10.2022Й № 65730	18.03.2022Й №ПК-172	Танлов асосида	
71	М.Ашрафий кўчаси	2022 йил	0.100					2.400			2.400	1.440						18.03.2022Й №ПК-172	Танлов асосида	
72	Дўстобод МФЙ жамғи: Дўстобод МФЙдаги Паркент 4-6-тор, Сандиқчи 2-3-тор, 56-харбидар шаҳарчаси, Корпусувўйи (Азроқдомчиёв) кўчаси, Анкара, Паркент Дилгоҳовский кўчаси 17-уш олдн кўчаларини жорин таъмирлаш	2022 йил	3.000	1.357.926 1.357.926 74.600	1.357.926 1.357.926 74.600	1.357.926 1.357.926 74.600	1.357.926	1.357.926	1.283.326	0.000	74.600	44.760	3.000	1.357.926			24.10.2022Й № 65738	18.03.2022Й №ПК-172	Танлов асосида	



“КИРИЛДИ” ҚИЛЛИМОНОВИЙ YO‘LLARI BOSH BUREAU
 “Ташкент шаҳар маҳалла ва янги қишлоқлар бўлими”
 ХИЗАМТИ ДАВЛАТ ХИЗМАТИ
 О.У. Абдулхайдаров



Д. Исмагулова
 2022 й



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NORBAYEV DUSMUROT ELOMONOVICH

Sana: 19-10-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 65966

Obyekt nomi «по расчету стоимости сметной документации по объекту «Тошкент шаҳар Юнусобод тумани Катта Хасанбой МФЙ даги Катта Хасанбой 2-тор кўчаси 0,095 км йўлини жорий таъмирлаш»»

Buyurtmachi - ООО «RAVON LOYIHA LUX» (для ГУП «СЗ» по региональным дорогам г.Ташкент)

Bosh loyihachi - ООО «RAVON LOYIHA LUX»

Litsenziya № АЛ-000541 от 04-02-2020г.

Moliyalashtirish manbai - Бюджетные средства

Bosh pudratchi - определяется по результатам конкурсных торгов

Qurilish turi Текущий ремонт

Murojaat raqami: № 62274

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. Постановление Президента РУз № ПК-172 от 18.03.2022г.
- 1.2. Задание на расчет стоимостей по объекту, утвержденное заказчиком ГУП «СЗ» по региональным дорогам г.Ташкент, согласованное проектной организацией ООО «RAVON LOYIHA LUX» от 2022г.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

- 2.1. Дефектный акт и исполнительная схема по объекту, утверждённые заказчиком ГУП «СЗ» по региональным дорогам г.Ташкент, и согласованные проектной организацией ООО «RAVON LOYIHA LUX» от 2022г.
- 2.2. Расчет стоимости работ в текущих ценах в сумме 78015,603 тыс.сум с НДС и без затрат заказчика.
- - ведомость потребных ресурсов и локальная ресурсная ведомость.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

- 3.1. Представленной сметной документацией и утвержденным дефектным актом предусматриваются следующие работы:
 - -срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий толщ. слоя 5 см;
 - -устройство выравнивающих слоев оснований из фрезерованного материала;
 - -устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков

асфальтобетона;

- -устройство покрытия из горячих плотных мелкозернистых асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками толщиной слоя 5 см и др.
- 3.2. Расчетная сметная документация составлена в соответствии с Постановлениями КМ РУз. от 11.06.2003 г. №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», от 12.05.2004 г. №226 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Уз», ШНК 4.01.16-09 «Правила по определению стоимости строительства в договорных текущих ценах».
- В основе расчета использован ресурсный метод.
- Ресурсные ведомости составлены с использованием действующей в республике сметно-нормативной базы.
- Стоимости основных строительных материалов, конструкций, изделий и оборудования уточнено в соответствии с каталогом текущих цен, разрабатываемого ежеквартально, цен на биржах и ярмарках строительных материалов, оптово-отпускных цен заводов-изготовителей.
-

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

-

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- -заказчиком - ГУП «СЗ» по региональным дорогам г.Ташкент.

6. Ekspertiza natijalari.

- 5.1.В процессе рассмотрения в документацию внесены изменения и дополнения.
- -откорректированы и уточнены сметные нормы на демонтажные работы, затраты основных строительных материалов, затраты труда рабочих-строителей, затраты на эксплуатацию машин и механизмов и др.
- 5.2. По результатам экспертного рассмотрения заявленная стоимость работ в текущих ценах в сумме 78015,603 тыс.сум с НДС и без затрат заказчика снижена на 3365,308тыс.сум и составила в сумме 74650,295 тыс.сум с НДС и без затрат заказчика.
- Снижение достигнуто за счет корректировки объемов работ, стоимости ресурсов и др.
- Отмечается, что в сметном расчете уровень прочих затрат подрядной организации принят в размере 17,27%.
- 5.3. При производстве демонтажных работ, стоимость возврата материалов определить совместно с заказчиком и подрядчиком.
- 5.4. Документация представлена на экспертное рассмотрение без замечаний заказчика.
- 5.5. Заказчику, до утверждения, необходимо согласовать документацию со всеми заинтересованными организациями в установленном порядке.

7. Xulosalar.

- 6.1. Расчет стоимости сметной документации в текущих ценах по объекту **«Тошкент шаҳар Юнусобод тумани Катта Хасанбой МФЙ даги Катта Хасанбой 2-тор кўчаси 0,095 км йўлини жорий таъмирлаш»**, с учетом результатов экспертизы рекомендуется для дальнейшего рассмотрения и утверждения со стоимостью в сумме 74650,295 тыс.сум с НДС и без затрат заказчика.
- 6.2.В соответствии с «Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах», утвержденным Постановлением Кабинета Министров

РУз. от 11.06.2003 г. №261 и Постановлением Кабинета Министров РУз. №46 от 31.01.2022г., стоимость работ для проведения конкурсных торгов принимает заказчик с учетом требований действующих нормативных документов и др.

- 6.3.Рекомендуемые стоимости работ является ориентировочным и подлежит уточнению по фактически выполненным затратам и объемам работ, принимается заказчиком и подрядной организацией по результатам контрольного обмера с учетом требований действующих нормативных документов и др.

Bosh mutaxassis: Minzyanov Dmitriy Galimzyanovich
