

ҚУРИЛИШ МОНТАЖ ИШЛАРИНИ БАЖАРИШ БЎЙИЧА №450-2022-сонли ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ

Наманган шаҳри

7 декабрь 2022 йил

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган «Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати» ДУК номидан Низом асосида иш кўрувчи корхона директори О.Назаров биринчи томондан ва иккинчи томондан «Пудратчи» деб юритиладиган Чортоқ ТЙФУК номидан Низом асосида иш кўрувчи жамият директори Ж.Қодиров, кейинги ўринларда «объект» деб юритиладиган, Чортоқ тумани Бағрикенглик МФЙ ички кўчаларини 1,269 км.ни жорий таъмирлаш (асфальтлаш) ишларини бажаришга доир мазкур шартномани тузиб имзоладилар.

I. Шартнома мавзуси

1. «Пудратчи» мазкур шартнома шартлари ва белгиланган тартибда тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатларига мувофиқ «Объект»да ишларни бажариш мажбуриятини олади, «Буюртмачи» эса «Пудратчи»га ишларни бажариш учун зарур бўлган шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

II. Шартнома бўйича ишлар қиймати

2.1. Мазкур шартнома Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сон қарори ва 2022 йил 3 декабрдаги №194533-сонли танлов баённомасига асосан «Пудратчи» томонидан объектда бажариладиган қурилиш монтаж ишлари юзасидан аниқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда 539 400 000 (беш юз ўттиз тўққиз миллион тўрт юз минг) сўмни ташкил этади.

2.2. Шартноманинг 2.1. бандида кўрсатиб ўтилган ишларнинг қиймати якуний деб ҳисобланади ва яна қайта кўриб чиқилмайди, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

– қурилиш қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

– ишлар ҳажми «Буюртмачи» томонидан ўзгартирилганда;

2.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, мазкур шартномага киритиладиган ўзгартиришлар «Буюртмачи» ва «Пудратчи» томонларидан шартномага қўшимча келишув битими орқали расмийлаштирилади.

III. «Пудратчи»нинг мажбуриятлари

3.1. Мазкур шартнома бўйича «Пудратчи» мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

– Барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг 1-иловасига мувофиқ «Ишларни бажариш жадвали»да назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни «Буюртмачи»га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

– «Буюртмачи»ни пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

– Мазкур шартнома бўйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари ва асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, анжомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бўшатиш;

3.2. Ушбу шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

3.3. «Пудратчи» мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун «Буюртмачи» олдида тўлиқ мулккий жавоб беради.

IV. «Буюртмачи»нинг мажбуриятлари

Мазкур шартномани бажариш учун «Буюртмачи»:

4.1. «Объект»да қурилиш-монтаж ишлари бўйича ишлаб чиқилиб тегишли равишда тасдиқланган лойиҳа-смета ҳужжатларини «Пудратчи»га тақдим қилиш;

4.2. Шартноманинг 1-илоvasи “Ишларни бажариш жадвали”га асосан бажариладиган ишларни тўла ҳажмда бажарилиши ва сифати устидан доимий техник назоратини амалга ошириш;

4.3. Шартномада қайд этилган «Пудратчи» томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш,

4.4. «Пудратчи»дан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

4.5. Шартноманинг 2-илоvasида келтирилган “Молиялаштириш жадвали”га мувофиқ «Пудратчи»га аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

4.6. «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатиб ўтилган ҳужжатларга мувофиқлигини текшириш;

4.7. «Пудратчи» томонидан лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида олиб борилмаган, сифатсиз ҳамда тўла ҳажмда бажарилмаган ишларни ўзининг ҳисобидан қайтадан бажарилишини таъминлаш;

4.8. «Пудратчи»нинг барча мурожаатларини ўн кун муддатда кўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятларини ўз зиммасига олади.

V. Ишларни бажариш муддатлари

5.1. «Пудратчи» мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

5.2. Мазкур шартнома бўйича ишлар “Ишларни бажариш жадвали”га мувофиқ амалга оширилади.

VI. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

6.1. «Буюртмачи» «Пудратчи»га шартнома бўйича 30 фоиз миқдорида аванс ўтказди, бу 161 820 000 (бир юз олтмиш бир миллион саккиз юз йигирма минг) сўмни ташкил этади.

6.2. «Буюртмачи» томонидан «Пудратчи»га аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1-2-иловалар).

6.3. Жорий ойма-ой молиялаштириш амалда бажарилган ишлар ҳажми ва сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 95 фоизигача доирасида амалга оширилади.

6.4. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган 5 фоизи миқдоридаги тўлови, қурилиш ишлари тугалланиб, объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилиниб, мазкур шартномада қайд этилган кафолатли муддат ўтиб бўлгандан сўнг, «Буюртмачи» ва «Пудратчи» ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоблар якуний натижаларидан келиб-чиққан ҳолда ва шу билан бирга жорий молия йили тугамасдан амалга оширилади.

6.5. «Пудратчи»нинг ишончли вакили бажарилган ишларни молиялаштириш мақсадида бажарилган ишлар тўғрисидаги ҳисоб варағи (Ф-3)ни нуқсонларсиз, ўрнатилган тартиб ва белгиланган муддатларда «Буюртмачи» томонидан тайилланган техник назоратчи иштирокида «Буюртмачи»нинг ҳисоб-китоб бўлимига тўлов ҳужжатларини расмийлаштириш учун тақдим этади.

6.6. Томонларни ўзаро ҳисоб-китобларни узил-кесил ҳал этиш учун «Пудратчи» «Буюртмачи»га бажарилган ишларни қабул қилиб олиш далолатномасини молия йили декабр ойининг 5 чи кунига қадар тақдим этиши шарт.

VII. Ишларни бажариш

7.1. «Буюртмачи» қурилиш майдонида ўз вакилини – техник назоратчини тайинлайди, у «Буюртмачи»нинг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек «Пудратчи» томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

7.2. Техник назоратчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун даври мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўсиқсиз танишиш ҳуқуқига эгадир.

7.3. «Пудратчи» техник назоратчи ишлаш учун жой билан таъминлайди. Техник назоратчи «Пудратчи» томонидан ўтказиладиган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

7.4. «Пудратчи» ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

7.5. Курилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш «Пудратчи»нинг вазифаси ҳисобланади.

7.6. «Пудратчи» ўзи томонидан курилишда қўлланиладиган курилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, техник регламентларга ёки стандартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

7.7. Агар беркитиладиган ишлар «Буюртмачи»нинг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича «Пудратчи» «Буюртмачи»нинг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

7.8. Агар «Буюртмачи» «Пудратчи» ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда «Пудратчи» ўз кучлари билан ва курилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

7.9. «Пудратчи» «Буюртмачи» томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

7.10. «Пудратчи» сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, «Пудратчи» уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни «Буюртмачи»га тўлайди.

VIII. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

8.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, ёки шартноманинг бажариш муддати мобайнида янги конун ҳужжати қабул қилинганлиги туфайли бажармаган ёки лозим даражада бажармаганлигини исботласа томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

8.2. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда «Пудратчи» ва «Буюртмачи» ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

8.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

IX. Курилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш

9.1. Курилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек курилиши тугалланган объектларни фойдаланишга қабул қилиб олишнинг белгиланган қоидаларига биноан амалга оширилади.

9.2. Объектлар уларнинг фойдаланишга тайёрлиги тўғрисида «Пудратчи»нинг ёзма билдиришномаси «Буюртмачи» томонидан олинган кундан бошлаб 5 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

9.3. «Пудратчи» курилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ «Буюртмачи»га «Буюртмачи» томонидан белгиланган таркибда икки нусхада ижро ҳужжатларини беради. «Пудратчи» «Буюртмачи»га ушбу ҳужжатлар тўплами амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

9.4. «Пудратчи» объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича «Объект»га мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект «Буюртмачи»га топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи «Пудратчи»нинг зиммасида бўлади.

Х. Кафолатлар

10.1. «Пудратчи»:

– барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

– лойиҳа ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш сифатини;

– ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, техник регламентлар ёки стандартларга мувофиқлигини;

– ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишни;

– объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

10.2. «Объект»да бажарилган ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган «Объект»ни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида 12 ой этиб белгиланади.

10.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар «Пудратчи» томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

10.4. Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари «Пудратчи» ва «Буюртмачи»нинг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

10.5. Агар «Пудратчи» бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда «Буюртмачи» мазкур шартноманинг VI бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини «Пудратчи»дан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

10.6. «Пудратчи» нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш «Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Йўл-қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекциясини» томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича иқтисодий судга мурожаат қилишини истисно этмайди.

XI. Шартномани бекор қилиш

11.1. «Буюртмачи»:

– шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши «Буюртмачи»га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра «Пудратчи» томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

– ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати «Пудратчи»нинг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, «Пудратчи» томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

– «Пудратчи» томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

– қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

11.2. «Пудратчи»:

– ишларнинг бажарилиши «Пудратчи»га боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра «Буюртмачи» томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

– «Буюртмачи» томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

– «Буюртмачи» мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, «Пудратчи» бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда «Буюртмачи»ни ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда «Буюртмачи» «Пудратчи» томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

– қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

11.3. Шартнома бекор қилинганда «Буюртмачи» ва «Пудратчи»нинг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда «Буюртмачи»га берилади, «Буюртмачи» бажарилган ишлар қийматини «Пудратчи»га тўлайди.

11.4. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

11.5. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

11.6. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XII. Томонларнинг мулкӣ жавобгарлиги

12.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

12.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун «Буюртмачи» «Пудратчи»га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши «Буюртмачи»ни шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

12.3. «Пудратчи» объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун «Буюртмачи»га муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

12.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда «Буюртмачи» «Наманган қурилиш таъмир экспертиза бюроси мутахассисининг хулосасига мувофиқ» объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек «Пудратчи»дан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорига жарима ундириш ҳуқуқига эга.

12.5. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

12.6. Муддати ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XIII. Низоларни ҳал этиш тартиби

13.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

XIV. Алоҳида шартлар

14.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

14.2. «Пудратчи» қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини «Буюртмачи»нинг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

14.3. Шартномага ишлар ҳажмининг кўпайиши ёки лойиҳанинг ўзгартирилиши билан боғлиқ ўзгартиришлар киритилишига йўл қўйилмайди.

Ишлар ҳажмининг кўпайиши ёки лойиҳанинг ўзгартирилиши фақат конун ҳужжатларида курсатилган ҳолатлар ва белгиланган тартиб асосида амалга оширилиши мумкин.

14.4. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

14.4. «Буюртмачи» билан «Пудратчи» ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

14.5. Агар «Пудратчи» шартнома бўйича ишлар якунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда «Буюртмачи» «Пудратчи» қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

14.6. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги конун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

14.7. Шартнома тарафлар томонидан имзоланиб, Ҳазначилик идораларидан рўйхатдан ўтказилган сўнг кучга қиради.

14.8. Шартноманинг амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабр гача деб белгиланади.

14.9. Мазкур шартнома икки нусхада тузилган бўлиб, шартноманинг барча нусхалари тенг юридик кучга эгадир.

XV. Томонларнинг банк реквизитлари ва юридик манзиллари:

«БУЮРТМАЧИ»

Наманган минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати ДУК

Манзил: Наманган вилояти, Наманган шаҳри,
Саноат кўча 19-уй
Тел./факс: (78) 223-02-30
Ш.Х.В: 301821860144017045204118079
ИНН: 304893929, ОКОНХ: 71120
Ўзбекистон Республикаси Молия
вазирлиги Ҳазначилиги
х/р: 23 402 000 300 100 001 010
Банк: Марказий банк Тошкент ШББ. ХККМ
МФО: 00014, ИНН: 201122919


Директор  О.Назаров
М.Ў


Ҳуқуқшунос  Р.Шамсутдинова

«ПУДРАТЧИ»

Чортоқ туман йўллардан фойдаланиш
унитар корхонаси

Манзил: Чортоқ тумани, Чортоқ ш,
Мустақиллик кўчаси 10-уй
тел./факс: 0-369-412-47-84
ШХВ: 470010860142367045193118001
ИНН: 200106898, ОКОНХ: 61129
Ўзбекистон Республикаси Молия
вазирлиги Ҳазначилиги
х/р: 23 402 000 300 100 001 010
Банк: Марказий банк Тошкент ШББ. ХККМ
МФО: 00014, ИНН: 201122919

Директор  Ж.Қодиров
М.Ў

Ҳуқуқшунос  А.Ҳорбоев

2022 йил 7 декабрдаги
 №450-2022-сонли шартномага
 I-илова

Наманган вилояти Чортоқ тумани Бағрикентлик МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш ишларини

БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

№	Амалга ошириладиган ишлар	2022-йил учун қурилиш қиймати												Жами
		ойлар												
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Чортоқ тумани Бағрикентлик МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш												539 400 000	539 400 000
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	539 400 000



Буюртмачи **О. Назаров**



Ўзгартгчи

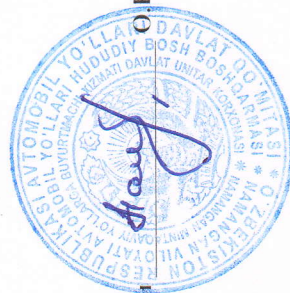
Ж. Кодиров

2022 йил 7 декабрдаги
№450-2022-сонли шартномага
2-илова

Наманган вилояти Чортоқ тумани Бағрикенглик МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш ишларини

МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

№	Молиялаштириш шартлари	2022-йил учун молиялаштириш графиги												Жами	
		ойлар													
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Аванс 30%														161 820 000
2	Жорий молиялаштириш (берилган аванс ҳисобга олган ҳолда бажарилган ишлар тўғрисидаги ҳисоб варағи (Ф-3) миқдорда)														350 610 000
3	5% кафолат маблағ														26 970 000
	Жами														539 400 000



Буюртмачи О.Назаров



Пудратчи Ж.Кодиров

МУХОКАМА АХБОРОТИ

07.12.2022 йил

Наманган шаҳри

Наманган вилояти ҳудудидаги Наманган минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати ДУК томонидан 21.11.2022 йилдаги 194533-сонли лотга асосан Ўзбекистон Республикасининг 22.04.2021 йилдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 56 ва 58 – моддалари талабларидан келиб чиқиб энг яхши таклифларни танлаш тури бўйича Наманган вилояти Чортоқ тумани Бағрикенглик МФЙ Гулистон кўчасини жорий таъмирлаш ишлари учун харидлар амалга оширилиши режалаштирилган. Шунга асосан белгиланган муддатлар асосида Ўзбекистон Республикасининг 22.04.2021 йилдаги 684-сонли “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни – 60 ва 61-моддалари талабларидан келиб чиқиб танлов савдолари ўтказилди. Мазкур танлов савдолари якуни бўйича "Чортоқ ТЙФУК" томонидан берилган таклифлар комиссия аъзолари иштирокидан энг мақбули деб топилди. Ушбу танлов жараёнлари бўйича расмийлаштирилган баённомалар “Давлат харидлари тўғриси”даги қонуни 62-моддасига асосан давлат буюртмачиси томонидан у расмийлаштирилган кунда давлат харидларининг электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Шунга асосан икки иш кун ичида танлаш иштирокчилари томонидан танлаш ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар келиб тушмади. Юқоридаги ҳолатлардан келиб чиқиб, давлат буюртмачиси ва харид комиссияси томонидан ғолиб деб топилган иштирокчи ўртасида шартнома тузилиши мумкин ҳисобланиши белгилаб олинди. Муҳокама учун белгиланган муддат тугаганидан кейин келиб тушган эътирозлар харид комиссияси томонидан қўриб чиқилмайди.

Наманган Минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати ДУК директори:



О.Назаров

Корхона бош ҳисобчиси



А.Тожибаев



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 194533 на приобретение Текущий ремонт улиц в МСГ “Багрикенглик” Чартакского района Наманганской области

Способ проведения электронный

Дата 03.12.2022

Время рассмотрения 02.12.2022 20:43

Закупочная комиссия Наманган минтакавий йулларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	Назаров Одилжон Олимжанович	директор	Наманган МЙБХ ДУК
Секретарь комиссии	YUSUPOV SHUXRAT XAKIMJONOVICH	специалист по договору	гасн
Член комиссии	Ахмедов Нозим Носирович	бош муҳандис	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	Боёзов Дилшод Адхамжонович	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	Хакимбаев Ойбек Орифович	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	Инамов Илхомхўджа Исломхўжаевич	бўлим бошлиғи	Наманган МЙБХ ДУК
Член комиссии	ABDURAZAQOV ABDUSALOM ABDUSATOROVICH	Ўзбекистон Республикаси Монополияга қарши курашиш қўмитасининг Наманган вилояти ҳудудий бошкармаси ходими	Ўзбекистон Республикаси Монополияга қарши курашиш қўмитаси
Член комиссии	Тожибаев Акмалжон Алишерович	бош ҳисобчи	Наманган МЙБХ ДУК

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 03.12.2022 года № лота 194533.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Чортоқ тумани Бағрикенглик МФЙ Гулистон кўчаси 1,2 км. қисмини асфальтлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	545 607 012.00
Стартовая сумма	545 607 012.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие

баллы:

Критерий №1 Форма-8

Тип: Текстовое значение

Описание: Свидетельство осмотра стройплощадки

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ДУСЛИК МЧЖ	1	майдон урганилди	1	Экспертная		
УП ҚАМСИҚАҰТӨҮО'Л	1	10	1	Экспертная		
TEMURBEK-BUILDING MCHJ	1	540200000	1	Экспертная		
УП NAMANGAN YO'L QURISH-TA'MI	1	Свидетельство осмотра стройплощадки	1	Экспертная		
ГУП CHORTOQ TUMAN YO'LLARDAN	1	539400000	1	Экспертная		
UNIQUE POWER TERMIZ MCHJ	1	1	1	Экспертная		
"КАПИТАЛСТРОЙ БОШҚАРМАСИ" МЧЖ	1	маълумот	1	Экспертная		

Критерий №2 Форма-5

Тип: Текстовое значение

Описание: Опыт работы участника конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ДУСЛИК МЧЖ	23	иш тажрибаси	23	Экспертная		
УП ҚАМСИҚАҰТӨҮО'Л	23	10	13	Экспертная		
TEMURBEK-BUILDING MCHJ	23	540200000	13	Экспертная		
УП NAMANGAN YO'L QURISH-TA'MI	23	Опыт работы участника конкурса	15	Экспертная		
ГУП CHORTOQ TUMAN YO'LLARDAN	23	539400000	23	Экспертная		
UNIQUE POWER TERMIZ MCHJ	23	23	15	Экспертная		
"КАПИТАЛСТРОЙ БОШҚАРМАСИ" МЧЖ	23	MALUMOT	15	Экспертная		

Критерий №3 Форма-1

Тип: Текстовое значение

Описание: Декларация

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ДУСЛИК МЧЖ	5	декларация	5	Экспертная		
УП ҚАМСНІҚАҮТӨҮО'Л	5	10	5	Экспертная		
TEMURBEK-BUILDING MCHJ	5	540200000	5	Экспертная		
УП NAMANGAN YO'L QURISH-TA'MI	5	Декларация	5	Экспертная		
ГУП CHORTOQ TUMAN YO'LLARDAN	5	539400000	5	Экспертная		
UNIQUE POWER TERMIZ MCHJ	5	5	5	Экспертная		
"КАПИТАЛСТРОЙ БОШҚАРМАСИ" МСНЖ	5	маълумот	5	Экспертная		

Критерий №4 Форма-7

Тип: Текстовое значение

Описание: Информация по контрактам (объектам)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ДУСЛИК МЧЖ	2	маълумот юборилмоқда	2	Экспертная		
УП ҚАМСНІҚАҮТӨҮО'Л	2	10	2	Экспертная		
TEMURBEK-BUILDING MCHJ	2	540200000	2	Экспертная		
УП NAMANGAN YO'L QURISH-TA'MI	2	Информация по контрактам (объектам)	2	Экспертная		
ГУП CHORTOQ TUMAN YO'LLARDAN	2	539400000	2	Экспертная		
UNIQUE POWER TERMIZ MCHJ	2	2	2	Экспертная		
"КАПИТАЛСТРОЙ БОШҚАРМАСИ" МСНЖ	2	MALUMOT	2	Экспертная		

Критерий №5 Форма-2

Тип: Текстовое значение

Описание: Информация о неисполненных подрядных договорах

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ДУСЛИК МЧЖ	3	маълумот	3	Экспертная		
УП QAMSHIQAVTOYO'L	3	10	3	Экспертная		
TEMURBEK-BUILDING MCHJ	3	540200000	3	Экспертная		
УП NAMANGAN YO'L QURISH-TA'MI	3	Информация о неисполненных подрядных договорах	3	Экспертная		
ГУП CHORTOQ TUMAN YO'LLARDAN	3	539400000	3	Экспертная		
UNIQUE POWER TERMIZ MCHJ	3	3	3	Экспертная		
"KAPITALSTROY BOSHQARMASI" MCHJ	3	маълумот	3	Экспертная		

Критерий №6 Форма-4

Тип: Текстовое значение

Описание: Финансовое положение участника конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ДУСЛИК МЧЖ	27	молиявий холат тугрисида маълумот юборилмокда	27	Экспертная		
УП QAMSHIQAVTOYO'L	27	10	14	Экспертная		
TEMURBEK-BUILDING MCHJ	27	540200000	27	Экспертная		
УП NAMANGAN YO'L QURISH-TA'MI	27	Финансовое положение участника конкурса	27	Экспертная		
ГУП CHORTOQ TUMAN YO'LLARDAN	27	539400000	27	Экспертная		
UNIQUE POWER TERMIZ MCHJ	27	27	15	Экспертная		
"KAPITALSTROY BOSHQARMASI" MCHJ	27	маълумот	27	Экспертная		

Критерий №7 Форма-6

Тип: Текстовое значение

Описание: Перечень машин и механизмов

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ДУСЛИК МЧЖ	14	техникалар мавжуд	0	Экспертная	Дисквалифицирован	8 та лот буйича голиб деб топилган. кейингиларга салохияти етмайди
УП ҚАМСИҚАВТООҲ'Л	14	10	7	Экспертная		
ТЕМУРБЕК-BUILDING МЧЖ	14	540200000	0	Экспертная	Дисквалифицирован	
УП NAMANGAN YO'L QURISH-TA'MI	14	Перечень машин и механизмов	14	Экспертная		
ГУП CHORTOQ TUMAN YO'LLARDAN	14	539400000	10	Экспертная		
UNIQUE POWER TERMIZ МЧЖ	14	14	10	Экспертная		
"КАПИТАЛСТРОЙ БОШҚАРМАСИ" МЧЖ	14	маълумот	0	Экспертная	Дисквалифицирован	

Критерий №8 Форма-3

Тип: Текстовое значение

Описание: Общая информация об участнике конкурса

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ДУСЛИК МЧЖ	25	ташкилот хакида маълумот	0	Экспертная	Дисквалифицирован	8 та лот буйича голиб деб топилган. кейингиларга салохияти етмайди
УП ҚАМСИҚАВТООҲ'Л	25	10	15	Экспертная		
ТЕМУРБЕК-BUILDING МЧЖ	25	540200000	10	Экспертная		
УП NAMANGAN YO'L QURISH-TA'MI	25	Общая информация об участнике конкурса	13	Экспертная		
ГУП CHORTOQ TUMAN YO'LLARDAN	25	539400000	20	Экспертная		
UNIQUE POWER TERMIZ МЧЖ	25	25	13	Экспертная		
"КАПИТАЛСТРОЙ БОШҚАРМАСИ" МЧЖ	25	маълумот	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
УП NAMANGAN YO`L QURISH-TA`MI	545 607 012.00	518 326 661.40 UZS	518 326 661.40	00.00	518 326 661.40	28.11.2022 11:46:35	10
UNIQUE POWER TERMIZ MCHJ	545 607 012.00	518 326 661.00 UZS	518 326 661.00	00.00	518 326 661.00	28.11.2022 13:26:03	10
ГУП CHORTOQ TUMAN YO`LLARDAN	545 607 012.00	539 400 000.00 UZS	539 400 000.00	00.00	539 400 000.00	28.11.2022 11:56:35	9.60932
УП QAMCHIQAВТОYO`L	545 607 012.00	529 238 801.00 UZS	529 238 801.00	00.00	529 238 801.00	27.11.2022 22:51:53	9.79381

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
УП NAMANGAN YO`L QURISH-TA`MI	72	10	82
"КАПИТАЛСТРОЙ BOSHQARMA SI" MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
TEMURBEK-BUILDING MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
UNIQUE POWER TERMIZ MCHJ	57.6	10	67.6
ГУП CHORTOQ TUMAN YO`LLARDAN	81.9	9.60932	91.50932
ДУСЛИК МЧЖ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
УП QAMCHIQAВТОYO`L	54	9.79381	63.79381

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 194533 от 03.12.2022 года на приобретение Текущий ремонт улиц в МСГ "Багрикенглик" Чартакского района Наманганской области определила победителем:

ГУП CHORTOQ TUMAN YO`LLARDAN
200106898

и резервный исполнитель: УП NAMANGAN YO`L QURISH-TA`MI (305343313)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	Назаров Одилжон Олимжанович	Согласен	
Член комиссии	Ахмедов Нозим Носирович	Согласен	
Член комиссии	Боёзов Дилшод Адхамжонович	Согласен	
Член комиссии	Хакимбаев Ойбек Орифович	Согласен	
Член комиссии	Инамов Илхомхўджа Исломхўжаевич	Согласен	
Член комиссии	Тожибаев Акмалжон Алишерович	Согласен	

Член комиссии	ABDURAZAQOV ABDUSALOM ABDUSATOROVICH	Согласен	
----------------------	---	----------	--

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Наманган вилояти ҳокимлигининг
қўриббосари
А.Хамдамов

2022 йил.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 25 октябрдаги ПҚ-408-сон қарори 1-иловаси ва Наманган вилояти Халқ Депутатлари Кенгашининг 2022 йил 11 ноябрдаги VI-34-134-6-0-К/22 қарори 1-иловаси асосан Наманган вилоятида 2022 йилда аҳолини узок йиллардан бўён қийнаб келаётган муаммоларини бартараф этиш бўйича

М А Н З И Л Л И Р Ў Й Х А Т И

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг босқичини аниқлаш	Шу жумладан												2022 йилда жорий қилинган қурилиш қиймати	2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объект бўлиши мумкин бўлган қурилиш қиймати	2023 йил 1 январь ҳолатига ўтувчи объект бўлиши мумкин бўлган қурилиш қиймати	Тендер шартномаси бўлиши мумкин бўлган қурилиш қиймати	Лойiha экспертиза қилинган объект ва раъони	Қурилиш ташкилотлари								
			Тупроқ қуилиш				Тошдан қуилиш				Бетон қуилиш										Қурилиш қиймати	Қурилиш қиймати						
			қиймати	кв. м	қиймати	кв. м	қиймати	кв. м	қиймати	кв. м	қиймати	кв. м	қиймати	кв. м									қиймати	кв. м				
1	Ишончлиқ	13 060,008	660,113	319,455	20,292	949,702	42,644	240,337	12,996	458,829	21,855	713,573	35,516	379,321	18,382	85,421	5,321	929,499	43,562	463,883	23,668	359,996	14,649	№ 71695 14.11.2022 й.	Ташева асосда	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш ташкилотлари		
1	Ишончлиқ	13 060,008	660,113	319,455	20,292	949,702	42,644	240,337	12,996	458,829	21,855	713,573	35,516	379,321	18,382	85,421	5,321	929,499	43,562	463,883	23,668	359,996	14,649	№ 71695 14.11.2022 й.	Ташева асосда	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш ташкилотлари		
1	"Оби ҳаёт" МФЙ ҳудудига "Ибрат" бўғиси, 1-ўғити бўғиси 1,0 км яқин бўлиши асфальтлаш.	319,455	20,292	319,455	20,292	319,455	20,292	319,455	20,292	319,455	20,292	319,455	20,292	319,455	20,292	319,455	20,292	319,455	20,292	319,455	20,292	319,455	20,292	319,455	20,292	№ 71611 14.11.2022 й.	Ташева асосда	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш ташкилотлари
2	Бўстон МФЙ ҳудудига Тошкент бўғиси 0,4 метр, 2-3-4 ўғити бўғиси бўғиси 0,6 метр, Шоҳмардонов бўғиси 0,1 метр, 5-ўғити бўғиси Шоҳмардонов бўғиси 0,2 км, 1-ўғити бўғиси Шоҳмардонов бўғиси 0,1 км бўлиши жаман 1,4 км қурилиши асфальтлаш.	949,702	42,644	949,702	42,644	949,702	42,644	949,702	42,644	949,702	42,644	949,702	42,644	949,702	42,644	949,702	42,644	949,702	42,644	949,702	42,644	949,702	42,644	949,702	42,644	№ 71619 14.11.2022 й.	Ташева асосда	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш ташкилотлари
3	Марғилон МФЙ ҳудудига 0,5 км яқин Ўз асфальтлаш	240,337	12,996	240,337	12,996	240,337	12,996	240,337	12,996	240,337	12,996	240,337	12,996	240,337	12,996	240,337	12,996	240,337	12,996	240,337	12,996	240,337	12,996	240,337	12,996	№ 71681 14.11.2022 й.	Ташева асосда	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш ташкилотлари
4	Янги Ўз МФЙ Тоғор бўғиси, 0,7 км 7-Тоғор бўғиси 0,130 км асфальтлаш	458,829	21,855	458,829	21,855	458,829	21,855	458,829	21,855	458,829	21,855	458,829	21,855	458,829	21,855	458,829	21,855	458,829	21,855	458,829	21,855	458,829	21,855	458,829	21,855	№ 71633 14.11.2022 й.	Ташева асосда	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш ташкилотлари
5	Олтиоғ МФЙ Янги ариқ бўғиси 1,5 км асфальтлаш	713,573	35,516	713,573	35,516	713,573	35,516	713,573	35,516	713,573	35,516	713,573	35,516	713,573	35,516	713,573	35,516	713,573	35,516	713,573	35,516	713,573	35,516	713,573	35,516	№ 71659 14.11.2022 й.	Ташева асосда	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш ташкилотлари
6	Мажмуот МФЙ М.Рахмонов 1-ўғити бўғиси 0,7 км асфальтлаш	379,321	18,382	379,321	18,382	379,321	18,382	379,321	18,382	379,321	18,382	379,321	18,382	379,321	18,382	379,321	18,382	379,321	18,382	379,321	18,382	379,321	18,382	379,321	18,382	№ 71663 14.11.2022 й.	Ташева асосда	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш ташкилотлари
7	Марғилон МФЙ ҳудудига 0,2 км асфальтлаш	85,421	5,321	85,421	5,321	85,421	5,321	85,421	5,321	85,421	5,321	85,421	5,321	85,421	5,321	85,421	5,321	85,421	5,321	85,421	5,321	85,421	5,321	85,421	5,321	№ 71628 14.11.2022 й.	Ташева асосда	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш ташкилотлари
8	"Махрифт" МФЙ ҳудудига 1,7 км асфальтлаш	929,499	43,562	929,499	43,562	929,499	43,562	929,499	43,562	929,499	43,562	929,499	43,562	929,499	43,562	929,499	43,562	929,499	43,562	929,499	43,562	929,499	43,562	929,499	43,562	№ 71695 14.11.2022 й.	Ташева асосда	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш ташкилотлари
9	Ошанлар МФЙда Янги Тоғ бўғиси 1 км асфальтлаш	463,883	23,668	463,883	23,668	463,883	23,668	463,883	23,668	463,883	23,668	463,883	23,668	463,883	23,668	463,883	23,668	463,883	23,668	463,883	23,668	463,883	23,668	463,883	23,668	№ 71716 14.11.2022 й.	Ташева асосда	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш ташкилотлари
10	Чорсу МФЙ ҳудудига У.Қамолов ва Қулагарлик Қулагарлик қосимчаси асфальтлаш	359,996	14,649	359,996	14,649	359,996	14,649	359,996	14,649	359,996	14,649	359,996	14,649	359,996	14,649	359,996	14,649	359,996	14,649	359,996	14,649	359,996	14,649	359,996	14,649	№ 71744 14.11.2022 й.	Ташева асосда	Ўзбекистон Республикаси Қурилиш ташкилотлари

