

Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш тўғрисида
ШАРТНОМА № 17447

Тошкент ш.

2022 йил “27” 04

Кейинги ўринларда “**Буюртмачи**” деб юритиладиган Тошкент шаҳар ҳокимияти “**YAGONA BUYURTMACHI XIZMATI INJINIRING KOMPANIYA**” давлат унитар корхонаси номидан Устав асосида иш кўрувчи директор в.б. Р.У. Кучкаров бир томондан ва кейинги ўринларда “**Бажарувчи**” деб юритиладиган «**FERGANA KORAL PROEKT**» масъулияти чекланган жамияти номидан Устав ва АЛ-000189 сонли лицензия асосида иш кўрувчи директор **Г.В.Рахимов**, иккинчи томондан, кейинги ўринларда биргаликда “**Тарафлар**” деб юритилади, Танлов комиссиясининг 2022 йил 25 апрелдаги 68852-сонли баённомасига асосан мазкур шартномани, кейинги ўринларда “**шартнома**” деб юритилади, қуйидагилар тўғрисида туздилар:

1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

1.1. Буюртмачи кўрсатма беради ва Бажарувчи **ИЛ Тошкент шаҳар, Мирзо Улуғбек тумани, "Турон" МФЙ худудидаги 493-сонли МТТ биносини мукамал таъмирлаш (АРТ 1-2, топохаритани ҳисобга олган ҳолда)** бъекти учун лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш мажбуриятини олади, шу жумладан:

- **ишчи лойиҳа;**
- **жорий нархлардаги смета ҳисоби;**
- **АРТ 1-2 харажатлари;**
- **Топохарита харажатлари;**

1.2. Бажарувчи ишларни лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш тартиблари белгиланган Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари, шаҳарсозлик нормалари ва қоидалари ва бошқа ҳужжатлар ҳамда мазкур шартнома асосида амалга оширади.

1.3. Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун асос Буюртмачи томонидан Бажарувчи иштирокида тайёрланган ва ўрнатилган тартибда тасдиқланган лойиҳалаштиришга топшириқ ҳамда мазкур шартнома ҳисобланади. Лойиҳалаштиришга топшириқ мазкур шартноманинг ажралмас қисмидир.

1.4. Бажарувчи ишларни Буюртмачи томонидан бошланғич маълумотлар тақдим этилиб, шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказиб, аванс тўловини амалга оширган кундан бошлаб, мазкур шартноманинг 2-иловасида келтирилган календар иш жадвалидаги муддатда бажаради.

1.5. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини якунига етказгандан сўнг 3 (уч) нусхада мазкур лойиҳа ва қидирув ишлари ҳужжатларини Буюртмачига тақдим этиши керак.

2. ШАРТНОМА БАҲОСИ ВА ТЎЛОВ ШАРТЛАРИ

2.1. Шартноманинг баҳоси мазкур шартноманинг 1 ва 3-иловасида келтирилган келишув баённомаси ва лойиҳа тадқиқот ишлари учун смета ҳисобига асосан (**ҚҚС билан**) **142 500 000 (бир юз қирк икки миллион беш юз минг)** сўмни ташкил этади.

2.2. Буюртмачи шартномани Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказгандан сўнг 5 (беш) иш куни ичида шартнома баҳосининг 30 фоиз миқдорида аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Шартнома бўйича қолган маблағ аванс маблағлари мутаносиб равишда ушлаб қолинган ҳолда ишларнинг натижалари тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланадиган ва муҳрлари билан тасдиқланадиган топшириш-қабул қилиш далолатномаси ҳамда ҳисоб-фактура расмийлаштирилиб, манзилли рўйхат асосида маблағлар ажратилгандан кейин ўрнатилган тартибда тўланади.

2.4. Бажарувчи томонидан бажарилган ва Буюртмачи томонидан қабул қилинган ишлар учун якуний ҳисоб-китоб Ўзбекистон Республикасининг солиқ қонунчилигини бузилишига йўл қўймайдиган муддатларда ва тартибда амалга оширилади.

3. ТАРАФЛАРНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

3.1. Бажарувчи қуйидагиларга мажбур:

3.1.1. Лойиҳалаш ҳақидаги топшириққа ва бошқа бошланғич маълумотларга мувофиқ ишларни бажариш ва натижасини шартноманинг 2-иловасида белгиланган муддатда Буюртмачига топшириш;

3.1.2. Тайёр бўлган лойиҳа-смета ҳужжатларини Буюртмачи билан ҳамда тегишли давлат органлари ва идоралари, фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари билан келишиб олиш ёки хулоса олиш;

3.1.3. Буюртмачи, тегишли давлат органлари ва идоралари, фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органларининг лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича асосланган эътирозларини инобатга олиб лойиҳа-смета ҳужжатларига тузатишлар киритиш;

3.1.4. Ишларнинг натижаларини Буюртмачига 3 (уч) нусхада ва электрон (pdf) кўринишда топшириш;

3.1.5. Буюртмачининг розилигисиз лойиҳа-смета ҳужжатларини учинчи шахсларга бермаслик;

3.1.6. Тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида учинчи шахсларда ишларни бажаришга қаршилик қилиш ёки бажаришни чеклаш ҳуқуқи йўқлигини қафолатлаш.

3.2. Буюртмачи қуйидагиларга мажбур:

3.2.1. Шартномада белгиланган миқдорда ва тартибда шартномани 1.1. бандида назарда тутилган ишларни қабул қилиб олиш ва ишларни бажарганлик учун Бажарувчига ҳақ тўлаш;

3.2.2. Бажарувчидан олинган лойиҳа-смета ҳужжатларидан фақат мазкур шартномада назарда тутилган мақсадлар учун фойдаланиш, лойиҳа-смета ҳужжатларини Бажарувчининг розилигисиз учинчи шахсларга бермаслик ва улардаги маълумотларни ошкор қилмаслик;

3.2.3. Тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатларининг камчиликлари борлиги муносабати билан учинчи шахс томонидан Буюртмачига нисбатан кўзғатилган даъво юзасидан ишга қатнашишга Бажарувчини жалб қилиш.

3.3. Буюртмачи ишларни амалга ошириш учун зарур бўлган бошланғич маълумотлар (нуқсонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар) тақдим қилиши шарт.

3.4. Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотлар (нуқсонлар далолатномаси, ижро схемаси ва бошқалар)ни 5 (беш) иш куни мобойнида ўрганиб чиқиши ҳамда берилган маълумотларда камчиликлар аниқланса Буюртмачига маълум қилишни ўз зиммасига олади.

Агар Бажарувчи Буюртмачи томонидан тақдим этилган бошланғич маълумотларда аниқланган камчиликларни, 5 (беш) иш куни ичида Буюртмачига маълум қилмаса, маълумотлар қабул қилинган деб ҳисобланади ва бундай ҳолат Бажарувчи ишларини бажариш муддатини ўзгартиришга асос бўла олмайди.

3.5. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатлари камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиҳа смета ҳужжатлари ва бажарилган қидирув ишлари маълумотлари асосида барпо этилган объектни ишлатиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгар бўлади. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларида камчиликлар аниқланса, Бажарувчи Буюртмачининг биринчи талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиш ва шунга мувофиқ зарур қўшимча қидирув ишларини бажариши шарт.

4. ИШЛАРНИ ТОПШИРИШ ВА ҚАБУЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

4.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлари бажарилишининг алоҳида босқичи ва шартнома бўйича белгиланган жами ишлар тугагандан сўнг Бажарувчи Буюртмачига ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси асосида топширади.

4.2. Буюртмачи ишларни топшириш - қабул қилиш далолатномаси ва иш натижаларини олгандан сўнг 10 (ўн) кун ичида ишларни қабул қилиш ва Бажарувчига имзоланган топшириш

ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборади.

Агар Буюртмачи ишларни қабул қилган кундан бошлаб 10 (ўн) кун муддат ичида Бажарувчига камчиликлар кўрсатилган ишларни қабул қилмаслик рад жавобини юбормаса, ишлар қабул қилинган ҳисобланади ва бундай ҳолатда Буюртмачи ишларни топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолаб, бир нусхасини Бажарувчига қайтариши шарт.

Лойиҳа-смета ҳужжатларининг мураккаблик даражасига қараб ишларни кўриб чиқиш муддатини 30 (ўттиз) кунгача узайтириш тўғрисида Бажарувчини огоҳлатиради.

4.3. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.4. Агар лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларини бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, тарафлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун мобайнида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт.

4.5. Лозим топилган ҳолларда тарафлар мустақил экспертларга лойиҳа-смета ҳужжатлари бўйича хулоса учун мурожаат қилиши мумкин.

4.6. Лойиҳа-смета ҳужжатларида шартномадан четланишлар ёки бошқа камчиликлар борлиги аниқланса, бундай камчиликларни смета ҳужжатларини қабул қилаётганда аниқлаш имконияти бўлмаса (яширин камчиликлар), бундай ҳолатда Буюртмачи камчиликлар аниқлангандан кейин Ижрочини 10 кун муддат ичида ёзма равишда огоҳлантириш ва камчиликларни қисқа муддатда бартараф этилишини талаб қилиши керак.

5. КОНФИДЕНЦИАЛ МАЪЛУМОТЛАРНИ ҲИМОЯЛАШ

5.1. Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишларининг бажарилиши даврида Бажарувчи ўзи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошкор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. ТАРАФЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

6.1. Бажарувчи лойиҳа-смета ҳужжатларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатлари маълумотлари асосида барпо этилган объектдан фойдаланиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгардир.

6.2. Лойиҳа-смета ҳужжатларида камчиликлар аниқланган тақдирда Бажарувчи Буюртмачининг талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиши ва бунинг оқибатида келтирилган зарарни тўлаши шарт.

6.3. Буюртмачи шартнома бўйича ҳақ тўланмаганлик (ўз вақтида тўланмаганлик) учун Бажарувчига тўлов муддати кечиктирилган ҳар бир кун учун ўз вақтидан тўланмаган сумманинг 0,4 фоиз миқдорида, бироқ шартнома суммасининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.4. Бажарувчи ишларни ўз вақтида бажармаганлиги учун Буюртмачига кечиктирилган ҳар бир кун учун бажарилмаган ишлар қийматининг 0,5 фоиз миқдорида, бироқ шартнома суммасининг 50 фоизидан юқори бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

6.5. Пенянинг тўланганлиги ва зарарнинг қопланганлиги тарафларни ўз мажбуриятларини бажариш ёки камчиликларни бартараф этишдан озод этмайди.

6.6. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлиги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

7. ФОРС-МАЖОР ВА НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

7.1. Тарафлар ихтиёрига боғлиқ бўлмаган, уларни олдиндан билиш ёки олдини олиш имконияти бўлмаган ҳолатлар (енгиб бўлмас куч) оқибатида мажбуриятларни бажармаганлик

ёки лозим даражада бажармаганлик учун тарафлардан бирортаси иккинчи тараф олдида жавобгар эмасдир.

7.2. Мазкур шартнома бўйича ёки у билан боғлиқ ҳолда тарафлар ўртасида келиб чиқадиган барча низолар ва зиддиятлар музокаралар олиб бориш йўли билан ҳал этилади.

7.3. Музокаралар олиб бориш йўли билан зиддиятларни ҳал қилишга эришилмаган тақдирда, мазкур шартноманинг тузилиши, унинг шартларининг ўзгариши, бузилиши, ижро этилиши, бекор бўлиши, тугатилиши ва ҳақиқийлиги юзасидан келиб чиқувчи барча низолар, келишмовчиликлар ва талаблар даъвогарнинг танлови бўйича Тошкент туманлараро иқтисодий судида ёки Ўзбекистон Республикаси Савдо-саноат палатаси ҳузуридаги Ҳакамлик судида унинг Регламентига асосан ҳакамлик судьяси томонидан яқка тартибда кўриб чиқилади.

8. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ ВА БЕКОР ҚИЛИШ ТАРТИБИ

8.1. Мазкур шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва қўшичалар улар ёзма равишда расмийлаштирилиб, тарафларнинг ваколатли шахслари томонидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтган тақдирда ҳақиқий ҳисобланади.

8.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилишга тарафларнинг келишувига мувофиқ ёки Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатларида назарда тутилган асосларга кўра, етказилган зарар қопланган ҳолда йўл қўйилади.

8.3. Буюртмачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Бажарувчининг айби билан ишларнинг бориши ушланиб қолса ва ишларни тугатишнинг шартномада белгиланган муддатидан 30 кун ошиқ муддатга кечиктирилса;
- Бажарувчининг шартнома шартларини бузиши оқибатида берилган топшириқда назарда тутилган ишлар сифати пасайса.

8.4. Бажарувчи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

- Бажарувчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра лойиҳа ишлари Буюртмачи томонидан 30 кундан ошиқ муддатга тўхтатилса;
- Буюртмачи лойиҳалаш ишларининг ҳақини тўлаш имкониятига эга бўлмаса ёки тўловларни сабабсиз асосларга кўра кечиктирса.

8.5. Шартномани бекор қилиш ҳақида қарорга келган тараф иккинчи тарафга 10 кун олдин ёзма билдиришнома юбориши шарт.

9. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ҚЎШИМЧА ШАРТЛАР

9.1. Тарафлар шартнома тузишда, шартноманинг амал қилиш муддатида ва ушбу муддат тугаганидан сўнг, шартнома билан боғлиқ коррупциявий ҳаракатларни содир қилмасликка келишиб оладилар.

9.2. Тарафлар шартномадаги коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган коррупциянинг олдини олиш чораларини тан олади ва уларга риоя этилиши бўйича ҳамкорликни таъминлайдилар.

9.3. Ҳар бир тараф шартнома тузилган пайтида бевосита ўзи ёки унинг ижроия органлари, мансабдор шахслари ва ходимлари томонидан шартнома билан боғлиқ ҳолда қонунга хилоф равишда пул, моддий қимматликлар берилмаганлигини, тақлиф этилмаганлигини, уларни беришга ваъда қилинмаганлигини, шунингдек моддий ёки ҳар қандай турдаги имтиёз, устунликлар олинмаганлигини (келажакда бу турдаги ҳаракатларни амалга ошириши ёки қилиши мумкинлиги ҳақида таассурот қолдирилмаганлигини) кафолатлайди. Тарафлар, улар томонидан шартнома доирасида жалб қилинган шахсларнинг ушбу ҳаракатларни содир этмаслиги юзасидан оқилона чоралар кўради.

9.4. Тарафлар уларнинг назорати остида бўлган ва улар номидан ҳаракат қиладиган шахслар томонидан коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган мажбуриятлар бузилганлиги фактлари ҳақида хабар берилганлиги учун уларга тазйиқ ўтказмаслигини ва бошқа салбий оқибатлар келтирмаслигини кафолатлайдилар.

9.5. Агар бир тарафга бошқа тарафнинг коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган мажбуриятларни бузилишига йўл қўйганлиги маълум бўлиб қолса, иккинчи тарафни бу ҳақда зудлик билан хабардор қилиши ва ушбу тарафдан оқилона муддат ичида тегишли чоралар кўрилишини ва амалга оширилган ишлар юзасидан унга хабардор қилишини

талаб қилиши шарт. Тарафнинг талаби бўйича иккинчи тараф томонидан қоидабузарликларни бартараф қилиш бўйича оқилона муддат ичида тегишли чоралар кўрилмаганда, ушбу тараф шартномани бир тарафлама тўхтатиб туришга, бекор қилишга ҳамда зарарни тўлик қоплаб беришни талаб қилишга ҳақли.

10. ЯКУНЛОВЧИ ҚОИДАЛАР

10.1. Иш натижаларидан нормал фойдаланиш имкониятини бермайдиган камчиликлар аниқланса ва уларни бартараф этмасдан туриб натижалардан фойдаланиб бўлмаса, камчиликларни бартараф этиш Бажаруви томонидан ва унинг ҳисобдан амалга оширилади.

10.2. Камчиликларнинг мавжудлиги ва уларни бартараф этиш муддатлари Буюртмачи ва Бажарувиининг қўшма далолатномасида қайд этилади.

10.3. Мазкур шартнома икки нусхада тузилган бўлиб, иккала нусха ҳам бир хил юридик кучга эга ва тарафларга бир нусхадан берилади.

10.4. Мазкур шартнома билан назарда тутилмаган барча масалалар Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари билан тартибга солинади.

10.5. Ушбу шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигида рўйхатдан ўтказилгандан сўнг кучга киради ва 2022 йил 31 декабрга қадар амал қилади.

Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

1-илова - Шартнома баҳосининг келишуви баённомаси;

2-илова – Календар иш жадвали;

3-илова - Лойиҳа тадқиқот ишлари учун смета ҳисобига.

11. ТАРАФЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

БУЮРТМАЧИ

Тошкент шаҳар ҳокимияти “YAGONA BUYURTMACHI XIZMATI INJINIRING KOMPANIYA” ДУК

Юридик манзили: *ИБ п. Тошкент*
100027, Тошкент ш., И.Каримов кўчаси,
16а-уй.

302021860262 777081100251015



Директор *в.б.*

Р.У. Кучкаров

БАЖАРУВЧИ

МЧЖ «FERGANA KORAL PROEKT»

Манзил: Тошкент ш, Шайхонтахур тумани,
Зулфияхоним кучаси 246 уй
р/с: 2020 8000 9003 5519 2001
в ЧАКБ «Универсалбанк» Фергана филиали,
МФО 01131, ИНН 302979496,
ОКЭД 71110



Директор

Г.В.Рахимов

юрисст

Фазан

AS



“Тасдиқлайман”

Тошкент шаҳар ҳокимияти

“ЯБХ” ИК директори в.б.

Комиссия раиси

Р.У. Кучкаров

Тошкент шаҳар

«27» 04 2022й.

“Тошкент шаҳар, Мирзо Улуғбек тумани, “Турон” МФЙ ҳудудидаги 493-сонли МТТ биносини мукамал таъмирлаш (АРТ 1-2, топохаритани ҳисобга олган ҳолда).”

объектининг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун лойиҳа ташкилотини аниқлаш бўйича Тошкент шаҳар ҳокимияти “ЯБХ” ИК танлов комиссияси

йиғилишининг

БАЁНИ

Комиссия аъзолари:

С. Сағдиев

-Бош муҳандис в.б.

Ш. Қодиров.

-БРБЛ ва ТХРОТ бўлим бошлиғи

Хамидов О.

-ЛБ ва ҚТНҚ бўлим бошлиғи

Турсунов З.

-Тошкент шаҳар ҳокимининг ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш ва саноатда кооперация алоқаларини кенгайтириш бўйича масалалари ёрдамчиси (*Ўзб. Рес. Президентининг ПҚ-4938 30.12.2020й, 15-а банди асосида бир шартнома бўйича БҲМ 2 500 бараваридан ортиқ бўлса иштирок этади*)

Абдусатторов П.

-БРБЛ ва ТХРОТ бош мутахассиси

Абдунабиев А.

-БРБЛ ва ТХРОТ бош мутахассиси

КУН ТАРТИБИ

“Тошкент шаҳар, Мирзо Улуғбек тумани, “Турон” МФЙ ҳудудидаги 493-сонли МТТ биносини мукамал таъмирлаш (АРТ 1-2, топохаритани ҳисобга олган ҳолда).” объекти бўйича(кейинги ўринларда объект деб аталади).

(Р. Кучкаров, С. Сағдиев, Ш. Қодиров, О.Хамидов, З. Турсунов, П. Абдусатторов, А. Абдунабиев)

Компания томонидан 2022 йил 12 апрел куни Ўзбекистон Республикаси товар хом-ашё биржасининг электрон порталига (etender.uzex.uz) объектнинг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш учун лойиҳа ташкилотини танлаш мақсадида № 68852 лот рақамли эълон жойлаштирилди. Мазкур эълон бўйича беш иш куни мобайнида электрон портал орқали танлов иштирокчилари томонидан электрон тарзда тақдим қилган таклифлар қабул қилинди. Таклифлар комиссия аъзолари томонидан кўриб чиқилди ва қўйилган талабларга асосан баҳоланди. Натижаларга асосан танловда “FERGANA KORAL ПРОЕКТ” хусусий корхонаси ғолиб бўлганини инобатга олиб:


ҚАРОР ҚИЛИНДИ:


1. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли Қонунининг 62-моддаси 3-бандига асосан комиссия баённомаси давлат харидлари электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Икки иш куни давомида давлат харидлари электрон тизимига жойлаштирилган баённома бўйича ҳеч қандай эътирозлар ёки қўшимча таклифлар келиб тушмаганлиги маълумот учун қабул қилинсин.


2. БРБЛ ва ТХРОТ бўлими бош мутахассиси Х.Юсупов.


Юқоридагилардан келиб чиқиб комиссия аъзоларининг 2022 йил 25 апрелдаги электрон баённомасига асосан “Тошкент шаҳар, Мирзо Улугбек тумани, “Турон” МФЙ ҳудудидаги 493-сонли МТТ биносини мукаммал таъмирлаш (АРТ 1-2, топохаритани ҳисобга олган ҳолда).” объектининг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича “FERGANA KORAL ПРОЕКТ” хусусий корхонаси билан қонунчиликда ўрнатилган тартибда шартнома тузилсин.


Комиссия аъзолари.


_____ С. Сағдиев


_____ Ш. Қодиров



_____ О. Хамидов


_____ П. Абдусатторов


_____ А. Абдунабиев



"ТАСЛИКЛАЙМАН"
Тошкент шаҳар ҳокимлиги
биринчи ўринбасари



"Келишди"
Тошкент шаҳар Иқтисодий тарқиқоти ва камбағалликни
қисқартириш бош бошқармаси

Ш.Шукуров
2022 й.

Тошкент шаҳар ҳокимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" ИКнинг

2022 йилги МАНВИЛЛИ ҒУЙҲАТИ

№	Объектлар номи ва манзили	Қўрилган ёки босқичи	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида)	01.01.22 й. ҳолатига йилда ўтучи объектнинг молявалари ш қолдир қилинган бўлган бўлиши.	01.01.22 й. ҳолатига йилда ўтучи объектнинг молявалари ш қолдир қилинган бўлиши.	01.01.22 й. ҳолатига йилда ўтучи объектнинг молявалари ш қолдир қилинган бўлиши.	2022 йилда фойдаланишга топширилган						Ташкилот номи						
							Жами капитал қўйишлар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жилой	Буюртмачи бошқа харолатлари	Жами	Қўрилган дар		Асосий фонд суммаси	01.01.22 й. ҳолатига йилда ўтучи объектнинг молявалари ш қолдир қилинган бўлиши.	01.01.22 й. ҳолатига йилда ўтучи объектнинг молявалари ш қолдир қилинган бўлиши.	01.01.22 й. ҳолатига йилда ўтучи объектнинг молявалари ш қолдир қилинган бўлиши.		
1	Объектлар номи ва манзили	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
43	Жами капитал қўйишлар, жумладан							8 926,093											
1	Тошкент шаҳар, Бектемир тумани, "Йил ота" МФЙ қўздаси янги мақтаб биносини қуриш	2022й	Объект					1 201,276					Объект						Тошкент
2	Тошкент шаҳар, Мирзо Улукбек тумани, "Турон" МФЙ қўздасидаги 419-сонли МТТ биносини жорий таъмирлаш	2022й	Объект					51,000					Объект						Тошкент
3	Тошкент шаҳар, Мирзо Улукбек тумани, "Турон" МФЙ қўздасидаги 493-сонли МТТ биносини муқомал таъмирлаш	2022й	Объект					198,650					Объект						Тошкент
4	Тошкент шаҳар, Мирзо Улукбек тумани, "Турон" МФЙ қўздасидаги 597-сонли МТТ биносини муқомал таъмирлаш	2022й	Объект					184,275					Объект						Тошкент
5	Тошкент шаҳар, Мирзо Улукбек тумани, "Турон" МФЙ қўздасидаги 719-сонли мақтаб биносини муқомал таъмирлаш	2022й	Объект					312,000					Объект						Тошкент
6	Тошкент шаҳар, Мирзо Улукбек тумани, "Ботмидагон" МФЙ қўздасидаги 325-сонли МТТ биносини муқомал таъмирлаш	2022й	Объект					73,850					Объект						Тошкент

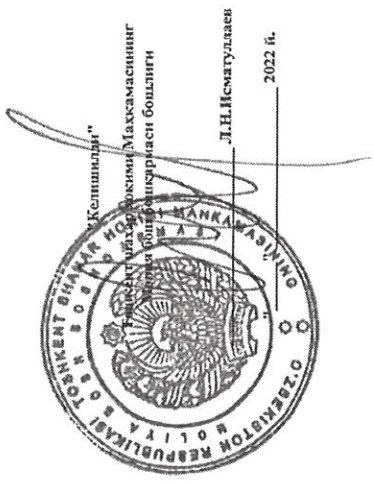
№/р	Объектлар номи ва мазмун	Қўрилуш бошланғич фазадаги топшириш йили	Локация қилини	Объектнинг устуви қўйилган (шарҳнома берилган) жумладан, баротхона, бинолар, боғица, харақатлар	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг (айта қилин) қиймати	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати	2022 йил учун капитал қўйимлар дини						2022 йилда фойдаланишга топширилган		Экспертиза ҳужжатлари рамаки ва санаси	Тендер (тақсидлар) рамаки ва санаси	Ташкилот номи				
								Жили капитал қўйимлар	Кўрилуш - монтаж ишлари	шу жумладан		Қўйилган дат	Асосий фонд суммаси	10	11				12	13	14	15
										Жили	Бюджетнинг бошқа харақатлари											
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20											
7	Тошкент шаҳар, Мирзо Улуғбек тумани, "Богичиқов" МФЙ ҳудудидagi 267-сонли МТТ биносини мукамал таъмирлаш	2022й	Объект								152.175							Тендер	Тошкент шаҳар, Мирзо Улуғбек тумани, "Богичиқов" МФЙ ҳудудидagi 267-сонли МТТ биносини мукамал таъмирлаш			
8	Тошкент шаҳар, Миробод тумани, "Балокатий" МФЙ ҳудудидagi 64-сонли МТТ биносини мукамал таъмирлаш	2022й	Объект								88.504							Тендер	Тошкент шаҳар, Миробод тумани, "Балокатий" МФЙ ҳудудидagi 64-сонли МТТ биносини мукамал таъмирлаш			
9	Тошкент шаҳар, Миробод тумани, "Балокатий" МФЙ ҳудудидagi 175-сонли мактаб биносини мукамал таъмирлаш	2022й	Объект								268.000							Тендер	Тошкент шаҳар, Миробод тумани, "Балокатий" МФЙ ҳудудидagi 175-сонли мактаб биносини мукамал таъмирлаш			
10	Тошкент шаҳар, Миробод тумани, "Янги Қўйлик" МФЙ ҳудудидagi 183-сонли МТТ биносини мукамал таъмирлаш	2022й	Объект								212.500							Тендер	Тошкент шаҳар, Миробод тумани, "Янги Қўйлик" МФЙ ҳудудидagi 183-сонли МТТ биносини мукамал таъмирлаш			
11	Тошкент шаҳар, Миробод тумани, "Янги Қўйлик" МФЙ ҳудудидagi 126-сонли МТТ биносини мукамал таъмирлаш	2022й	Объект								212.500							Тендер	Тошкент шаҳар, Миробод тумани, "Янги Қўйлик" МФЙ ҳудудидagi 126-сонли МТТ биносини мукамал таъмирлаш			
12	Тошкент шаҳар, Миробод тумани, "Янги Қўйлик" МФЙ ҳудудидagi 125-сонли мактаб биносини мукамал таъмирлаш	2022й	Объект								388.000							Тендер	Тошкент шаҳар, Миробод тумани, "Янги Қўйлик" МФЙ ҳудудидagi 125-сонли мактаб биносини мукамал таъмирлаш			
13	Тошкент шаҳар, Миробод тумани, "Янги Қўйлик" МФЙ ҳудудидagi 1-сонли болалар ва ўсмирлар спорт мактаби биносини мукамал таъмирлаш	2022й	Объект								239.008							Тендер	Тошкент шаҳар, Миробод тумани, "Янги Қўйлик" МФЙ ҳудудидagi 1-сонли болалар ва ўсмирлар спорт мактаби биносини мукамал таъмирлаш			
14	Тошкент шаҳар, Олмаоқер тумани, "Шон-Шухрат" МФЙ ҳудудидagi 299-сонли МТТ биносини реконструкция қилиш	2022й	Объект								230.008							Тендер	Тошкент шаҳар, Олмаоқер тумани, "Шон-Шухрат" МФЙ ҳудудидagi 299-сонли МТТ биносини реконструкция қилиш			
15	Тошкент шаҳар, Олмаоқер тумани, "Шон-Шухрат" МФЙ ҳудудидagi 15-сонли мактаб биносини реконструкция қилиш	2022й	Объект								199.000							Тендер	Тошкент шаҳар, Олмаоқер тумани, "Шон-Шухрат" МФЙ ҳудудидagi 15-сонли мактаб биносини реконструкция қилиш			

№	Куршил бошланиш ва фойдаланиш топириш йили	Должт кувати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосда)	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг умумий қиймати	01.01.22 й. ҳолатига иккунда йилда утувчи объектнинг молялаштири билан қолдиқ қиймати	2022 йилда фойдаланишга топширилган					01.01.23 й. ҳолатига иккунда йилда утувчи объектнинг молялаштири билан қолдиқ қиймати	01.01.23 й. ҳолатига иккунда йилда утувчи объектнинг молялаштири билан қолдиқ қиймати	Экспертисо муассаси раъмин ва санис	Тендер (тендерлар) белгиланган бундан бевисола раъмин ва санис	Ташкилот номи			
							Жами капитал қўйилмалар	Куршил - монтаж ишлари	Жикос	шумулдан	Кўнрагку дат						Ассети фонд суммаси		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
16	Тошкент шаҳар, Олмазор тумани, "Чустай" МФЙ худудидagi 278-сонли умумтаълим мактаб биносини муъамал таъмирлаш	Объект						466,000			466,000		Объект						Тендер
17	Тошкент шаҳар, Олмазор тумани, Чустай МФЙда жойлашган 168-сонли ДМТТ ни реконструкция қилиш	Объект					212,500				212,500		Объект						Тендер
18	Тошкент шаҳар, Сергели тумани, "Ногайбўриқ" МФЙ худудидagi 276-сонли мактаб биносини жорий таъмирлаш	Объект					52,710				52,710		Объект						Тендер
19	Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, "Қушча Чопок оти" МФЙ худудидagi 252-сонли МТТ биносини реконструкция қилиш	Объект					200,000				200,000		Объект						Тендер
20	Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, "Тинчлиқобод" МФЙ худудидagi 386-сонли МТТ биносини реконструкция қилиш	Объект					137,014				137,014		Объект						Тендер
21	Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, "Тинчлиқобод" МФЙ худудидagi 386-сонли МТТ биносини муъамал таъмирлаш	Объект					141,512				141,512		Объект						Тендер
22	Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, "Тинчлиқобод" МФЙ худудидagi 44-сонли мактаб биносини реконструкция қилиш	Объект					549,878				549,878		Объект						Тендер
23	Тошкент шаҳар, Чиланзор тумани, "Қалоргол" МФЙ худудидagi 7-сонли ДМТТ биносини реконструкция қилиш	Объект					110,750				110,750		Объект						Тендер
24	Тошкент шаҳар, Чиланзор тумани, "Қалоргол" МФЙ худудидagi 289-сонли ДМТТ биносини муъамал таъмирлаш	Объект					43,750				43,750		Объект						Тендер

№	Объектлар номи ва мақсади	Қурилиш бошланиши ва фахшнинг ташқириш йили	Лоика қурилиш	Объектнинг умумий қиймати (шартнома босқичи, жумладан, буюртмалар, бонус, қўшимчалар, қўшимчалар)	01.01.22 й. ҳолатига йилда йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмалар, бонус, қўшимчалар	01.01.22 й. ҳолатига йилда йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмалар, бонус, қўшимчалар	01.01.23 й. ҳолатига йилда йилга ўтувчи объектнинг қиймати (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмалар, бонус, қўшимчалар	2022 йилда фойдаланишга топширилган					18	19	20		
								9	10		11	12				13	14
		Жами капитал қўйимлар		Куршил - моттақ ишлари	ш. жумладан		Қурилув - моттақ ишлари		Бюджетнинг бошқа харажатлари		Жами	қўшимчалар, савал харажатлари	Асосий фонд суммаси				
25	Тошкент шаҳри, Чиланзор тумани, "Қаторғол" МФЙ қўшма мажбуриятли 184-сонли мактаб биносини қуриш	2022й	Объект					100,200			100,200		Объект		Тошкент шаҳри (ташқириш) бўлини бошқариш раъми ва савал	Тошкент шаҳри (ташқириш) бўлини бошқариш раъми ва савал	Тошкент шаҳри (ташқириш) бўлини бошқариш раъми ва савал
26	Тошкент шаҳри, Чиланзор тумани, "Дўнборобод" МФЙ қўшма мажбуриятли 167-сонли ДМТТ биносини жорий таъмирлаш	2022й	Объект					51,000			51,000		Объект		Экспертга ҳужжатларни таъминлаш ва савал	Экспертга ҳужжатларни таъминлаш ва савал	Экспертга ҳужжатларни таъминлаш ва савал
27	Тошкент шаҳри, Чиланзор тумани, "Дўнборобод" МФЙ қўшма мажбуриятли 232-сонли мактаб биносини қуриш	2022й	Объект					49,710			49,710		Объект				Тошкент шаҳри
28	Тошкент шаҳри, Чиланзор тумани, "Дўнборобод" МФЙ қўшма мажбуриятли 232-сонли мактаб биносини қуриш ва интернатни реконструкция қилиш	2022й	Объект					121,400			121,400		Объект				Тошкент шаҳри
29	Тошкент шаҳри, Шайхонтоқур тумани, "Ўрал" МФЙ қўшма мажбуриятли 37-сонли буюртма мактаб биносини қуриш	2022й	Объект					163,777			163,777		Объект				Тошкент шаҳри
30	Тошкент шаҳри, Шайхонтоқур тумани, "Ўрал" МФЙ қўшма мажбуриятли 327-сонли МТТ биносини қуриш	2022й	Объект					95,380			95,380		Объект				Тошкент шаҳри
31	Тошкент шаҳри, Юкдороб тумани, "Халқабоб" МФЙ қўшма мажбуриятли 532-сонли МТТ биносини реконструкция қилиш	2022й	Объект					195,514			195,514		Объект				Тошкент шаҳри
32	Тошкент шаҳри, Янқасарой тумани, "Ғафоб" МФЙ қўшма мажбуриятли 1604-сонли мактаб биносини қуриш	2022й	Объект					56,500			56,500		Объект				Тошкент шаҳри
33	Тошкент шаҳри, Янқасарой тумани, "Ғафоб" МФЙ қўшма мажбуриятли 107-сонли МТТ биносини реконструкция қилиш	2022й	Объект					69,850			69,850		Объект				Тошкент шаҳри

№	Қуралыш босланғиш на фондларын қўладани шга тошириши йил	4	5	6	7	8	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити						2022 йилда бойдаланишга тоширилмаган		17	18	19	20	
							9	10	11	12	13	14	15						
			Объект	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосда) жумладан, бериладиган бонуслар, харажатлар	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, бериладиган бонуслар, харажатлар	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (айта қолдиқ қиймати) жумладан, бериладиган бонуслар, харажатлар	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (айта қолдиқ қиймати) жумладан, бериладиган бонуслар, харажатлар	Жами капитал қўйилмалар	Қуралыш - монтаж ишлари	Жалоз	Бюджетлиги бошқа харажатлари	Жами	жумладан, сақлаш харажатлари	Қувайт/му-дат	Асосий фонд	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (айта қолдиқ қиймати) жумладан, бериладиган бонуслар, харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (айта қолдиқ қиймати) жумладан, бериладиган бонуслар, харажатлари	Тендер (таъсир)лар натижасига бўйича билинома риважи ва санди	Ташкилот номи
1		2																	
34	Тошкент шаҳар, Яқкасарой тумани, "Рақатбоши" МФЙ ҳўзўндаги 18-сонли болалар муҳоне ва сайят мактаби бизнесини жўрий таъмирлаш	2022й	Объект					19,500						Объект					Тошкент
35	Тошкент шаҳар, Яқкасарой тумани, "Ҳамид Сулаймонов" МФЙ ҳўзўндаги 25-сонли махус мактаб бизнесини муамал таъмирлаш	2022й	Объект					148,000						Объект					Тошкент
36	Тошкент шаҳар, Яқкасарой тумани, "Ҳамид Сулаймонов" МФЙ ҳўзўндаги 118-сонли мактаб бизнесини муамал таъмирлаш	2022й	Объект					300,000						Объект					Тошкент
37	Тошкент шаҳар, Яқкасарой тумани, "Ҳамид Сулаймонов" МФЙ ҳўзўндаги 1-сонли болалар ва ўсмирлар спорт мактабига қаршли "Қалларгош", сўзлашсини муамал таъмирлаш	2022й	Объект					74,000						Объект					Тошкент
38	Тошкент шаҳар, Яқкасарой тумани, "Ҳамид Сулаймонов" МФЙ ҳўзўндаги 168-сонли интерактивлиридан Давлат умумтаълим мактаби бизнесини муамал таъмирлаш	2022й	Объект					320,000						Объект					Тошкент
39	Тошкент шаҳар, Яқкасарой тумани, "Рақатбоши" МФЙ ҳўзўндаги 57-сонли оқлашии поликлиника бизнесини жўрий таъмирлаш	2022й	Объект					76,000						Объект					Тошкент
40	Тошкент шаҳар, Яқкасарой тумани, "Рақатбоши" МФЙ ҳўзўндаги санитария-эпидемиология бошиштилик ва жамоат саломатлигини қиғамати Яқкасарой тумани бўлиминини муамал таъмирлаш	2022й	Объект					388,000						Объект					Тошкент
41	Тошкент шаҳар, Яқкасарой тумани, "Жарбўши" МФЙ ҳўзўндаги яғни оқлашии поликлиника бизнесини қўриш	2022й	Объект					117,500						Объект					Тошкент
42	Тошкент шаҳар, Яқкасарой тумани, "Ибрат" МФЙ ҳўзўндаги 26-сонли мактабнинг яғни бизнесини қўриш	2022й	Объект					509,259						Объект					Тошкент

1	2	3	4	5	6	7	8	2022 йил учун капитал қўйилmalar даражаси				2022 йилда фойдаланилган тошми қилинган		16	17	18	19	20	
								Жами капитал қўйилmalar	Қурилиш - монтаж ишлари	Жилой	Иш жўрналари	Буюртмачи бошқа харajatлари	Жилин						Жумладан, сўраш харajatлари
01.01.22 й. ҳолатига	01.01.22 й. ҳолатига	01.01.22 й. ҳолатига	01.01.22 й. ҳолатига	01.01.22 й. ҳолатига	01.01.22 й. ҳолатига	01.01.22 й. ҳолатига	01.01.22 й. ҳолатига	01.01.23 й. ҳолатига	01.01.23 й. ҳолатига	01.01.23 й. ҳолатига	01.01.23 й. ҳолатига	01.01.23 й. ҳолатига	01.01.23 й. ҳолатига	01.01.23 й. ҳолатига	01.01.23 й. ҳолатига	01.01.23 й. ҳолатига	01.01.23 й. ҳолатига	01.01.23 й. ҳолатига	01.01.23 й. ҳолатига
43	Тошкент шаҳар, Янгибод тумани, "Жарбон" МФЙ Қудуқча 120 Урсини МТТнинг агли бизнеси қўриши	2022й	Объект						145,647				Объект						Тошкент



"Қарғин"
 Тошкент шаҳар, Янгибод тумани, "Жарбон" МФЙ
 Қудуқча 120 Урсини МТТнинг агли бизнеси қўриши
 2022 й.

Handwritten signature
