

3751 РП-сонли ШАРТНОМА
(Лойиҳавий таъминлаш)

Тошкент ш.

“13” апрель 2022 йил

Бундан буён Буюртмачи деб юритиладиган “Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллариини қуриш ва реконструкция қилиш дирекцияси” ДУК номидан директор Д.Юсунов ва кейинги ўринларда Пудратчи деб юритиладиган “Boshtransloyiha” АЖ номидан Устав асосида иш юритувчи бош директор Р.В.Рузиев Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сонли қарори, тасдиқланган лойиҳа-қидирув ишлари манзилли рўйхати ва Тендер комиссияси йиғилишининг №54632-лот бўйича 2022 йил 9 апрелдаги харид комиссияси баёнига асосан қуйидаги шартномани туздилар:

1. Шартнома предмети

1.1. Пудратчи Буюртмачининг топшириги бўйича белгиланган муддатда Жиззах шаҳридаги 4К-253а “Ислом Каримов шоҳ кўчасига” шаҳобча автомобиль йўлидан М39 “Тошкент-Термиз” автомобиль йўлига” уланувчи янги йўналишдаги умумий фойдаланишдаги 4 км автомобиль йўли ва 700 м узунликдаги йўл ўтказгич қуриш объектининг ишчи лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва мазкур ҳужжатларни белгиланган тартибда Буюртмачига топшириш мажбуриятларини, Буюртмачи эса уни қабул қилиб олиш ва ҳақ тўлаш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

1.2. Бажариладиган ишлар 2022 йил “4” апрел да тасдиқланган топшириққа ва соҳага оид қонун талабларига асосан амалга оширилади.

1.3. Шартнома лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишга, қидирув ишларини бажаришга, лойиҳа-смета ҳужжатларини тегишли экспертизадан ўтказиб ижобий хулоса олишга, муаллифлик назорати олиб бориш ва техник шартларни ва АПЗ тайёрлаш, объектнинг лойиҳавий таянч нукталарини жойида боғлаш (разбивка) билан боғлиқ бошқа ишларга тузилган.

1.4. Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш, қидирув ишларини бажариш, экспертиза кўригидан ўтказиб ижобий хулоса олиш ва лойиҳа ечимларини ҳимоя қилиш ҳамда буюртмачига топшириш ишлари, шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Республика Ҳазначилигида рўйхатдан ўтган кундан бошланиб, 88 кун муддатда тугатилади (муаллифлик назорати ишларидан ташқари). Ушбу муддатларда бажарилмаган ишлар учун белгиланган тартибда пеня ҳисобланади ва ундирилади.

1.5. Пудратчи лойиҳа-смета ҳужжатларига экспертиза хулосасини олгандан сўнг 15 кун ичида 3 (уч) нусхада лойиҳа-смета ҳужжатларини Буюртмачига тақдим этиши керак.

1.6. Ушбу шартномани амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабрь. Кейинги йилга ўтса қўшимча келишув имзоланади.

2. Шартнома баҳоси ва тўловлар қондалари

2.1. Шартноманинг баҳоси 1-иловага мувофиқ ҚҚС билан 4 385 861 661,60 (тўрт миллиард уч юз саксон беш миллион саккиз юз олтмиш бир миң олти юз олтмиш бир сўм олтмиш) тийинни (шундан 2022 йилда 4 285 861 661,60 (тўрт миллиард икки юз саксон беш миллион саккиз юз олтмиш бир миң олти юз олтмиш бир сўм олтмиш) тийини лойиҳа ва қидирув ишларини ишлаб чиқишга, 100 000 000 (бир юз миллион) сўми объектда муаллифлик назорати ишларини бажариш учун ташкил қилади ва мазкур шартноманинг 2-иловасидаги лойиҳа ишларини бажариш ва молиялаштириш жадвалига мувофиқ бажарилади.

2.2. Буюртмачи шартнома Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ҳазначилигидан рўйхатдан ўтгандан сўнг 15 кун ичида жорий йилда бажариладиган ишлар ҳажмидан 15% миқдорда аванс тўловини амалга оширади.

2.3. Бажарилган ишлар учун жорий молиялаштириш Буюртмачи ва Пудратчи томонидан топшириш-қабул қилиш ва бошқа лозим ҳужжатлар, далолатномалар расмийлаштирилгандан сўнг 15 кун ичида ажратилган аванс маблағи миқдори тўлиқ ушлаб қолиниб амалга оширилади.

2.4. Лойиҳа-смета ҳужжатлари буюртмачи томонидан кўриб чиқилиб, пудратчи томонидан экспертизага тақдим этилгандан сўнг, жами ишлар ҳажмининг 70% фоиз миқдоригача тўлов учун қабул қилинади.

Объект бўйича ижобий экспертиза хулосаси олингандан сўнг ва 3 (уч) нусхада лойиҳа-смета ҳужжатлари Буюртмачига юк хати орқали тақдим этилгандан кейин қолган маблағ (муаллифлик назорати харажатларидан ташқари) топшириш-қабул қилиш далолатномаси расмийлаштирилиб, (мазкур шартноманинг 2.3-бандига асосан) молиялаштирилади.

2.5. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

ишлар қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;
ишлар ҳажми Буюртмачи томонидан ўзгартирилганда.

2.6. Экспертиза хулосаси олингандан сўнг шартноманинг умумий экспертиза томонидан тавсия этилган объектнинг қурилиш нархига асосланган ва буюртмачи билан келишилган ҳолда қайта кўриб чиқилиши мумкин, бунда объектнинг лойиҳа-смета ҳужжатлари тайёрлаш ишлари учун қўшимча шартнома имзоланади.

3. Томонлар мажбуриятлари

3.1. Буюртмачи барча ишлар бажариб бўлингандан кейин белгиланган нархнинг ҳаммасини Пудратчига тўлаши ёки ишларнинг айрим босқичлари тугалланганидан кейин нархнинг тегишли қисмини тўлаши; тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатларининг ёки бажарилган қидирув ишларининг камчиликлари борлиги муносабати билан учинчи шахс томонидан буюртмачига нисбатан қўзғатилган даъво аризасидан ишда қатнашишга Пудратчини жалб қилиши шарт.

3.2. Пудратчи Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиққандан сўнг, лойиҳа-смета ҳужжатларини тегишли экспертизадан ўтказишни ўз зиммасига олади.

3.3. Пудратчи лойиҳа ва қидирув ишларини бажариш учун топшириқдаги ва бошқа дастлабки маълумотлардаги талабларга риоя қилиши шарт ва буюртмачининг розилиги билангина улардан четга чиқишга ҳақли. Пудратчи ишларни лойиҳалаш ҳақидаги топшириқ ва бошқа дастлабки маълумотларга мувофиқ бажариши; тайёр бўлган лойиҳа-смета ҳужжатларини буюртмачи билан келишиб олиши, шунингдек; тайёр бўлган лойиҳа-смета ҳужжатларини ва қидирув ишлари натижаларини шартномада белгиланган муддатларда буюртмачига топшириши; буюртмачининг розилигисиз лойиҳа-смета ҳужжатларини учинчи шахсларга бермаслиги шарт.

3.4. Пудратчи лойиҳа-смета ҳужжатлари ва қидирув ишларидаги камчиликлар учун, шу жумладан кейинчалик қурилиш жараёнида, шунингдек тайёрланган лойиҳа-смета ҳужжатлари ва бажарилган қидирув ишлари маълумотлари асосида барпо этилган объектни ишлатиш жараёнида аниқланган камчиликлар учун жавобгар бўлади. Лойиҳа-смета ҳужжатларида ёки қидирув ишларида камчиликлар аниқланган тақдирда Пудратчи Буюртмачининг талаби билан лойиҳа-смета ҳужжатларини бепул қайта ишлаб чиқиш ва шунга мувофиқ зарур қўшимча қидирув ишларини бажариш, шунингдек, агар қонунда ёки шартномада бошқача тартиб белгиланган бўлмаса, келтирилган зарарни буюртмачига тўлаши шарт.

3.5. Пудратчи Лойиҳа ва қидирув ҳужжатлари асосида объект қурилиши жараёнида муаллифлик назоратини амалга оширади.

4. Ишларни топшириш ва қабул қилиш тартиби

4.1. Бажарилган ишларни топшириш ва қабул қилиш Лойиҳа-смета ҳужжатларини бажариш топшириқ талабларига биноан белгиланади.

4.2. Ишлар бажарилишининг алоҳида босқичи ва шартнома бўйича белгиланган жами ишлар тугагандан сўнг Пудратчи Буюртмачига ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси билан ҳужжатлар тўпламини топширади.

4.3. Буюртмачи ишларни топшириш ва қабул қилиш далолатномаси ва мазкур шартноманинг 4.2 бандида кўрсатилган ҳисобот ҳужжатларини олгандан сўнг 10 кун мобайнида ишларни қабул қилиш ва Пудратчига имзоланган топшириш ва қабул қилиш далолатномасини ёки ишларни қабул қилмасликнинг асосланган рад жавобини юборишни ўз зиммасига олади.

4.4. Буюртмачи ишларни қабул қилмаслигининг асосли рад жавобини берган ҳолда зарур бўлган қўшимча ишларнинг рўйхати ва уларнинг бажарилиш муддатларини кўрсатган ҳолда, икки томонлама далолатнома тузилади.

4.5. Агар ишларни бажарилиш жараёнида уни давом эттириш мақсадга мувофиқ эмаслиги аниқланса, томонлар 5 кун муддат ичида уни тўхтатиш тўғрисида бир-бирини хабардор қилиши ва 15 кун ичида ишларни давом эттириш мақсадга мувофиқ ёки мувофиқ эмаслиги тўғрисидаги масалани кўриб чиқиши шарт. Ишларнинг тўхтатилиши томонлар учун Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига кўзда тутилган оқибатлар ва жавобгарликка олиб келади.

4.6. Томонлардан бири мазкур шартномада кўзда тутилган ишларни тўхтатиш тўғрисида ёзма хабар берган вақт ўзаро ҳисоб-китоб қилиш вақти ҳисобланади.

4.7. Лозим топилган ҳолларда томонлар ҳолис экспертларга Лойиҳа бўйича хулоса учун мурожаат қилиши мумкин.

5. Конфиденциал маълумотларни ҳимоялаш

5.1. Ишлар бажарилиши даврида Пудратчи конфиденциал ҳисобланадиган маълумотлар ишлаб чиққан ёки уларни Буюртмачидан олган ҳолларда уларни ҳимоялаш, ошқор бўлишини олдини олиш мақсадида тегишли тадбир ва чоралар кўради.

6. Қўшимча шартлар

6.1. Пудратчи лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ишларини муддатидан олдин бажарган ҳолда, Буюртмачи уни мазкур шартноманинг 4-бандига асосан қабул қилади ва тўла тўловни амалга оширади.

6.2. Ўзаро мулоқат йўли билан ҳал қилинмаган муаммолар қонун ҳужжатларида ўрнатилган тартибда ҳал қилинади. Келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишмовчиликлар, низолар Тошкент туманлараро Иқтисодий судида эътироз тартибига риоя қилган ҳолда, кўриб чиқилади. Эътирозлар ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз билдирилган томон олганидан кейин 1 (бир) ой муддатни ташкил этади.

6.3. Шартномага томонлар розилиги асосида, ёзма равишда ўзгартиришлар ва қўшимчалар киритилиши мумкин. Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортиш, шартномани бир тарафлама бекор қилиш мумкин эмас.

6.4. Пудратчи шартномада кўрсатилган ишларни бажариш учун, Буюртмачини ўрнатилган тартибда маълум қилган ҳолда, учинчи шахсларни ўрнатилган тартибда жалб қилиш ҳуқуқига эга.

6.5. Буюртмачи томонидан дастлабки тўлов ўз вақтида ўтказилмаган ҳолда кечиктирилганда ишларни тугаллаш муддати тўлов кечиктирилган вақтга қадар узайтирилади.

6.6. Буюртмачи томонидан топшириш-қабул қилиш ва бошқа лозим ҳужжатлар, далолатномалар расмийлаштирилгандан сўнг тўловлар билан боғлиқ ўз мажбуриятлари кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўланади, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

6.7. Пудратчи томонидан лойиҳа-смета ҳужжатларини тайёрлаш ва буюртмачига топшириш ўз вақтида бажарилмай мажбуриятлар бузилган бўлса, Пудратчи Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 20 фоизидан ошмаслиги лозим.

6.8. Тўланган пеня ёки жарималар томонларни ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

6.9. Ушбу шартнома ўзбек тилида икки нусхада тузилди.

6.10. Мазкур шартнома томонлар ўз мажбуриятларини тўлиқ бажаргунча қадар амал қилади.

6.11. Шартномага қуйидагилар илова қилинади:

- Шартнома баҳосининг келишуви баённомаси (1-илова)
- Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқишни бажариш ва молиялаштириш жадвали (2-илова)

7. Томонларнинг манзили ва ҳисоб рақамлари

“Буюртмачи”

“Умумий фойдаланишдаги автомобил
йўллари қуриш ва реконструкция қилиш
дирекцияси” ДУК

100000.Тошкент шаҳри,
Мустақиллик шоҳ кўчаси 68-уй.
Тел: (71) 237-32-04
х/р: 3045 1086 0262 6970 45 113 118 054
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги
Ҳазначилиги Амалиёт бошқармаси
х/р: 2340 2000 3001 0000 1010
МФО: 00014 ИНН: 304 803666
МБ Тошкент шаҳар бўйича ББ ХКМ



Директор

Д.Юсупов

“Пудратчи”

"Boshtransloyiha" АЖ

100060, Тошкент шаҳар,
Нукус кўчаси, 23а-уй,
Тел: 71-255-82-98, 71-233-27-82
Ҳ/р: 2020 8000 0001 0625 5001
Тошкент ш. ЧАБ “Трастбанк”
Яккасарой бўлими
МФО: 01098
ИНН: 201 052 150
ОКЭД: 71110

Бош директор

Р.В.Рузиев

ЛБМ

С.Н. Джумабаев

Шартнома баҳосининг келишув

БАЁННОМАСИ

Биз, қуйида имзо чекувчилар 4К-253а "Ислом Каримов шоҳ кўчасига" шаҳобча автомобиль йўлидан М39 "Тошкент-Термиз" автомобиль йўлига" уланувчи янги йўналишдаги умумий фойдаланишдаги 4 км автомобиль йўли ва 700 пм узунликдаги йўл ўтказгич қуриш объектининг ишчи лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича 2022 йил “13” апрелдаги 3751 РП-сонли шартнома баҳоси жами ҚҚС билан 4 385 861 661,60 (тўрт миллиард уч юз саксон беш миллион саккиз юз олтмиш бир минг олти юз олтмиш бир сўм олтмиш) тийинга тенг деб келишилганини тасдиқлаймиз.

Ушбу баённома Буюртмачи ва Пудратчи ўртасида ўзаро ҳисоб–китобларни амалга ошириш учун асос ҳисобланади.

“Буюртмачи”

“Буюртмачи”

“Умумий фойдаланишдаги автомобил йўлларини қуриш ва реконструкция қилиш дирекцияси” ДУК
100000.Тошкент шаҳри,
Мустақиллик шоҳ кўчаси 68-уй.
Тел: (71) 237-32-04
х/р: 3045 1086 0262 6970 45 113 118 054
Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги
Ҳазначилиги Амалиёт бошқармаси
х/р: 2340 2000 3001 0000 1010
МФО: 00014 ИНН: 304 803666
МБ Тошкент шаҳар бўйича ББ ЖКМ

Директор  Д.Юсупов




“Пудратчи”

"Boshtransloyiha" АЖ

100060, Тошкент шаҳар,
Нукус кўчаси, 23а-уй,
Тел: 71-255-82-98, 71-233-27-82
Х/р: 2020 8000 0001 0625 5001
Тошкент ш. ЧАБ “Трастбанк”
Яккасарой бўлими
МФО: 01098
ИНН: 201 052 150
ОКЭД: 71110

Бош директор  Р.В.Рузиев

ЛБМ  С.Н. Джумабаев



4К253а "Ислом Каримов шох кўчасига" шахобча автомобиль йўлидан М39 "Тошкент-Термиз" автомобиль йўлига" уланувчи янги йўналишдаги умумий фойдаланишдаги 4 км автомобиль йўли ва 700 пм узунликдаги йўл ўтказгич қуриш объектнинг ишчи лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш

БАЖАРИШ ВА МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

№	Бажариладиган ишларнинг номи	Қиймати	Бажариш (Шартноманинг 1.4 банди асосида)		Молиялаштириш (Шартноманинг 2.3 банди асосида)	
			2022 йил	2023 йил	2022 йил	2023 йил
	Аванс маблағи				642 879 249,24	
1	Топография ва геология ишлари, диагностика ишлари, Атроф муҳитга таъсир баёни (ЗВОС), АПЗ тайёрлаш, Лойиҳа-смета ишлари, Экспертиза харажатлари	4 285 861 661,60	4 285 861 661,60		3 642 982 412,36	
2	Муаллифлик назорати	100 000 000,00		100 000 000,00		100 000 000,00
	Жами ҚҚС билан:	4 385 861 661,60	4 285 861 661,60	100 000 000,00	4 285 861 661,60	100 000 000,00



Буюртмачи

Д. Юсупов



Пудратчи

Р.В. Рузиев

ЛБМ

С.Н. Джумабаев

Ишчи лойиҳа - смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва (ёки) қидирув ишларини
бажариш шартнома лойиҳаси бўйича

ЮРИДИК ХУЛОСА

*(Ўзбекистон Республикаси "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг
шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Қонуннинг 21-моддасига мувофиқ)*

2022 йил

Тошкент ш.

“Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларини қуриш ва реконструкция қилиш дирекцияси” ДУК (Кейинги ўринларда – Буюртмачи деб юритилади) ва “Boshtransloyiha” АЖ (Кейинги ўринларда – Пудратчи деб юритилади) ўртасидаги 4R253а “Ислом Каримов шоҳ кўчасига” шаҳобча автомобиль йўлидан М39 “Тошкент-Термез” автомобиль йўлига” уланувчи янги йўналишдаги умумий фойдаланишдаги 4 км. автомобиль йўли ва 700 пм узунликдаги йўл ўтказгич қуриш объектининг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ҳақидаги шартнома лойиҳаси (Кейинги ўринларда – Шартнома деб юритилади)ни Буюртмачининг Юридик хизмати ҳуқуқий экспертизадан ўтказди.

Ҳуқуқий экспертиза натижасида қуйидагилар аниқланди:

Шартномада кўрсатилган муносабатлар Ўзбекистон Республикаси "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Қонуни, Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодекси, шу жумладан кодекснинг 37-боб талаблари ҳамда бошқа Ўзбекистон Республикаси норматив-ҳуқуқий ҳужжатлари билан тартибга солинади. Шартномадан келиб чиқадиган ўз мажбуриятларини бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлиги учун тарафларнинг жавобгарлик меъёри Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 24-боб талабларига мувофиқ келади.

Шартнома Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сонли қарори, Тендер комиссияси йиғилишининг 2022 йил 9 апрелдаги баени (лот 54632) га асосан тузилган.

Мазкур хулоса Шартнома лойиҳаси шартларининг амалдаги қонун ҳужжатлари талабларига жавоб бериши хусусида берилди.

Бош юрисконсулт



Ш.Батиров



**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI IQTISODIY TARAQQIYOT
VA KAMBAG‘ALLIKNI QISQARTIRISH VAZIRLIGI HUZURIDAGI
“LOYIHALAR VA IMPORT KONTRAKTLARINI KOMPLEKS EKSPERTIZA QILISH MARKAZI”
DAVLAT UNITAR KORXONASI**

2022-yil 10 may № 14/01-06/1-1450 100084, Toshkent, Amir Temur shoh ko‘chasi, 107-B

**“Umumiy foydalanishdagi avtomobil yo‘llarini
qurish va rekonstruksiya qilish direksiyasi”
DUK**

Tender hujjatini kompleks ekspertiza natijalari bo‘yicha

XULOSASI

Loyihaning nomi	4K253a “Islom Karimov shoh ko‘chasiga” shaxobcha avtomobil yo‘lidan M39 “Toshkent-Termiz” avtomobil yo‘liga” ulanuvchi yangi yo‘nalishdagi 4 km avtomobil yo‘li va 700 m uzunlikdagi yo‘l o‘tkazgich qurish obyekti ishchi loyihasini (IL) ishlab chiqish.
Buyurtmachi arizasining raqami va sanasi	2022-yil 1-martdagi DI/05-320-sonli xati.
Buyurtmachi	“Umumiy foydalanishdagi avtomobil yo‘llarini qurish va rekonstruksiya qilish direksiyasi” DUK
Loyiha amalga oshirilishi uchun asos	O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 22-yanvardagi PQ-98-son qarori.
Moliyalashtirish manbai	Davlat byudjet mablag‘lari hisobidan.
Loyihaning chegaraviy narxi	5 482 337 077 so‘m, QQS bilan, 4 767 249 632 so‘m, QQS siz.
Ekspertiza o‘tkazish uchun asos	O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 8-yanvardagi PQ-3464-sonli va 2018-yil 20-fevraldagi PQ-3550-sonli qarorlari.

O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambag‘allikni qisqartirish vazirligi huzuridagi “Loyihalar va import kontraktlarini kompleks ekspertiza qilish markazi” DUK (keyingi o‘rinlarda Markaz deb yuritiladi) “4K253a “Islom Karimov shoh ko‘chasiga” shaxobcha avtomobil yo‘lidan M39 “Toshkent-Termiz” avtomobil yo‘liga” ulanuvchi yangi yo‘nalishdagi 4 km avtomobil yo‘li va 700 pm uzunlikdagi yo‘l o‘tkazgich qurish obyektini ishchi loyihasini (IL) ishlab chiqish” obyektini bo‘yicha tender hujjatining ish hajmlari va ularning narx parametrlari qismida takroriy o‘tkazilgan kompleks ekspertiza natijalari bo‘yicha e‘tirozlar mavjud emasligi va davlat xaridlarini belgilangan tartibda o‘tkazish mumkinligini ma‘lum qiladi.

O‘z o‘rnida, xarid jarayonlari boshlanishidan avval obyekt nomiga hukumatning tegishli qarorlariga muvofiq, taqdim qilingan asosga o‘zgartirish kiritish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz.

Buyurtmachi davlat xaridlarini maxsus axborot portalida, ommaviy axborot vositalarida va rasmiy veb-saytlarda tender (tanlov) o‘tkazish to‘g‘risidagi e‘lonni joylashtirish orqali qurilish pudrat tashkilotlarini keng jalb etilishini ta‘minlashi kerak.

Shu bilan birga, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003-yil 11-iyundagi 261-sonli “Markazlashtirilgan kapital qo‘yilmalar hisobidan amalga oshiriladigan investitsiya loyihalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o‘tish to‘g‘risida”gi qarorining 1-ilovasi 4-bandiga muvofiq buyurtmachi tomonidan aniqlangan boshlang‘ich qiymati tanlov savdolari (tenderlar) o‘tkazishda yo‘nalish hisoblanadi va pudrat shartnomasi (kontrakt) tuzish uchun asos bo‘lib xizmat qilmaydi. Obyektning shartnoma qiymati o‘tkazilgan tanlov savdolari (tenderlar) natijalari bo‘yicha aniqlanadi.

O‘z navbatida buyurtmachi haqqoniylik, ratsionallik, iqtisod tamoyillariga rioya qilish, moliyaviy mablag‘lardan samarali foydalanish, shuningdek O‘zbekiston Respublikasining “Davlat xaridlari to‘g‘risida”gi Qonunda nazarda tutilgan xaridlarni amalga oshirishda shaffoflik va korrupsiyaga yo‘l qo‘yilmasligini ta‘minlashga javobgardir.


M. Allabergenov

B. Xusanov

G‘. Shodiyev

L. Do‘smuhamedov

K. Raximbekov

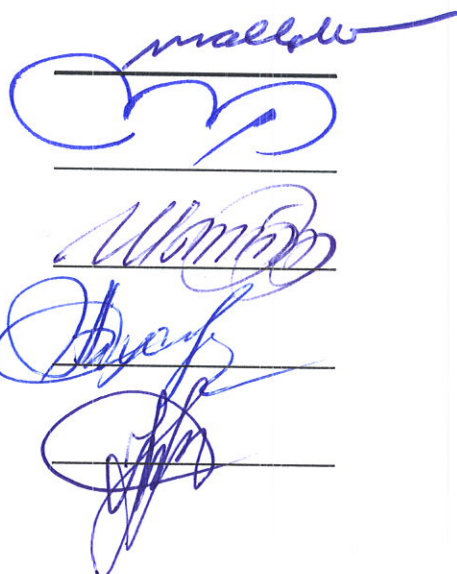

"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Ўзбекистон Республикаси Транспорт вазирлиги
хузуридаги Автомобиль йўллари қўмитаси



"Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари қуриш ва реконструкция қилиш дирекцияси" ДУК буюртмачилигида Давлат бюджети маблағлари ҳисобидан умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари қуриш ва реконструкция қилиш объектларининг лойиҳа-қидирув ишлари бўйича 2022 йил учун

МАНЗИЛ РЎЙХАТИ

(2022 16)

(млн. сўм)

№	Лойиҳалаштириладиган объект номи ва манзили	Лойиҳалаштириладиган объект қувавати (мос қийматларда)	Қурилиш ишлари бошланиш ва тугаш йили	Қурилишнинг тахминий ҳисобланган умумий қиймати	Лойиҳа босқичи ДТИА, ТИА, ДТИХ, ТИХ, ИЛ, Л, ИХ, ТХ	ЛҚИнинг объектлар бўйича қиймати	2022 йил 1 январь ҳолатига бажарилган ЛҚИ	2022 йил 1 январь ҳолатига ЛҚИ нинг қолдиқ қиймати	2022 йилда кутилаётган ЛҚИ	ЛСХ ларини буюртмачига топшириш муддати (йил, ой)	Лойиҳачи учун асос, (тендер, танлов савдолари баёни № ва санаси, ВМ қарорлари, фармойишлари, топшириқлари ва ҳ.к.)	Лойиҳа институти номи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	А380 "Ғузур-Бухоро-Нукус-Бейнеу" автомобиль йўлининг 150-228 км қисмини реконструкция қилиш (цементобетон қопламали)	78 км	2021-2023	877 500,0	ТИА, ИХ	20 488,8	15 847,2	4 641,6	4 441,6	2019-2022 йил	ЎзР Президентининг 2019 йил 4 апрелдаги №7427-хх-сонли баёни	"Ўзйўллойиҳа" ЛҚИ ДУК
2	4Р12 "Бектемир ш.-Чирчиқ ш.-Ғазалкент ш.-Чорбоғ қўргони" автомобиль йўлининг Чирчиқ шаҳрига кириш қисмида Чирчиқ дарёси устидан ўтувчи янги замонавий кўприк ва автомобиль тоннели қурилиши	160 пм	2022-2023	114 271,8	ИЛ	3 040,9		3 040,9	2 888,9	2022 йил	ЎзРесп Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сонли қарори, ВМ 02.02.2022 йдаги қарори	"Кўприкқурилиш-лойиҳа" УК
3	4К-253а "Ислом Каримов шоҳ кўчасига" шаҳобча автомобиль йўлидан М39 "Тошкент-Термиз" автомобиль йўлига" уланувчи янги йўналишдаги умумий фойдаланишдаги 4 км автомобиль йўли ва 700 пм узунликдаги йўл ўтказгич қуриш	4 км	2022-2024	219 293,5	ИЛ	4 385,9		4 385,9	4 385,9	2022 йил	-98- 2022 22 54632- 09.04.2022	"Boshtransloyiha" AJ
4	4Р74 "А-380 Ғузур-Бухоро-Нукус-Бейнеу а/йули-Учқир газ кони" автомобиль йўлининг 5,800 км.дан кесиб ўтувчи коллектор устида кўприк қуриш	73 пм	2022-2023	9 244,4	ИЛ	184,9		184,9	179,9	2022 йил	ЎзРесп Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сонли қарори, 54610-сонли лот бўйича 28.03.2022йдаги танлов комиссияси баёни	"Йўллойиҳа бюроси" МЧЖ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	A-380 "Фузор-Бухоро-Нукус-Бейнеу" автомобиль йўлининг 368,1 кмда "Ўнг қирғоқ" коллектори устидан янги кўприк қуриш	60 км	2022-2024	33 385,3	ИЛ	667,7		667,7	662,7	2022 йил	ЎзРесп Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сонли қарори, 54494-сонли пот буйича 28.03.2022йдаги танлов комиссияси баёни	"Йўллойиҳа бюроси" МЧЖ
6	4P48 "Зарафшон тракти" автомобиль йўлининг 270 км.дан М37 "Самарқанд - Бухоро – Туркманбоши" автомобиль йўлига уланадиган 3 км айланма йўлини қуриш	3 км	2023	27 432,0	ИЛ	540,0	461,7	78,3	51,3	2021 йил 2022 йил	ЎзР Президенти 2021 йил 21-22 январдаги Бухоро вилоятига ташрифи 4-сонли (29.01.2021й №02-РА1-2003) баёни, ВМ раёсати мажлисининг 27.04.2021йдаги 52-сонли баёни, Танлов ком-яси йиғ-шнинг 22.07.2021 йилдаги 194-сонли баёни, Харид ком-ясининг 01.02.2022йдаги 1/л-сонли баёни	"Бухоро Geo Road proekt group" МЧЖ
7	A376 "Қўқон-Жиззах" автомобиль йўлининг 246-252 ҳамда 273-282 км қисмини реконструкция қилиш	15 км	2023	130 000,0	ИЛ	941,5	805,0	136,5	89,4	2021 йил 2022 йил	ВМ раёсатининг 08.09.2021йдаги 130-сонли баёни, Танлов комиссияси йиғ-шнинг 21.10.2021йдаги 239/1-сонли баёни, Харид ком-ясининг 01.02.2022йдаги 1/л-сонли баёни	"Йўллойиҳа бюроси" МЧЖ
8	4P90 "Қарши ш. - Бешкент ш. - Қамаш қ. - Касби қ - Косон ш." автомобиль йўлининг 9-11 км қисмини реконструкция қилиш	3 км	2023	34 000,0	ИЛ	516,3	390,7	125,6	102,7	2021 йил 2022 йил	ВМ раёсатининг 08.09.2021йдаги 130-сонли баёни, Танлов комиссияси йиғ-шнинг 21.10.2021йдаги 238/1-сонли баёни, Харид ком-ясининг 01.02.2022йдаги 1/л-сонли баёни	"Йўллойиҳа бюроси" МЧЖ
9	A377 "Самарқанд - Айний" автомобиль йўлининг 9-36 км (1-босқич 34-36 км) қисмини реконструкция қилиш	2 км	2023	23 640,0	ИЛ	440,1	376,3	63,8	41,8	2021 йил 2022 йил	ВМ раёсатининг 08.09.2021йдаги 130-сонли баёни, Танлов комиссияси йиғ-шнинг 21.10.2021йдаги 240/1-сонли баёни, Харид ком-ясининг 01.02.2022йдаги 1/л-сонли баёни	"Йўллойиҳа бюроси" МЧЖ
10	M39 б "Тошкент ҳалқа йўли" автомобиль йўлининг 59 км даги темир йўл устидан ўтган йўл ўтказгични реконструкция қилиш		2022	28 841,0	ИЛ	703,4	538,7	164,8	133,3	2021 йил 2022 йил	ЎзР ВМ Раёсати Мажлисининг 11.08.2021йилдаги 118-сонли баёни, Танлов комиссияси йиғ-шнинг 08.10.2021йилдаги 237/1-сонли баёни, Харид ком-ясининг 01.02.2022йдаги 1/л-сонли баёни	"Ўзйўллойиҳа" ЛҚИ ДУК
11	4K92 "Андижон ш.-Нефтчилар шаҳарчаси-Тожиқобод қ." автомобиль йўлининг 0-7 км қисмини реконструкция қилиш	7 км	2021-2022	43 798,3	ИЛ	834,0	699,0	135,0	98,2	2021 йил 2022 йил	ЎзР ВМ Раёсати Мажлисининг 11.08.2021йилдаги 118-сонли баёни, Танлов комиссияси йиғ-шнинг 08.10.2021йилдаги 236/1-сонли баёни, Харид ком-ясининг 01.02.2022йдаги 1/л-сонли баёни	"MIMAX-ROAD" МЧЖ
12	4P2 "Тошкент шаҳри - Тўйтепа шаҳри - А373 автйўли (55 км) Тошкент ш. - Минерал сувлар сиҳатгоҳи - Абай қ. (Ўзбекистон Республикаси ҳудудида)" автомобиль йўлининг 28,5-35,2 км қисмини қайта қуриш	6,7 км	2021-2022	103 400,2	ИЛ	1 118,3	891,1	227,2	180,3	2021 йил 2022 йил	ВМ раёсатининг 08.09.2021йдаги 130-сонли баёни, Танлов ком-яси йиғ-шнинг 21.10.2021йдаги 241/1-сонли баёни, Харид ком-ясининг 01.02.2022йдаги 1/л-сонли баёни	"Ўзйўллойиҳа" ЛҚИ ДУК
13	4P214 "Наманган ш.-Қозоқовул қ.-Косонсой ш." автомобиль йўлининг 0-13 км қисмини реконструкция қилиш	13 км	2021-2022	81 945,6	ИЛ	1 235,3	1 059,3	176,1	120,3	2021 йил 2022 йил	ЎзР ВМ Раёсати Мажлисининг 04.06.2021йдаги 113-сонли баёни, Наманган вил ҳокимининг 03.07.2021йдаги 03/06-26-сонли баёни, Танлов ком-яси йиғ-шнинг 08.10.2021йдаги 234/1-сонли баёни, Харид ком-ясининг 01.02.2022йдаги 1/л-сонли баёни	"Йўллойиҳа бюроси" МЧЖ
14	Сариосиё тумани "Боғча" аҳоли пунктидан Шаҳрисабз тумани Камар қишлоғига олиб борувчи 2-тоифали 78 км узунликдаги йўл қуриш	78 км	2022-2026	1 270 833,3	ИЛ	18 000,0		18 000,0	18 000,0	2022 йил	ЎзРесп Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сонли қарори, ЎзРесп Президенти ташрифининг 2021 йил 14 июндаги 02-РА 1-9900 (30)-сонли баёни, 57092-сонли пот буйича 18.04.2022йдаги харид комиссияси баёни	"Сурхондарёйўллойиҳа" институти МЧЖ
15	M39 "Алмати-Бишкек-Тошкент-Шаҳрисабз-Термиз" автомобиль йўлининг 817-827 км қисмини реконструкция қилиш	10 км	2022-2023	858 503,5	ИЛ	12 330,0		12 330,0	12 280,0	2022 йил	ЎзРесп Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сонли қарори, Танлов ком-яси йиғ-шнинг 30.03.2022йдаги 2/л-сонли баёни	"Йўллойиҳа бюроси" МЧЖ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	M396 "Тошкент ҳалқа йўли" автомобиль йўлининг 34-36 км қисми (Темур Малик кўчаси)ни реконструкция қилиш	2 км	2022-2023	292 686,5	ИЛ	5 400,0		5 400,0	5 350,0	2022 йил	ЎзРесп Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сонли қарори, Танлов комиссиясининг 30.03.2022йдаги 3/л-сонли баёни	"Йўллойиҳа бюроси" МЧЖ
17	A380 "Ғузур - Бухоро - Нукус - Бейнеу" автомобиль йўлининг 315-490 км ва 581-812 км (шу жумладан 581-698 км) қисмини реконструкция қилиш	117 км	2022	2 336 000,0	ТИА	25 540,0	21 809,8	3 730,2	1 070,0	2021 йил 2022 йил	ПҚ-1103 22.04.2009 й. Ўз.Респ.През.админ. 09.10.2020 йдаги №02-2858 (73)-сонли баёни. Ўз.Рес. ВМ 2020 йил 19 ноябрдаги 144-сонли баёни	"Йўллойиҳа бюроси" МЧЖ
18	4P2 "Тошкент шаҳри-Тўйтепа шаҳри-А373 автойўли (55 км)" автомобиль йўлининг 4P21 "Тошкент айланма автойўли" автомобиль йўли билан кесишган қисмида транспорт ечимини куриш	300 пм	2022-2024	145 985,3	ИЛ	2 919,7		2 919,7	2 919,7	2022 йил	ЎзРесп Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сонли қарори, 57166-сонли лот бўйича 14.04.2022йдаги харид комиссияси баёни	"Ўзйўллойиҳа" ЛҚИ ДУК
19	4P148 "4P115 автомобиль йўли - Янгиқадам қ. - Учуй қ. - Олтиариқ ш. - Чимён қ. - Водил қ." автомобиль йўлининг 36-64 км реконструкция қилиш	28 км	2022-2023	142 761,0	ИЛ	2 853,0	1 982,1	870,8	53,0	2018 йил 2022 йил	Ўз.Р. ВМ 14.03.2017 й. 05-21-23-11 (48) - сонли баёни, Харид комиссиясининг 01.02.2022йдаги 1/л-сонли баёни	"Фарғонайўллойиҳа институти" МЧЖ
20	4P112 "Фарғона халқа йўли" автомобиль йўлининг 259-276 км қисмини реконструкция қилиш	17 км	2021-2023	88 541,7	ИЛ	2 075,4	1 880,0	195,4	171,5	2020 йил 2022 йил	ПҚ-2776 14.02.17й. ЎзР ВМнинг 09.09.2019йдаги №05-05/1-1741 -сонли баёни, Харид комиссиясининг 01.02.2022йдаги 1/л-сонли баёни	"Йўллойиҳа бюроси" МЧЖ
21	M396 "Тошкент ҳалқа йўли" автомобиль йўлининг 36-41 км қисмини реконструкция қилиш	5 км	2021-2028	50 000,0	ИЛ	750,0		750,0	50,0	2022 йил	ЎзРесп Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сонли қарори	Танлов
22	Тошкент вилоятида барпо этилаётган "Янги Ўзбекистон боғи" атрофидаги маҳаллий автомобиль йўллари ва йўл ўтказгичларни куриш	3,5 км	2021-2022	150 000,0	ИЛ	2 499,9		2 499,9	2 449,9	2022 йил	ЎзРесп Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сонли қарори, ВМнинг 2021 йил 14 майдаги қарори	"Йўллойиҳа бюроси" МЧЖ
23	A380 "Ғузур-Бухоро-Нукус-Бейнеу" автомобиль йўлининг 738-743 км қисмини реконструкция қилиш	5 км	2022-2023	29 000,0	ИЛ	213,1		213,1	213,1	2022 йил	ЎзРесп Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сонли қарори, 62673-сонли лот бўйича 18.04.2022йдаги харид комиссияси баёни	"Qqavtojlojybar" МЧЖ
24	A380 "Ғузур-Бухоро-Нукус-Бейнеу" автомобиль йўлининг 752-753 км қисмини реконструкция қилиш	1 км	2022-2023	7 812,9	ИЛ	48,1		48,1	48,1	2022 йил	ЎзРесп Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сонли қарори, 62692-сонли лот бўйича 18.04.2022йдаги харид комиссияси баёни	"Qqavtojlojybar" МЧЖ
25	A380 "Ғузур-Бухоро-Нукус-Бейнеу" автомобиль йўлининг 753-757 км қисмини реконструкция қилиш	4 км	2022-2023	47 850,1	ИЛ	300,0		300,0	300,0	2022 йил	ЎзРесп Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сонли қарори, 62698-сонли лот бўйича 18.04.2022йдаги харид комиссияси баёни	"Qqavtojlojybar" МЧЖ
26	Қамчиқ ва Резак тоннелларида ёритиш вентиляция ва ёғинга қарши курашиш тизимларини модернизация қилиш	объект	2019-2022	44 163,1	ИЛ	1 390,9	763,2	627,6	627,6	2022 йил	ВМ 31.05.16й. 05-05/83-8-сонли баёни, ВМ 26.11.21й. 05-05/1-466 (22)-сонли баёни	"Гидропроект" АЖ
27	A380 а "Бухоро халқа йўли" автомобиль йўлининг 14,0 км, 16,0 км даги кўприкларни реконструкция қилиш	19,4 пм	2022	2 430,0	ИЛ	60,8		60,8	60,8	2022 йил	ВМ раёсати мажлисининг 15.04.2021йдаги 54-сонли баёни	Танлов
28	4K248 "Равот қ.-Ардахшон қ." автомобиль йўлининг ПК7+225 даги кўприкни реконструкция қилиш	20 пм	2022	4 220,0	ИЛ	105,5		105,5	105,5	2022 йил	ВМ раёсати мажлисининг 15.04.2021йдаги 54-сонли баёни	Танлов
29	4P92 "Қарши ш.-Толликўрғон қ.-Касби ш.-Жуйнов қ.-Помуқ қ." автомобиль йўлининг 28 км даги зовур кўприкни реконструкция қилиш	36 пм	2022	3 150,0	ИЛ	78,8		78,8	78,8	2022 йил	ВМ раёсати мажлисининг 15.04.2021йдаги 54-сонли баёни	Танлов
30	4P56 "Оқтош ш.-Янгиработ ш.-Лангар қ.-Чуя қ." автомобиль йўлининг 1,5 км даги Нарпай каналдан ўтувчи кўприкни реконструкция қилиш	41 пм	2022	2 500,0	ИЛ	62,5		62,5	62,5	2022 йил	ВМ раёсати мажлисининг 15.04.2021йдаги 54-сонли баёни	Танлов
31	4K621 "4P107 автойўли-Сангардак қ." автомобиль йўлининг 8,7 км, 9,3 км, 10,7 км ва 13 км қисмларидаги кўприкларни реконструкция қилиш	66 пм	2022	7 000,0	ИЛ	175,0		175,0	175,0	2022 йил	ВМ раёсати мажлисининг 15.04.2021йдаги 54-сонли баёни	Танлов

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	А373 "М39 автойўли-Гулистон-Бўка-Ангрен-Кўқон ва Андижон орқали-Ўш" автомобиль йўллари 61 км даги (Гулистон-Охангарон йўналиши бўйича) Сирдарё кўпригини реконструкция қилиш	277 пм	2022	9 908,1	ИЛ	57,5		57,5	57,5	2022 йил	ВМ раёсати мажлисининг 15.04.2021 йдаги 54-сонли баёни	Танлов
	Жами, шу жумладан:			7 220 097,6		109 957,2	47 504,0	62 453,2	57 449,3			
	ҚМИ дан олинган қисми								49 167,0			
	Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўлларида ўлчов тарозиларини ўрнатиш учун								1 813,6			
	Тақсимланмаган маблағ								69 904,1			
	Ҳаммаси			7 220 097,6		109 957,2	47 504,0	62 453,2	129 167,0			

"КИРИТИЛДИ"
 "Умумий фойдаланишдаги автомобиль йўллари
 қуриш ва реконструкция қилиш
 Дирекцияси" ДУК
 _____ Д.Юсупов
 " " 2022 йил



"КЕЛИШИЛДИ"
 Ўзбекистон Республикаси
 Молия вазирлиги
 _____ С.Садуллаев
 " " 2022 йил

"КЕЛИШИЛДИ"
 Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий тараққиёт ва
 камбағалликни қисқартириш вазирлиги
 _____ А.Бобоев
 " " 2022 йил
