



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 16.05.2022 г. № 26-22

между ООО "ARX-ENGINEERS GROUP" и Инжиниринговая Компания СЕЗ СМ РК на общую сумму 33200000,00

Глава 110
Казначейский лицевой счёт 301121860354017063201110172

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	(в суммах)			
Январь	4312900			
Февраль				
Март				
Апрель				
Май	33 200 000,00			33 200 000,00
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	33 200 000,00			33 200 000,00

Всего 33200000,00 сум

Тридцать три миллиона двести тысяч сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы _____ сум или _____ от общей суммы договора подлежат предоплате в _____ мес. 20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____ % , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца.

(Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.

Руководитель заказчика

Главный бухгалтер заказчика

Принял работник казначейского подразделения

«__» _____ 20__ г.

(подпись)

Исмаилов.П

Ф.И.О.

(подпись)

Арзиев.А

Ф.И.О.

Получил работник
заказчика

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

III. Стоимость работы и порядок расчётов.

1. Стоимость работ, выполняемых «Исполнителем» по настоящему договору, составляет - 33 200 000 сум (Тридцать три миллиона сумов) без НДС в т.ч. НДС, Авторский надзор, Гелеконтракт, проект ЭБОС, Электронная регистрация, АТЦ, Инженерия).

2. Предоплату в размере 30 % от стоимости данного договора заказчик перечисляет «Исполнителю» после регистрации договора в управлении Казначейства.

ДОГОВОР № 26-22
на выполнение проектных и изыскательских работ

г. Нукус

«16» 05 2022 год.

“Инжиниринговая Компания” Службы Единого Заказчика Совета Министров Республики Каракалпакстан, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого Заместителя Директора Исмаилова П., действующего на основании Положения, с одной стороны, и ООО “Arx-engineers group” именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Кадилова А., действующего на основании Устава с другой стороны, заключили данный договор о нижеследующем:

I. Предмет договора.

«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя (передает) разработку проектно-сметной документации по объекту: **Строительство водопроводных сетей и строительство опреснительной станции в центре ССГ «Актерек» Нукусского района.**

1.1. Технические, экономические и другие требования к проектно-сметной и изыскательской документации устанавливаются заданием на проектирование или программой работ.

1.2. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом.

II. Обязанности сторон.

2.1. «Исполнитель» обязан:

- выполнить работы в соответствии с заданием на проектирование;
- согласовать с «Заказчиком» результаты выполненных работ (этапов);
- передать «Заказчику» все исполненные работы по договору.
- подготовить качественную и своевременную первично-разрешительную, предпроектную документацию за дополнительную плату, включая сбор технических условий, топосъемку и геологию участка строительства;
- соблюдать требования «Градостроительного законодательства»;
- избегать ошибок в объемах работ и затрат и упущений при составлении проектной документации;
- в случае выявления в проектно-сметной документации недостатков в процессе строительства и недочетов с нарушением строительных норм и правил, **«Исполнитель» принимает на себя возмещения стоимости недостатков, выявленных при строительстве объекта в данной проектной документации;**

2.2. «Исполнитель» не вправе передавать исполненную по договору работу третьим лицам без согласия «Заказчика».

2.3. «Заказчика» обязан:

- оплатить «Исполнителю» установленную и согласованную с «Исполнителем» цену в порядке и на условиях, предусмотренных данным договором;
- оказывать содействие «Исполнителю» в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;
- использовать выполненные работы на цели, предусмотренные договором;

III. Стоимость работы и порядок расчётов.

3.1. Стоимость работ, выполняемых «Исполнителем» по настоящему договору, составляет – 33 200 000 сўм (Тридцать три миллиона двести тысяча сўм), без НДС (в т.ч.; за ПСД, Авторский надзор, Госэкспертиза, проект ЗВОС, Экологическая экспертиза, АПЗ, Изыскание)

3.2. Предоплату в размере 30 % от стоимости данного договора «Заказчик» перечисляет «Исполнителю» после регистрации договора в управлении Казначейства

при Минфине Республики Узбекистан и после поступления целевых денежных средств от «Заказчика», «Исполнитель» приступает к исполнению п.2.1 данного договора.

3.3. Промежуточные платежи 50% и 20% «Заказчик» производит по счетам «Исполнителя» на основании актов, составляемых сторонами по мере готовности отдельных этапов работы, после поступления целевых денежных средств «Заказчика».

IV. Порядок сдачи и приемки работ.

4.1. Приемка и оценка выполненных работ определяется в соответствии с требованиями задания на проектирование и заключения «Госэкспертизы».

4.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче «Исполнителем» «Заказчику» на отдельных этапах выполнения, определяется заданием на проектирование.

4.3. При завершении работ «Исполнитель» представляет «Заказчику» акт предварительной сдачи-приемки работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренного заданием на проектирование.

4.4. «Заказчик» обязуется предварительно принять работу в течении 7 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки работ, указанных в пункте 4.2 настоящего договора и направляет «Исполнителю» подписанный акт приемки-сдачи, или в этот же срок дает мотивированный отказ в приеме работ в письменной форме.

4.5. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.6. В случае задержки «Исполнителем» выдачи проектно-сметную документацию против прилагаемого к данному договору графика, а так же продление срока окончательной выдачи проектно-сметной документации, связанного с доработкой этой документации по замечаниям «Заказчика», «Госэкспертизы» и «Комплексной экспертизы», «Исполнитель» **уплачивает «Заказчику» штраф в размере-0,5 процента от всей стоимости этого договора или «этапа», за каждый день просрочки, но не более 50% от договорной стоимости;**

4.7. Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, стороны обязаны в 5-дневный срок известить стороны о приостановлении работ и в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ, с составлением обоюдного акта «О приостановлении работ» с учетом суммы выполненных работ, для последующего расчета. В случае прекращения работ для сторон наступают последствия и ответственность, в соответствии с действующим Законодательством Республики Узбекистан.

4.8. Датой для наступления взаимных расчетов считается момент письменного извещения одной из сторон о прекращении работ, предусмотренных настоящим договором.

4.9. Если во время выполнения работы «Заказчик» или «Исполнитель» найдут необходимым заменить один вид работы другим, то такая замена допускается по письменному соглашению между сторонами в пределах суммы данного договора, с мотивированием необходимой замены, как дополнение к Заданию на проектирование, его переутверждение, с составлением дополнительного соглашения к данному договору.

V. Порядок разрешения споров.

5.0. Все спорные вопросы, связанные с исполнением обязательств по данному договору, решаются путём переговоров между сторонами. Претензионный порядок рассмотрения спора является обязательным для сторон, при этом для рассмотрения претензий отводится 30 (тридцать) календарных рабочих дней с момента получения (вручения) претензии.

5.1. Любые споры между сторонами, не разрешенные по взаимному согласию сторон, разрешаются Экономическим судом по месту нахождения ответчика.

VI. Дополнительные условия.

6.1. «Исполнитель» обязан заблаговременно уведомить «Заказчика» о возможном обоснованном и мотивированном мотивированном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до письменного получения согласия «Заказчика» на их продолжение.

6.2. В необходимых случаях стороны, в развитие и уточнения договора заключают дополнительные соглашения.

6.3. «Исполнитель» имеет право по своему усмотрению привлекать в порядке субподряда третьих лиц к исполнению до 20% работ, предусмотренных настоящим договором.

6.4. Все расходы по освоению результатов Задания на проректирование, оплачиваются непосредственно «Заказчиком», в установленном порядке «Исполнителю» по данному договору.

VII. Прочие условия.

7.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.

7.2. Все исправления по тексту настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном удостоверении Руководителями сторон в каждом отдельном случае в письменной форме.

VIII. Срок действия договора.

8.1. Срок действия настоящего договора устанавливается со дня перечисления аванса.

8.2. Работа считается выполненной после подписания акта приемки-сдачи работы «Заказчику» или его письменно уполномоченным представителем.

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его регистрации в Казначейских подразделениях и действует до 31 декабря 2022 года.

IX. Форс-мажор.

9.1. Ни одна из сторон, не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязанностей, принятых по настоящему договору, если неисполнение, либо частичное неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств: как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, общественные беспорядки, карантин, а также решений законодательных, исполнительных и судебных органов власти и управления, возникших после заключения настоящего договора.

9.2. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

X. Приложение к настоящему договору.

10.1. Смета выполняемой работы с обоснованием ее цены.

10.2. Протокол соглашения о договорной цене.

10.3. График выполнения работ.

XI. Адреса и расчётный счёт сторон.

ЗАКАЗЧИК:

«Инжиниринговая компания» СЕЗ СМ РК

г. Нукус улица Х.Улыкпана дом №59А
телефоны: 224-12-42, 224-14-38;
ИНН: 204801205 ОКЭД: 64200
Казначейства Республики Узбекистан
Л-с 301121866354017063201110172
Центральный банк город Ташкент
ИНН: 201122919 МФО: 00014



[Handwritten signature]
М.П.

Исмаилов П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО "АРХ-ENGINEERS GROUP"

г. Нукус ул. А. Досназаров дом 26 кв 8
телефон: (94) 141-69-98; (91)380-89-90
Р/с 20208000505331992001
Инфин банк г. Нукус
МФО 01139, ИНН 308115174
ОКЭД: 41100



Директор

М.П.

Кадиров А.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Настоящий договор соответствует требованиям Гражданского Кодекса и Закона Республики Узбекистан «О договорной правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

Юрист

[Handwritten signature]

«УТВЕРЖДАЮ»

Инжиниринговая компания Службы
Единого Заказчика Совета Министров
Республики Каракалпакстан

М. Утемуратов



«16» 05 2022- год

ПРОТОКОЛ № 45

Заседание конкурсной комиссии по выбору проектной организации для разработки рабочего проекта по объекту; «Нукус тумани "Актерек" МФЙ марказига ичимлик сув тармоқларини янгидан қуриш ва сувни чучуклантирувчи станциясини янгидан қуриш»

2022-год «16» 05

город Нукус

Участники:

Председатель комиссии:

П.Исмаилов

-Первый заместитель директора
«Инжиниринговой компании» СЕЗ СМ
РК

Члены комиссии:

Г.Утарова

-Начальник отдела, хозяйственно-
договорных отношений

О.Нурымбетов

-Начальник отдела управление
проектами и технического
сопровождение строительства

Р. Ибрагимов

-Начальник Проектно-изыскательского
отдела

К.Сапаров

-Начальник отдела маркетинга ИК СЕЗ
СМ РК

Секретарь комиссии:

О.Фокина

- специалист отдела ПИР

(К.Сапаров-отсутствует по
уважительной причине).

ПОВЕСТКА ДНЯ

Начальник отдела ПИР Инжиниринговой компании Совета Министров Республики Каракалпакстан Р. Ибрагимов, все члены конкурсной комиссии присутствовали, кворум соблюден, все необходимые условия для проведения тендера были соблюдены .

Секретарю конкурсной комиссии предоставить конкурсной комиссии следующую информацию. Было отмечено, о том что, в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 22 апреля 2021 года №ЗРУ-684 «О государственных закупках» на специальном информационном портале ([Etender.uzex.uz.](http://Etender.uzex.uz)) по статье 58 было размещено объявление о проведении тендера по Протоколу за № 79074 от 5 мая 2022 года за 2 (два) рабочих дней до истечения срока подачи заявок на участие в тендере не поступало.

Принимая во внимание требования Положения Республики Узбекистан «О проведении тендера» и указанную выше информацию, Конкурсная комиссия

РЕШИЛА :

1. Для проведения тендера по качественной подготовке на разработку проектно-сметной документации по объекту: **Нукус тумани "Ақтерек" МФЙ марказига ичимлик сув тармоқларини янгидан қуриш ва сувни чуқуклантирувчи станциясини янгидан қуриш»** в проведенном тендере были найдены лучшие условия. **МЧЖ " ARX-ENGINEERS GROUP»** на сумму 33 200 000 сум для заключения договора (контракта) на разработку данного объекта проектной документации.

2. Определить альтернативном исполнителем данного объекта **МЧЖ «"TAZA SUV»** на разработку данного объекта проектной документации.

3. В соответствии закона срок рассмотрения и оценки предложений участников отбора не может превышать десяти рабочих дней с момента окончания подачи предложений.

4. Начальник отдела ПИР Р.Ибрагимов данный Протокол в день его оформления размещает государственным заказчиком для обсуждения на три рабочих дня в электронной системе государственных закупок..

5. Фокина О.К. секретарю конкурсной комиссии обеспечить доступ к порталу участникам необходимых для данного конкурса, в установленном порядке.

Прдседатель комиссии:

Члены комиссии

П.Исмаилов

Г.Утарова

О.Нурымбетов

Р. Ибрагимов

К.Сапаров

Секретарь

О.Фокина

Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 79074 на приобретение Нукус тумани "Ақтерек" МФЙ марказига ичимлик сув тармоқларини янгидан қуриш ва сувни чучуклантирувчи станциясини янгидан қуриш.

Способ проведения электронный

Дата 11.05.2022

Время рассмотрения 11.05.2022 14:10

Конкурсная комиссия Инжиниринговая компания службы единого заказчика Совета Министров Республики Каракалпакстан, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Главный инженер	1
Секретарь комиссии	FOKINA WOLGA KONSTANTINOVNA	специалист	6
Член комиссии	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	Отдел кадров	5
Член комиссии	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Начальник отдела	4
Член комиссии	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	Главный специалист	3
Член комиссии	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	главный бухгалтер	2

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 11.05.2022 года № лота 79074.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 60.00 / Весовой коэф. ценовой части: 40.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Нукус тумани "Ақтерек" МФЙ марказига ичимлик сув тармоқларини янгидан қуриш ва сувни чучуклантирувчи станциясини янгидан қуриш.
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	48 138 000.00
Стартовая сумма	48 138 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Общая информация о конкурсантке

Тип: Текстовое значение

Описание: Общие сведения об участнике торгов (аттестат, лицензия, устав, 2-3 разряд, количество работников 15, копия паспорта работника, диплом и ордена, перечень основных средств, в т.ч. оргтехники и т.д.) Единая национальная система труда my.mehnat С QR-кодом,

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ARX-ENGINEERS GROUP MCHJ	40	Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар	40	Экспертная		
"TAZA SUV" mas`uliyati cheklangan jamiyati	40	1	40	Экспертная		

Критерий №2 Последний годовой баланс и финансовый отчет

Тип: Текстовое значение

Описание: Копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за последний год, справка из налоговой об отсутствии задолженности, справка из банка о финансовом состоянии

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ARX-ENGINEERS GROUP MCHJ	35	Танлов иштирокчисининг молиявий натижалари ҳисоботи	35	Экспертная		
"TAZA SUV" mas`uliyati cheklangan jamiyati	35	3	35	Экспертная		

Критерий №3 опыт работы в последние годы на объектах, аналогичных выбранному объекту

Тип: Текстовое значение

Описание: Список объектов (с подтверждающими документами)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ARX-ENGINEERS GROUP MCHJ	25	Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охириги йилларда иш тажрибаси	25	Экспертная		
"TAZA SUV" mas`uliyati cheklangan jamiyati	25	2	25	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"TAZA SUV" mas`uliyati cheklangan jamiyati	48 138 000.00	35 138 000.00	30.04.2022 15:39:41	37.79
ARX-ENGINEERS GROUP MCHJ	48 138 000.00	33 200 000.00	29.04.2022 17:07:26	40.00

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"TAZA SUV" mas`uliyati cheklangan jamiyati	60	37.79	97.79
ARX-ENGINEERS GROUP MCHJ	60	40	100

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 79074 от 11.05.2022 года на приобретение Нукус тумани "Ақтерек" МФЙ марказига ичимлик сув тармоқларини янгидан куриш ва сувни чучуклантирувчи станциясини янгидан куриш. определила победителем:

ARX-ENGINEERS GROUP MCHJ
308115174

и резервный исполнитель: "TAZA SUV" mas`uliyati cheklangan jamiyati (203881155)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	Согласен	
Член комиссии	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Согласен	
Член комиссии	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



ҚР ВК ЯБХ "Инженнинг компания" сн буюртмачилигида Молия вазирлиги хузуридаги Сув таъминати ва каналлация тизимларини қуриш жамгармаси ҳисобидан "Обод қишлоқ" ва "Обод маҳалла" ичимлик сув таъминати тизимларини яхшилаш ишларининг 2022 йил учун

МАНЗИЛЛИ РУЙХАТИ


(Асос: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сон қарори)

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланг ва фойдаланишга топширилган	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосда жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари)	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга хисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.21 й. ҳолатига объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйималар лойиҳаси шу жумладан				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга хисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга хисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳудудаси рақами ва санаеси	Тендер (танлов)лар натижаси рақами ва санаеси	Қурилиш гуҳудат ташкилот номи		
							Жами капитал қўйималар	Қурилиш монтаж ишлари	Жилоз	Буюртмачи бошқа харажатлари	Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси							
1	Объектлар номи ва манзили Ичимлик сув таъминоти ТЕННИНИ ЯХШИЛАШ БУЙНЧА ЖАМИ	км объект	238,6 км 18 объект	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига йилдан йилга хисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.21 й. ҳолатига объектнинг қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Жами капитал қўйималар	Қурилиш монтаж ишлари	Жилоз	Буюртмачи бошқа харажатлари	Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга хисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга хисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	17	18	19	тендер	
1	Амударё тумани "Авжи" ОФЙ худудига сувни чучуқлангирувчи станциясини янгидан қуриш.	2022й	2 объект				1 000,000	954,304		45,696									тендер
	шу жумладан ЛҚИ учун									20,000									
2	Амударё тумани "Тулқин" ОФЙ худудига сувни чучуқлангирувчи станциясини янгидан қуриш.	2022й	4 объект				2 000,000	1 909,685		90,315									тендер
	шу жумладан ЛҚИ учун									48,000									
3	Беруний тумани "Бўстон" МФЙ Ёшлик аҳоли манзилга ичимлик сув тармоқларини янгидан қуриш.	2022й	9,1 км				1 899,000	1 811,902		87,098									тендер
	шу жумладан ЛҚИ учун									41,773									
4	Беруний тумани "Палваш" МФЙ Хирли капыа ва Шодлик овулларига ичимлик сув тармоқларини янгидан қуриш.	2022й	8 км				1 680,000	1 604,162		75,838									тендер
	шу жумладан ЛҚИ учун									35,280									
5	Бўзатов тумани "Қусқантов" ОФЙ худудигаги Еркин ва Уйғирқул овулга ичимлик сув тармоқларини ва Дობал овулга сувни чучуқлангирувчи станциясини янгидан қуриш.	2022й	3,6 км 1 объект				1 292,000	1 233,313		58,687									тендер
	шу жумладан ЛҚИ учун									23,256									
6	Қондиқул тумани "Наврўз" ОФЙ худуди Ахун овулдаги ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш ва янгидан қуриш.	2022й	15,8 км				2 844,000	2 715,457		128,543									тендер
	шу жумладан ЛҚИ учун									59,724									

(млн.сум, жорий нархда)

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланғич ва фойдаланишга топширилган йили	Лойiha қуравати	Объектнинг умумий қиймати (шахона ва оқша қаражатлари) бўртмачи бошқа қаражатлари	01.01.22 й. ҳолатига нисбатан қийметини қўлга киритган бўртмачи бошқа қаражатлари	01.01.22 й. ҳолатига нисбатан қийметини қўлга киритган бўртмачи бошқа қаражатлари	01.01.21 й. ҳолатига нисбатан қийметини қўлга киритган бўртмачи бошқа қаражатлари	2022 йил учун капитал қўйималар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига нисбатан қийметини қўлга киритган бўртмачи бошқа қаражатлари	01.01.23 й. ҳолатига нисбатан қийметини қўлга киритган бўртмачи бошқа қаражатлари	17	18	Қурилиш гуҳрат ташқилог номи							
								Жами капитал қўйималар	Қурилиш монтаж ишлари	Жихоз	Бўртмачи оқша қаражатлари	Муддат/ қуваат	Асосий фонд суммаси						8	9	10	11	12	13	14
7	Қонликўл тумани "Қонликўл" ШФЙ марказидаги ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022й	4,3 км					946,000	903,475			42,525						тендер							
8	Қораўзақ тумани "Есим" МФЙ худудига ичимлик сув тармоқларини янгидан қуриш. шу жумладан ЛҚИ учун	2022й	0,8 км					176,000	163,967			17,974						тендер							
9	Қораўзақ тумани "А.Доғназаров" МФЙ худудига "Қарамоён" овулига ичимлик сув тармоқларини янгидан қуриш ва "Темирхан" аҳоли пунктига ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш ва янгидан қуриш ва суви чуқуқлангирувчи станциясини реконструкция қилиш.	2022й	12,9 км 1 объект					4 803,000	4 598,290			204,710						тендер							
10	Кегейли тумани "Жалпақ жап" МФЙ худудига Жалпақ жап. Айтке Күзисауле ва Салтқирқиншак овуқларига ичимлик сув тармоқларини торғиш ва Шериуши ва Бақен овуқларига суви чуқуқлангирувчи станциясини янгидан қуриш.	2022й	8,0 км 2 объект					2 900,000	2 769,550			130,450						тендер							
11	Кегейли тумани "Ақтуба" МФЙ худудига Бағман, Оғтеген овуқларига ичимлик сув тармоқларини янгидан қуриш ва Катаған овуқларига суви чуқуқлангирувчи станциясини янгидан қуриш.	2022й	3,8 км 1 объект					1 450,000	1 384,217			65,783						тендер							
12	Қунғирот тумани "Адебият" МФЙ худудига маркази, Тирсин, Бўстонлик ва Сият овуқларига ичимлик сув тармоқларини янгидан қуриш.	2022й	20,2 км					4 003,000	3 818,967			184,033						тендер							
13	Муйноқ тумани "Муйноқ" МФЙ худудига ичимлик сув тармоқларини янгидан қуриш ва реконструкция қилиш.	2022й	2,8 км					504,000	477,377			26,623						тендер							
14	Муйноқ тумани "Мадали" МФЙ Шеге овуқларига суви чуқуқлангирувчи станциясини янгидан қуриш.	2022й	1 объект					500,000	469,024			30,976						тендер							
	шу жумладан ЛҚИ учун											10,500													

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш бошланishi ва фойдаланишга тошириши йили	Локация куввати	Объектнинг умумий киймати (шартонома асосида жумладан, бюджетчи бошқа харajatлари)	01.01.22 й. ҳолатига объект қолдиқ киймати жумладан бюджетчи бошқа харajatлари	01.01.22 й. Ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ киймати жумладан, бюджетчи бошқа харajatлари	01.01.21 й. ҳолатига объектнинг қолдиқ киймати жумладан, бюджетчи бошқа харajatлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишга тошириладиган		01.01.23 й. Ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ киймати жумладан, бюджетчи бошқа харajatлари	01.01.23 й. Ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қолдиқ киймати жумладан, бюджетчи бошқа харajatлари	Экспертиза ҳужжатлари рақами ва санаси	Тендер (танлов) рақами ва санаси	Қурилиш бўлмат ташкilot номи	
								Жами капитал қўйилмалар	Қурилиш монтаж ишлари	Жилоз	Бюджетчи бошқа харajatлари	Муудат/ куваат	Асосий фонд суммаси						
																			8
15	Нукус тумани "Ақтөрек" МФЙ марказига ичимлик сув тармоқларини янгидан қуриш ва сувни чуқуқлангирувчи станциясини янгидан қуриш.	2022й	2,6 км 1 объект					1 050,000	1 001,862	48,138								19	тендер
16	шу жумладан ЛҚИ учун Тахиятош тумани "Найманқўл" МФЙ марказига ичимлик сув тармоғини, "Махрем" овулига сувни чуқуқлангирувчи станциясини янгидан қуриш ҳамда "Тахиятош-2" СТИ га насос ўрнатилиши.	2022й	1,6 км 2 объект				1 048,000	1 000,071	47,929										тендер
17	шу жумладан ЛҚИ учун Тахиятош тумани "Кенегес" МФЙ хулудидаги "Уйилин" овулига сувни чуқуқлангирувчи станциясини янгидан қуриши.	2022й	1 объект				500,000	469,034	30,966										тендер
18	шу жумладан ЛҚИ учун Тахтакуш тумани "Маржанқўл" МФЙ марказига ичимлик сув тармоқларини янгидан қуриши.	2022й	1,7 км				425,000	402,842	22,158										тендер
19	шу жумладан ЛҚИ учун Тўртқўл тумани "Ўзбекистон" МФЙ хулудига ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш ва янгидан қуриш ҳамда СТИ реконструкция қилиши	2022й	12,8 км 1 объект				5 316,000	5 090,186	225,814										тендер
20	шу жумладан ЛҚИ учун Тўртқўл тумани "Окчамши" МФЙ хулудига ичимлик сув тармоқларини янгидан қуриши.	2022й	13,9 км				1 966,000	1 876,572	89,428										тендер
21	шу жумладан ЛҚИ учун Хўжайли тумани "Бунёдкор" МФЙ хулудидаги ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиши.	2022й	4,8 км				1 056,000	1 008,013	47,987										тендер
22	шу жумладан ЛҚИ учун Хўжайли тумани "Нурлы жол" МФЙ хулудидаги ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиши.	2022й	5,5 км				1 210,000	1 154,474	55,526										тендер
	шу жумладан ЛҚИ учун								25,410										

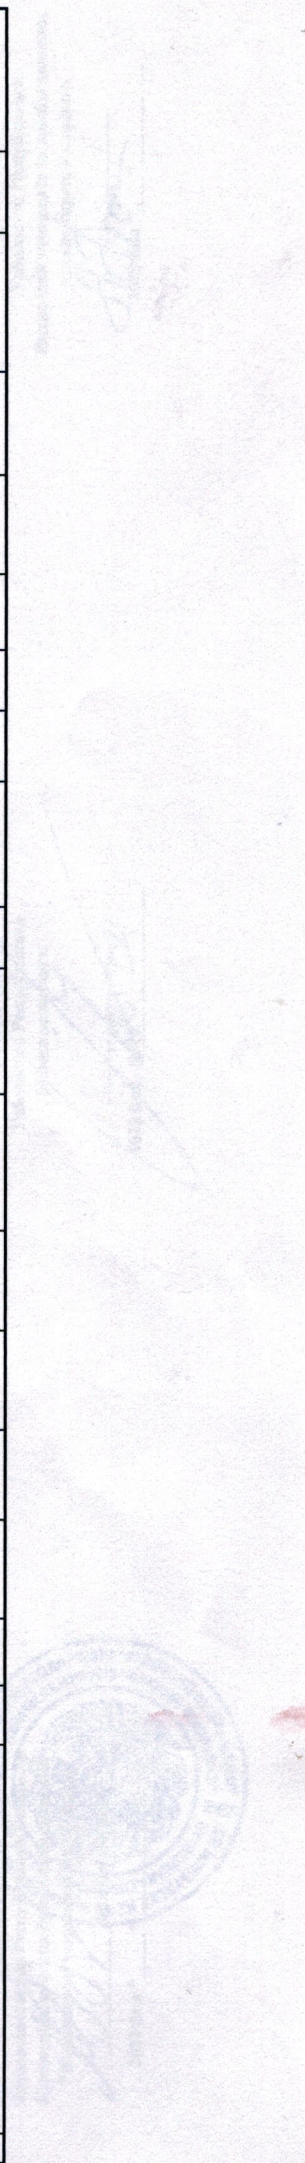

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва фойдаланишга топширилган йили	Лоика кўрамини	Объектнинг умумий қиймати (шарҳнома асосида жумладан, бўғортамчи бошқа харajatлари)	01.01.22 й. ҳолатига объект қолиқ қиймати жумладан бўғортамчи бошқа харajatлари	01.01.22 й. ҳолатига йилга ўтувчи объектнинг қолиқ қиймати, бўғортамчи бошқа харajatлари	01.01.21 й. ҳолатига объектнинг қолиқ қиймати жумладан бўғортамчи бошқа харajatлари	2022 йил учун капитал қўйималар лимити шу жумладан					2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилга ўтувчи объектнинг (кайта инсoбатш қиймати) қолиқ қиймати жумладан, бўғортамчи бошқа харajatлари	Экспертна ҳисoблар рақами ва санаси	Теңдер (танлов)лар рақами ва санаси	Қурилиш гуҳарат ташкелот номи	
								Жами капитал қўйималар	Қурилиш монтаж ишлари	Жилоз	Бўғортамчи бошқа харajatлари	Жами	Мулат/ қуваат	Асосий фонд суммаси					
23	Чамбой тумани "Майжап" ОФЙ ҳудудига ичимлик сув тармоқлари янгидан қуриш ва сувни чўчуқлантурувчи станциясини реконструкция қилиш	2022й	12,6км 1 объект					8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	шу жумладан ЛҚИ учун							5 048,000	4 832,966		215,034								теңдер
24	Чамбой тумани "Абат макан" МФЙ ҳудудига ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш ва янгидан қуриш.	2022й	13,8 км					3 264,000	3 117,119		146,881								теңдер
	шу жумладан ЛҚИ учун										75,072								теңдер
25	Шуманай тумани "Ажжап" ОФЙ ҳудудига "Қосжап" а.я. пунктга ичимлик сув тармоқларини янгидан қуриш.	2022й	9,2 км					2 172,000	2 072,682		99,318								теңдер
	шу жумладан ЛҚИ учун										49,956								теңдер
26	Шуманай тумани "Қарабайил" МФЙ ҳудудига "Жана бағ" аҳоли пунктга ичимлик сув тармоқларини янгидан қуриш.	2022й	5 км					1 250,000	1 193,815		56,185								теңдер
	шу жумладан ЛҚИ учун										26,250								теңдер
27	Элликкальа тумани "Гулистон" ОФЙ ҳудудига ичимлик сув тармоқларини янгидан қуриш.	2022й	20,8 км					4 367,000	4 177,256		189,744								теңдер
	шу жумладан ЛҚИ учун										91,722								теңдер
28	Элликкальа тумани "Навоий" ОФЙ ҳудудига ичимлик сув тармоқларини янгидан қуриш.	2022й	19,6 км					4 056,000	3 879,052		176,948								теңдер
	шу жумладан ЛҚИ учун										85,166								теңдер
29	Нукус шаҳар "Жеке терек" МФЙ ҳудудига ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш ва янгидан қуриш	2022й	19,5 км					3 687,000	3 519,504		167,496								теңдер
	шу жумладан ЛҚИ учун										81,118								теңдер
30	Нукус шаҳри "Қутлы макан" МФЙ ҳудудига ичимлик сув тармоқларини реконструкция қилиш	2022й	5,9 км					1 145,000	1 093,459		51,541								теңдер
	шу жумладан ЛҚИ учун										21,758								теңдер



"Қелишилди"
Ўзбекистон Республикаси
Моллия вазирлиги

2022 йил " 23 " _____

"Қелишилди"
Ўзбекистон Республикаси
Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни
қисқарттириш вазирлиги

2022 йил " 23 " _____

3869490



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"ARX-ENGINEERS GROUP" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"ARX-ENGINEERS GROUP" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

25.01.2021

940816

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

308115174

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Qoraqalpog`iston Respublikasi, Nukus shahri, A.Dosnazarov ko'chasi 26 uy 8
xonadon,

Guvohnoma:

Qoraqalpog`iston Respublikasi, Nukus shahri, DAVLAT
XIZMATLARI MARKAZI

to'monidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):

