

“Toshkent shahar mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati” DUK (keyingi o'rinlarda Buyurtmachi) nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor O.Abdunazarov bir tomondan va "RAVON LOYIHA LUX" MCHJ (keyingi o'rinlarda Bajaruvchi) nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor X.Abdullayev ikkinchi tomondan, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 2021 yil 19 noyabrdagi №PQ-702 sonli qarori bo'yicha maxalliy budjet mablag'lari xisobidan joriy ta'mirlash bo'yicha loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish va ijobiy ekspertiza xulosasini olish ishlarini bajarishga doir amaldagi O'zbekiston Respublikasining 2021 yil 22 apreldagi “Davlat xaridlari to'g'risida”gi 684-sonli qonuniga asosan xarid.uzex.uz maxsus axborot portal orqali (Lot raqami 74478) e'lon qilingan va “Toshkent shahar mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati” DUK xarid komissiyasining 2022 yil 30 apreldagi bayonnomasiga asosan quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. Shartnoma predmeti va muddati.

1.1. Bajaruvchi Bektemir tumani "Yangixayot" MFY Bog'ieram tepa ko'chasi joriy ta'mirlash loyiha-smeta xujjatlarini ishlab chiqish va ekspertiza xulosasini olish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini oladi.

1.2. Bajaruvchi loyiha-smeta xujjatlari ishlarini O'zbekiston Respublikasida belgilangan huquq va qonun talablariga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Bajaruvchi shartnoma bo'yicha loyiha-smeta xujjatlarini ishlab chiqadi, shu jumladan uchinchi shaxsni yollagan xolda belgilangan tartibda loyiha-smeta xujjatlarini davlat ekspertizasidan o'tkazadi.

1.4. Bajaruvchi loyiha-smeta hujjatlarini Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan birlamchi ma'lumotlar asosida shartnoma va O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi xuzuridagi Respublika G'aznachiligi yoki uning xududiy boshqarmalarida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab shartnomaning 2-ilovasi “Bajarish va moliyalashtirish jadvali”da belgilangan muddatlarda bajaradi.

1.5. Bajaruvchi loyiha-smeta xujjatlari ishlari bo'yicha davlat va zarur bo'lganda boshqa tegishli ekspertiza xulosasini olgandan so'ng, ishlarni bajarish muddati davrida 3 (uch) nusxada mazkur loyiha va qidiruv ishlari xujjatlarini Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

1.6. Ish jarayonida kelishilgan asosiy loyihaviy yechimlarni buyurtmachiga topshiriladi.

2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari.

2.1. Shartnomaning bahosi shartnoma taraflarining kelishuvi (1-ilova)ga asosan QQS bilan **1 811 678,40 (bir million sakkiz yuz o'n bir ming olti yuz yetmish sakkiz 40 tiyn.)** so'mni tashkil etadi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi “Bajarish va moliyalashtirish jadvali”ga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi Respublika G'aznachiligi yoki uning xududiy boshqarmalarida ro'yxatdan o'tgandan so'ng 5 kun mobaynida shartnoma bahosining 30 foiz miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Shartnoma bo'yicha qolgan mablag', Bajaruvchi loyiha-smeta xujjatlari ishlari davlat va zarur bo'lganda boshqa tegishli ekspertizasi xulosasini olib, Buyurtmachiga taqdim etgandan so'ng, topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, 15 kun mobaynida dastlab to'langan avans mablag'i (shartnoma bahosining 30 foizi miqdorida) ushlab qolib, Buyurtmachi tomonidan qabul qilingan hisob-faktura (schyot-fakturaga asosan) moliyalashtiriladi.

2.4. Shartnomaning bahosi uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

- ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;
- ishlar hajmi Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

Dastlabki hisoblangan smeta hujjatlariga ekspertiza xulosasi olingandan so'ng, loyiha-smeta hujjatlari bahosi (mahalliy byudjetdan moliyalashtirilganda Toshkent shahar moliya boshqarmasi) Toshkent shahar va tuman (shahar) xalq deputatlari qarorlariga yoki Moliya Vazirligi tomonidan tasdiqlangan manzilli ro'yxatga asosan Buyurtmachi va Bajaruvchi roziligi bilan zaruratga ko'ra ushbu shartnomaga qo'shimcha kelishuv imzolash yo'li bilan o'zgartirish kiritish mumkin.

3. Tomonlar majburiyatlari.

3.1. Buyurtmachi barcha ishlar bajarilib bo'lingandan keyin belgilangan narxning hammasini Bajaruvchiga to'lashi yoki ishlarining ayrim bosqichlari tugatilganidan keyin narxning tegishli kismini to'lashi, tayyorlangan loyiha-smeta xujjatlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan Buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan davo yuzasidan ishda qatnashishiga Bajaruvchini jalb qilishi shart.

3.2. Buyurtmachi **ishlarni amalga oshirish** uchun zarur bo'lgan, o'rnatilgan tartibda rasmiylashtirilgan birlamchi ma'lumotlarni (nuqsonlar **qaydnomasi** yoki ijro hujjatlari, pudrat tashkilotining o'rtacha ish haqi, ishlatiladigan mashinalar, mexanizmlar va **texnik ko'rsatkichlarga** ega transport vositalari, ularning ishlash xarajatlari ko'rsatkichlari, pudratchining boshqa **xarajatlarini**) taqdim qiladi.

3.3. Bajaruvchi Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan birlamchi ma'lumotlarni 10 (o'n) ish kuni moboynda o'rganib chiqishi **hamda berilgan** ma'lumotlarda kamchiliklar aniqlansa Buyurtmachiga ma'lum qilishni o'z zimmasiga oladi.

Agar Bajaruvchi Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan birlamchi malumotlarda aniqlangan kamchiliklarni, 10 (o'n) ish kuni **muddat** ichida Buyurtmachiga ma'lum qilmasa, ma'lumotlar qabul qilingan deb xisoblanadi va bunday xolat Bajaruvchi ishlarini bajarish muddatini o'zgartirishga asos bo'la olmaydi.

3.4. Bajaruvchi loyiha-smeta ishlaridagi kamchiliklar uchun, shu jumladan keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek **tayyorlangan** loyiha-smeta xujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan obyekt **ni ishlatish** jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Agar loyiha-smeta xujjatlari yordamchi tashkilotlar tomonidan ishlab chiqilgan bo'lsa kamchiliklar aniqlangan taqdirda Bajaruvchi, yordamchi tashkilot bilan **birga ishlab** chiqilgan loyiha-smeta xujjatlari uchun to'liq javob beradi va Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta **xujjatlarini** bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha ishlarni bajarishi shart.

3.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaqtida o'tkazilmagan xolda yoki dastlabki ma'lumotlarni **taqdim** qilish kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yoxud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

3.6. Bajaruvchi loyihaning asosiy yechimlarini Buyurtmachi bilan birgalikda tegishli idoralar va tashkilotlar bilan kelishiladi.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi.

4.1. Loyiha-smeta xujjatlari ishlari bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Bajaruvchi Buyurtmachiga ishlarni topshirish - qabul qilish dalolatnomasi bilan loyihalash uchun topshiriqda ko'zda tutilgan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.2. Buyurtmachi ishlarni topshirish - qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.1- bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 (o'n) kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Bajaruvchiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

Agar Buyurtmachi ishlarni qabul qilgan kundan boshlab 10 (o'n) kun muddat ichida Bajaruvchiga kamchiliklar ko'rsatilgan ishlarni qabul qilmaslik rad javobini yubormasa, ishlar qabul qilingan hisoblanadi va bunday holatda Buyurtmachi ishlarni topshirish-qabul qilish dalolatnomasini imzolab, bir nusxasini Bajaruvchiga qaytarishi shart.

4.3. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.4. Agar loyiha-smeta xujjatlari ishlarini bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun mobaynida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart.

4.5. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga loyiha-smeta xujjatlari bo'yicha xulosa uchun murojat qilishi mumkin.

5. Korrupsiyaga qarshi shart

5.1. Tomonlar:

Tomonlar, ularning afillangan (o'zaro bog'langan) shaxslari va xodimlari, ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishlari davomida korrupsiyaga qarshi kurashish soxasidagi O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonun xujjatlari talablarining buzulishiga olib kelinadigan va/yoki korrupsiya xarakteriga ega bo'lgan, shu jumladan (ammo bu bilan cheklanmay) pora berish yoki berishni vada qilish, ta'magirlik, pora olishga bevosita yoki bilvosita rozi bo'lish xatti xarakatlari/xarakatsizliklarini sodir etmaydilar.

Tomonlar, ularning afillangan (o'zaro bog'langan) shaxslari va xodimlari boshqa tomonning xodimlari yoki vakolatlangan vakillarini qandaydir tarzda rag'batlantirishdan, shu jumladan pul summolari, sovg'alarni taqdim etish, ularning manziliga xizmatlarini beg'araz ko'rsatish yoki bu xodim yoki vakolatlangan vakil tomonidan uni rag'batlantiruvchi tomon foydasiga qandaydir xatti xarakatlarni/ xarakatsizliklar bajarilishini ta'minlashga qaratilgan ishlarni bajarishdan vos kechadilar deb ma'lum qiladilar.

5.2.. Tomonlar ushbu ilovaning 5.1 bandidagi talablarni buzish sodir etilganligi yoki sodir etilishi mumkinligi to'g'risidagi shubxalar yuzaga kelgan holda, tegishli tomon bu haqda ikkinchi tomonni xabardor qilish, korrupsiya bilan kurashish soxasidagi O'zbekiston Respublikasi qonun xujjatlarining normalari buzilganligi faktining rad etib bo'lmaydigan dalillari mavjud bo'lgan holda esa amaldagi qonun xujjatlarida belgilangan tartibda vakolatlangan organlarni ham habardor qilish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

6. Konfidentsial ma'lumotlarni himoyalash.

6.1. Loyiha-smeta xujjatlari ishlarining bajarilishi davrida Bajaruvchi o'zi konfidentsial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

7. Nizolarni xal etish.

7.1. Shartnoma amal qilish davomida yuzaga keladigan nizolarni taraflar o'zaro muzokara yo'li bilan hal etadi. Muzokara natijasida kelishuvga kelinmagan taqdirda nizolar taraflar tomonidan Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudiga da'vo arizasi berish va ishni sudga ko'rib chiqilishi natijasida hal qilinadi.

8. Shartnomani o'zgartirish va bekor qilish.

8.1. Mazkur shartnomaga qo'shimcha bitim ko'rinishidagi o'zgartirish va qo'shimchalar yozma ravishda qilingan hamda tomonlar (yoki tomonlar nomidan vakillar) imzolagan holdagina G'aznachilikda ro'yxatdan o'tkazilganidan keyin yuridik kuchga ega bo'ladi.

8.2. Shartnoma taraflarning kelishuviga muvofiq o'zgartirilishi va bekor qilinishi mumkin. Shartnoma o'zgartirish yoki bekor qilish to'g'risidagi kelishuvi yozma shaklda amalga oshiriladi. Shartnomani bajarishdan bir tarafdama bosh tortishga yoki shartnomaning shartlarini bir tarafdama o'zgartirishga yo'l qo'yilmaydi.

8.3. Bir taraf shartnomani o'zgartirish yoki bekor qilish haqidagi taklifga ikkinchi tarafdan rad javobi olganidan keyingina shartnomani o'zgartirish yoki bekor qilish to'g'risidagi talabni sudga taqdim etishi mumkin.

9. Fors-major.

9.1. Fors-major vaziyatlari paydo bo'lishi munosabati bilan mazkur shartnomadagi tomonlar majburiyatlari butunlay bajarilmasa yoki qisman bajarilsa, majburiyatlarni bajarish muddatlari bunday vaziyatlar ta'sir etishi vaqtiga mutanosib ravishda uzaytiriladi.

10. Qo'shimcha shartlar.

10.1. Bajaruvchi Loyiha-smeta xujjatlari ishlarini muddatidan oldin bajarganida, Buyurtmachi uni Shartnomaning 4-bandiga asosan qabul qiladi va to'la to'lovni amalga oshiradi.

10.2. Bajaruvchi Shartnoma shartlarini bajarish uchun, Shartnomada belgilangan muddatlarga rioya qilinishini inobatga olgan holda hamda Buyurtmachi bilan kelishilgan xolda, yordamchi tashkilotlarni jalb qilishi mumkin.

10.3. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov va ishlarni topshirilganda shartlashilgan xaqi kechiktirilgan xar bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,1 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 20 foizidan oshmasligi lozim.

10.4. Bajaruvchi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Bajaruvchi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,1 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 20 foizidan oshmasligi lozim.

10.5. To'langan penya taraflarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

10.6. Shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi va har ikkala nusxasi ham bir xil yuridik kuchga ega bo'ladi.

10.7. Shartnoma 31.12.2022 yilga qadar amal qiladi.

10.8. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

1-ilova - Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi;

2-ilova - Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqishni bajarish va moliyalashtirish jadvali.

10. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

“Buyurtmachi”

“Bajaruvchi”

“Toshkent shahar mintaqaviy yo'llarga
buyurtmachi xizmati” DUK

“RAVON LOYIHA LUX” MCHJ

100000.Toshkent shahri, M.Ulug'bek tumani

Mustaqillik shoh ko'chasi 68-uy

Tel:237-57-08

Sh/x: 304521860262697045129118144

INN: 304 893 532 OKED: 71120

O'zbekiston Respublikasi Moliya

Vazirligi G'aznachiligining

Amaliyot Boshqarmasi

X/r: 2340 2000 3001 0000 1010

MFO: 00014 INN: 201129919

Sergeli tumani Sergeli-7,

Shokirariq ko'chasi 82-uy

Tel: (99897) 746-41-36

X/r: 20208000005160269001

“IPOTEKA-BANK” ATB

SIRGALIKH IALI

INN: 306 997 298

MFO: 00978

Direktor

O.Abdunazarov

Direktor

X.Abdullaev

2022-yil « 10 » 05 dagi
196/2022-sonli shartnomaga 1 - ilova

Shartnoma bahosini kelishuvi

B A Y O N N O M A S I

Biz, quyida imzo qo'yuvchilar: **Bektemir tumani "Yangixayot" MFY Bog'ieram tepa ko'chasi joriy ta'mirlash loyixa-smeta xujjatlarini ishlab chiqish va ekspertiza xulosasini olish bo'yicha 2022 yil "10" 05** dagi 196/2022-sonli shartnoma bahosi QQS bilan **1 811 678,40 (bir million sakkiz yuz o'n bir ming olti yuz yetmish sakkiz 40 tiyn.)** so'mni tashkil qiladi.

Ushbu bayonnoma Buyurtmachi va Bajaruvchi o'rtasida o'zaro hisob-kitoblarni amalga oshirish uchun asos hisoblanadi.

"Buyurtmachi"

"Toshkent shaharmintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK

100000.Toshkent shahri, M.Ulug'bek tumani
Mustaqillik shoh ko'chasi 68-uy
Tel:237-57-08
Sh/x: 304521860262697045129118144
INN: 304 893 532 OKED: 71120
O'zbekiston Respublikasi Moliya
Vazirligi G'aznachiligining
Amaliyot Boshqarmasi
x/r: 2340 2000 3001 0000 1010
MFO 00014 INN 201129919

Direktor

O.Abdunazarov

"Bajaruvchi"

"RAVON LOYIHA LUX" mas'uliyati cheklangan jamiyati

Toshkent shahri, Sergeli tumani,
Shokirariq ko'chasi 82-uy
Tel./faks: (99897) 746-41-36,
H/r: 2020 8000 0051 6026 9001
"Ipoteka-bank" ATIB
Sergeli filiali
MFO: 00978 INN: 306 997 298
QQS kodi: 326070177845

Direktor

X.Abdullayev

2022-yil « 10 » 05 dagi
196/2022-sonli shartnomaga 2- ilova

Bektemir tumani "Yangixayot" MFY Bog'ieram tepa ko'chasi joriy ta'mirlash loyixa-smeta xujjatlarini
ishlab chiqish va ekspertiza xulosasini olish

BAJARISH VA MOLIYALASHTIRISH JADVALI

so'm

№	Bajariladigan ishlarning nomi	Qiymati	Bajarish		Moliyalashtirish muddati
			muddati	qiymati	2022 yil
	Avans miqdori				543 503
1	Loyixa-smeta xujjatlarini ishlab chiqish va ijobiy ekspertiza xulosasini olish	1 811678,40	Shartnoma imzolangan kundan boshlab 7 kun	1 811678,40	1 268 175,40
	Jami:	1 811678,40		1 811678,40	1 811678,40

*-Belgilangan muddat shartnoma tegishli G'aznachilik amaliyot boshqarmasidan ro'yxatdan o'tgandan kundan boshlab hisoblanadi.

Buyurtmachi



Bajaruvchi



“ТАСДИКЛАЙМАН”
“Тошкент шаҳар минтақавий йўлларга
буюртмачи хизмати” ДУК директори, комиссия раиси
О.Абдуназаров



“Тошкент шаҳар минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК жорий таъмирлаш ишлари бўйича лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиш бўйича хизмат кўрсатувчи ташкилотлар ўртасида танлов ўтказиш бўйича комиссия йиғилиши

БАЁННОМА СИ № 3

Тошкент ш.

2022 йил “ 9 ” 05

Иштирок этилар:

Комиссия раиси:	“Тошкент шаҳар минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК директори	О.Абдуназаров
Комиссия аъзолари:	“Тошкент шаҳар минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК бош муҳандиси	М.Сирожиддинов
	Лойиҳа таъминоти бўлими бошлиғи	Б.Ибрагимов
	Ишлаб чиқариш техник бўлими бошлиғи	Н.Юсупов
	Техник кузатиш ва бажарилган ишларни қабул қилиш бўлими бош мутахассиси	С.Икромхўжаев
	Молия-иқтисод бўлими бошлиғи	Ж.Искандаров
	Гендерларни ташкил этиш ва шартномалар бўлими бош мутахассиси	С.Аббосов

КУН ТАРТИБИ:

“Тошкент шаҳар минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” ДУК жорий таъмирлаш ишлари бўйича лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиш бўйича

(О.Абдуназаров, М.Сирожиддинов, Ж.Искандаров, С.Икромхўжаев, Н.Юсупов, Б.Ибрагимов, С.Аббосов)

ТШМЙБХ ДУК 2022 йил 20 апрелида Ўзбекистон Республикаси товар ва хом-ашё биржасининг электрон порталига жорий таъмирлаш ишлари бўйича лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиш бўйича 75353, 75001, 74959, 74942, 74939, 74936, 74932, 74930, 74928, 74927, 74926, 74890, 74888, 74885, 74882, 74880, 74877, 74876, 74874, 74873, 74872, 74871, 74870, 74869, 74868, 74866, 74865, 74863,

74862, 74861, 74860, 74858, 74857, 74856, 74855, 74850, 74849, 74848, 74847, 74845, 74844, 74843, 74841, 74839, 74837, 74834, 74833, 74832, 74830, 74829, 74827, 74826, 74824, 74821, 74820, 74817, 74816, 74814, 74811, 74809, 74808, 74804, 74803, 74802, 74801, 74800, 74799, 74797, 74796, 74794, 74793, 74792, 74789, 74788, 74787, 74785, 74783, 74782, 74779, 74778, 74776, 74775, 74773, 74772, 74771, 74770, 74766, 74765, 74763, 74762, 74761, 74760, 74759, 74758, 74756, 74755, 74752, 74751, 74750, 74749, 74748, 74746, 74743, 74742, 74741, 74738, 74736, 74735, 74734, 74732, 74731, 74729, 74725, 74724, 74723, 74722, 74720, 74719, 74717, 74714, 74713, 74711, 74709, 74708, 74706, 74702, 74699, 74698, 74697, 74693, 74692, 74691, 74684, 74683, 74681, 74680, 74678, 74677, 74675, 74674, 74672, 74671, 74670, 74669, 74668, 74666, 74665, 74663, 74636, 74635, 74634, 74632, 74629, 74628, 74627, 74625, 74624, 74623, 74622, 74621, 74620, 74617, 74616, 74615, 74614, 74612, 74611, 74608, 74607, 74606, 74605, 74603, 74602, 74601, 74593, 74592, 74591, 74590, 74589, 74586, 74585, 74582, 74579, 74577, 74574, 74573, 74569, 74568, 74567, 74566, 74564, 74563, 74561, 74559, 74558, 74557, 74554, 74552, 74550, 74549, 74545, 74544, 74543, 74540, 74539, 74537, 74535, 74529, 74525, 74523, 74522, 74521, 74519, 74518, 74516, 74513, 74512, 74510, 74509, 74508, 74507, 74506, 74504, 74503, 74500, 74499, 74498, 74496, 74491, 74489, 74488, 74487, 74484, 74482, 74481, 74478, 74476, 74475, 74472, 74471, 74470, 74469, 74465, 74464, 74461, 74460, 74457, 74456, 74455, 74453, 74452, 74450, 74449, 74448, 74447, 74445, 74443, 74442, 74441, 74439, 74438, 74435, 74433, 74432, 74431, 74430, 74429, 74427, 74425, 74424, 74421, 74417, 74415, 74412, 74410, 74406, 74404, 74403, 74397, 74385, 74378, 75005, 74734 – лот рақамлари билан эълонлар жойлаштирилди. Мазкур лот бўйича 2022 йил 27-30 апрель ҳамда 5 майдаги энг яхши таклифларни танлаш савдосини ўтказиш бўйича давлат харидлари комиссиясининг электрон портали орқали шаклланган **“жорий таъмирлаш ишлари бўйича лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олиш”** баённомасига асосан эълон якунига кўра Комиссия аъзолари томонидан “Замонавий йўл лойиҳа” МЧЖ, “Ўзйўллойиҳа лойиҳа қидирув институти” ДУК, “Модерн роад прожест” МЧЖ, “Хумо консалтинг анд ресеарч” МЧЖ, “Равон лойиҳа люкс” МЧЖ ва “Йўл лойиҳа тараққиёт” МЧЖ лар тегишли лотлар бўйича ғолиб деб топилганлигини инобатга олиб;

КАРОР КИЛИНДИ:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684 – сонли Қонуннинг 62-моддаси 3-бандига асосан комиссия баённомаси давлат харидлари электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Икки иш куни давомида давлат харидлари электрон тизимига жойлаштирилган баённома ҳеч қандай эътирозлар ёки қўшимча таклифлар келиб тушмаганлиги маълумот учун қабул қилинсин.
2. ТШМЙБХ ДУК Тендерларни ташкил этиш ва шартномалар бўлими бош мутахассиси С.Аббосовга:

Юқоридагилардан келиб чиқиб ҳамда комиссия аъзоларининг 2022 йил 27-30 апрель ҳамда 5 майдаги электрон баённомасига асосан тегишли лотлар бўйича ғолиблар “Замонавий йўл лойиҳа” МЧЖ, “Ўзйўллойиҳа лойиҳа қидирув институти” ДУК, “Модерн роад прожест” МЧЖ, “Хумо консалтинг анд ресеарч” МЧЖ, “Равон лойиҳа люкс” МЧЖ ва “Йўл лойиҳа тараққиёт” МЧЖлар билан қонунчиликда ўрнатилган тартибда шартнома тузилсин. Ҳамда хизмат кўрсатиш сифат даражаси нозоратга олинсин.

Комиссия аъзолари

М.Сирожидинов


Ж.Искандаров


Б.Ибрагимов

Н.Юсупов


С.Икромхўжаев

С.Аббосов

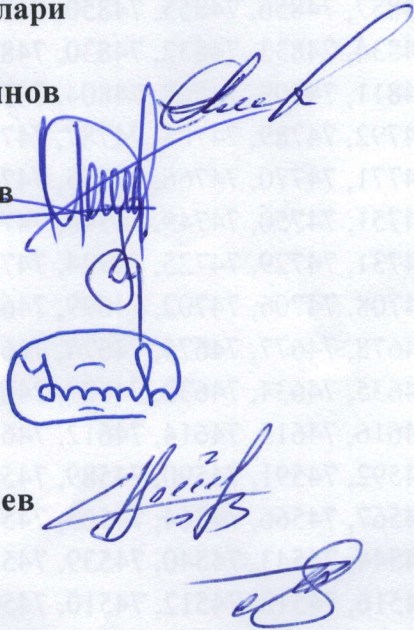



Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 19 ноябрдаги 702-сонли ҳамда Ташкент шаҳар ҳокимиятининг 2022 йил 16 февралдаги 0-14-0-Қ/22 сонли қарорига асосан таъмирлаши белгиланган кўчалар

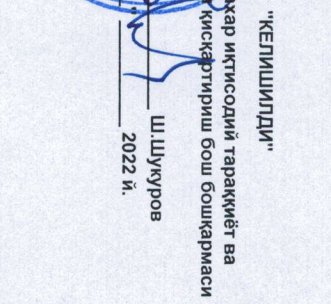

МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

№	Объектлар номи ва манзили	3	4	5	6	7	8	9	Шу жумладан:			Асосий фондларни ишла туширилгани		16	17	18	19	20	
									10	11	12	13	14						15
1	Тошкент шаҳри бўйича жами:							119 145,000											
	Таксимланган лимит							4 085,174											
346	Жами:		146,446	0,000	0,000	0,000	0,000	115 059,826	0,000	0,000	2 801,196	500,000	0,000	0,000	0,000				
32	Бектемир тумани бўйича жами		29,542	0,000	0,000	0,000	0,000	23 172,093	0,000	0,000	921,715	458,246	0,000	0,000	0,000				
7	Илк Оли МФЙ		5,084	0,000	0,000	0,000	0,000	3 742,488	0,000	0,000	144,829	69,685	0,000	0,000	0,000				
1	"Илк Ота" МФЙ "Мевозор" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,593					456,610			18,558	9,132							Танлов асосида
2	"Илк Ота" МФЙ "Заргунроқ" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,410					264,250			10,582	5,285							Танлов асосида
3	"Илк Ота" МФЙ "Мазрифат" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	1,030					724,500			28,970	14,490							Танлов асосида
4	"Илк Ота" МФЙ "Хуррият" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	1,000					840,000			33,590	16,800							Танлов асосида
5	"Илк Ота" МФЙ "Мажнуг'ул" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,395					331,100			8,091	1,439							Танлов асосида
6	"Илк Ота" МФЙ "Муборак" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,560					389,788			15,580	7,795							Танлов асосида
7	"Илк Ота" МФЙ "Темирчилар" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	1,096					737,240			29,478	14,744							Танлов асосида
7	Гульбоғ МФЙ		5,655	0,000	0,000	0,000	0,000	4 530,274	0,000	0,000	181,138	90,602	0,000	0,000	0,000				
1	"Гульбоғ" МФЙ "Янгилашти" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,797					720,216			28,798	14,404							Танлов асосида
2	"Гульбоғ" МФЙ "Гульбоғ" (Энчур) кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,776					658,000			26,310	13,160							Танлов асосида
3	"Гульбоғ" МФЙ "Баҳор" (Охишта) кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,235					215,586			8,616	4,311							Танлов асосида

Мил. сўмда

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати тегишли ўлчов бирликларда (км)	Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ молиялаштириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил Жами капитал қўйимталар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишла туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар буйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар буйича қолдиқ молиялаштириш	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лойиҳачи ташкилотлари
									Курилиш- монтаж ишларининг умумий қиймати	Жихоз	Буюртмачининг бошқа харажатлари	Буюртмачи харажатлари	Қуввати (км)	қиймати					
1	"Т.ефизика" МФЙ "Хурмакон"	2022 йил	0,265					254,660											Танлов асосида
4	кўчасидаги кўл қаватли уйлар олдини таъмирлаш	2022 йил	0,042					30,380											Танлов асосида
5	"Т.ефизика" МФЙ "Хислат" кўчасидаги кўл қаватли уйлар олдини таъмирлаш	2022 йил	0,455					318,850											Танлов асосида
6	"Т.ефизика" МФЙ "Эўрада" кўчасидаги кўл қаватли уйлар олдини таъмирлаш	2022 йил	0,286					258,944											Танлов асосида
7	"Т.ефизика" МФЙ "Нинго" кўчасидаги кўл қаватли уйлар олдини таъмирлаш	2022 йил	0,925					862,302											Танлов асосида
4	Тараққиёт МФЙ жамии:																		
1	"Тараққиёт" МФЙ "Фидойилар" кўчасининг 0,25 км қисминини таъмирлаш	2022 йил	0,177					97,230											Танлов асосида
2	"Тараққиёт" МФЙ "Мирзо Бобур" 3-тор кўчасининг 0,77 км қисминини таъмирлаш	2022 йил	0,408					418,572											Танлов асосида
3	"Тараққиёт" МФЙ "Туркистон" кўчасининг 0,15 км қисминини таъмирлаш	2022 йил	0,180					192,500											Танлов асосида
4	"Тараққиёт" МФЙ "Илк қадам" кўчасининг 0,25 км қисминини таъмирлаш	2022 йил	0,160					154,000											Танлов асосида
5	Меъназор МФЙ жамии:																		
1	"Меъназор" МФЙ "Узумзор" кўчасининг 1,13 км қисминини таъмирлаш	2022 йил	0,470					460,600											Танлов асосида
2	Геологлар тор кўчаси	2022 йил	0,350					269,500											Танлов асосида
3	Минг ўрик Берк кўчаси	2022 йил	0,072					63,504											Танлов асосида
4	Узумзор тор кўчаси	2022 йил	0,185					156,400											Танлов асосида
5	Геологлар кўчаси	2022 йил	0,093					58,590											Танлов асосида
8	Дустлик МФЙ жамии:																		
			1,490	0,000	0,000	0,000	0,000	975,590	0,000	0,000	19,484	0,000	0,000	0,000	0,000				Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	3	4	5	6	7	8	9	Шу жумладан:			Асосий фондларни ишта туширилиши		16	17	18	19	20	
									10	11	12	13	Куввати (км)						қиймати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
8	Арзани 1-2-3-тор кўчалари	2022 йил	0,466					256,760			5,127	0,000							Танлов ассоцида
9	Бодомтепа 3-тор кўчаси	2022 йил	0,078					43,680			0,872	0,000							Танлов ассоцида
10	Миллий бот 10-тор кўчаси	2022 йил	0,209					117,180			2,339	0,000							Танлов ассоцида
20	Гулбоғ МФЙ ж.ч.и:																		
1	"Гулбоғ" МФЙ "Паббода" кўчасининг 1,1 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,385		0,000	0,000	0,000	4,223,940	0,000	0,000	84,370	0,000	0,000	0,000	0,000				Танлов ассоцида
2	"Гулбоғ" МФЙ "Арзавор" кўчасининг 0,95 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,930					781,200			15,614	0,000							Танлов ассоцида
3	"Гулбоғ" МФЙ "Арзавор" 1-бەрк кўчасининг 0,1 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,076					53,200			1,062	0,000							Танлов ассоцида
4	"Гулбоғ" МФЙ "Оксерак" 4-бەрк кўчасининг 0,13 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,132					92,400			1,845	0,000							Танлов ассоцида
5	"Гулбоғ" МФЙ Мурувват 1-тор кўчасининг 0,2 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,196					164,640			3,288	0,000							Танлов ассоцида
6	"Гулбоғ" МФЙ Мурувват 2-тор кўчасининг 0,21 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,208					174,720			3,489	0,000							Танлов ассоцида
7	"Гулбоғ" МФЙ Мурувват 3-тор кўчасининг 0,23 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,224					188,160			3,757	0,000							Танлов ассоцида
8	"Гулбоғ" МФЙ Мурувват 4-тор кўчасининг 0,25 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,245					188,650			3,767	0,000							Танлов ассоцида
9	"Гулбоғ" МФЙ Мурувват 5-тор кўчасининг 0,25 км қисмини таъмирлаш	2022 йил	0,285					196,350			3,921	0,000							Танлов ассоцида
10	Мустақиллик кўчаси	2022 йил	0,178					124,600			2,488	0,000							Танлов ассоцида
11	Мустақиллик 2-бەрк кўчалари	2022 йил	0,211					161,280			3,220	0,000							Танлов ассоцида

№	Объектлар номи ва манзили	3	4	5	6	7	8	9	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишла туширилиши		16	17	18	19	20
									10	11	12	13	Куввати (км)	қиймати					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	Боглишмоғ кўчаси	2022 йил	0.242					135.520			2.706	0.000							Танлов ассосида
3	Мархабо кўчаси	2022 йил	0.235					92.400			1.845	0.000							Танлов ассосида
4	Эрматов берк кўчаси	2022 йил	0.370					266.000			5.312	0.000							Танлов ассосида
5	Гулноз кўчаси	2022 йил	0.166					120.400			2.404	0.000							Танлов ассосида
155	Сертеги тумани		64.102	0.000	0.000	0.000	0.000	53.447,660	0.000	0.000	1.068,943	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			
16	Нурафшон МФЙ жамии:		4.870	0.000	0.000	0.000	0.000	3.941,560	0.000	0.000	79.774	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000			
1	Кичик сой кўчаси	2022 йил	1.163					1.302.660			27.073	0.000							Танлов ассосида
2	Кичик сой 1-тор кўчаси	2022 йил	0.118					104.300			2.083	0.000							Танлов ассосида
3	Кичик сой 3-тор кўчаси	2022 йил	0.160					86.360			1.724	0.000							Танлов ассосида
4	Кичик сой 4-тор кўчаси	2022 йил	0.190					154.980			3.094	0.000							Танлов ассосида
5	Кичик сой 5-тор кўчаси	2022 йил	0.190					186.200			3.718	0.000							Танлов ассосида
6	Кичик сой 6-тор кўчаси	2022 йил	0.130					112.700			2.251	0.000							Танлов ассосида
7	Кичик сой 7-тор кўчаси	2022 йил	0.105					29.960			0.598	0.000							Танлов ассосида
8	Кичик сой 8-тор кўчаси	2022 йил	0.092					52.080			1.039	0.000							Танлов ассосида
9	Кичик сой 9-тор кўчаси	2022 йил	0.077					21.280			0.424	0.000							Танлов ассосида
10	Кичик сой 10-тор кўчаси	2022 йил	0.050					35.280			0.704	0.000							Танлов ассосида
11	Нурафшон 3-шоҳ кўчаси	2022 йил	0.223					191.380			3.821	0.000							Танлов ассосида
12	Нурафшон кўчаси	2022 йил	0.470					295.680			5.904	0.000							Танлов ассосида
13	Нурафшон 1-Берк кўчаси	2022 йил	0.400					275.240			5.496	0.000							Танлов ассосида
14	Фобурдиёр кўчаси	2022 йил	0.325					255.920			5.110	0.000							Танлов ассосида
15	Нурафшон асосий кўчаси	2022 йил	0.760					506.940			10.129	0.000							Танлов ассосида

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили	Лойиҳавий куввати тегишли ўлчов бирикларда (км)	Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ молиялаштириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал қўйилгалар	Шу жумладан:					Асосий фондларни ишта туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ молиялаштириш	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лойиҳачи ташкилотлари
									Курилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Жихоз	Буюртмачининг бошқа харажатлари	Буюртмачи харажатлари	Куввати (км)	қиймати						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
16	Нурафшон 4-шох кўчаси	2022 йил	0,417					330,680			6,604	0,000							Танлов ассосида	
24	Қорғиқ <i>ИШИ</i> жамини:		6,920	0,000	0,000	0,000	0,000	5,991,120	0,000	0,000	107,673	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
1	Дўстлик 2 асосий кўчаси	2022 йил	0,750					745,220			14,894	0,000							Танлов ассосида	
2	Дўстлик 2 1-тор кўчаси	2022 йил	0,161					63,280			1,264	0,000							Танлов ассосида	
3	Дўстлик 2 2-тор кўчаси	2022 йил	0,215					201,600			4,026	0,000							Танлов ассосида	
4	Дўстлик 2 3-тор кўчаси	2022 йил	0,200					141,120			2,818	0,000							Танлов ассосида	
5	Дўстлик 2 4-тор кўчаси	2022 йил	0,202					171,080			3,417	0,000							Танлов ассосида	
6	Дўстлик 2 5-тор кўчаси	2022 йил	0,285					171,500			3,425	0,000							Танлов ассосида	
7	Дўстлик 2 6-тор кўчаси	2022 йил	0,202					142,520			2,846	0,000							Танлов ассосида	
8	Дўстлик 2 7-тор кўчаси	2022 йил	0,215					153,020			3,055	0,000							Танлов ассосида	
9	Дўстлик 2 8-тор кўчаси	2022 йил	0,202					171,640			3,427	0,000							Танлов ассосида	
10	Дўстлик 2 9-тор кўчаси	2022 йил	0,224					189,280			3,779	0,000							Танлов ассосида	
11	Дўстлик 2 10-тор кўчаси	2022 йил	0,196					164,500			3,285	0,000							Танлов ассосида	
12	Дўстлик 2 11-тор кўчаси	2022 йил	0,194					163,380			3,262	0,000							Танлов ассосида	
13	Дўстлик 1 1-тор кўчаси	2022 йил	0,382					406,980			8,129	0,000							Танлов ассосида	
14	Янги турмуш 1-тор кўчаси	2022 йил	0,191					65,240			1,303	0,000							Танлов ассосида	
15	Янги турмуш 2-тор кўчаси	2022 йил	0,256					197,120			3,936	0,000							Танлов ассосида	
16	Янги турмуш 3-тор кўчаси	2022 йил	0,400					226,660			4,526	0,000							Танлов ассосида	
17	Янги турмуш 4-тор кўчаси	2022 йил	0,502					329,000			6,570	0,000							Танлов ассосида	
18	Янги турмуш 5-тор кўчаси	2022 йил	0,420					330,120			6,592	0,000							Танлов ассосида	
19	Янги турмуш 6-тор кўчаси	2022 йил	0,405					286,020			5,711	0,000							Танлов ассосида	
20	Дўстлик-2 12-тор кўчаси	2022 йил	0,190					186,200			3,718	0,000							Танлов ассосида	
21	Дўстлик-2 13-тор кўчаси	2022 йил	0,186					160,720			3,209	0,000							Танлов ассосида	

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили	Лойihaвий қуввати тегишли ўлчов бирикларда (км)	Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ молиялаштириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил ЖИМ капитал қўйимвлари	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишла туширишти		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар буйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар буйича қолдиқ молиялаштириш	Лойиха экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лойиҳачи ташкилотлари	
									Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Жихоз	Буюртмачининг бошқа харажатлари	Буюртмачи харажатлари	Қуввати (км)	қиймати						
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
20	Хонобол 2-тор кўчаси	2022 йил	1,150					1 282,260				25,635	0,000							Танлов ассосида
21	Хонобол 2-тор 1-берк кўчаси	2022 йил	0,385					323,400				6,458	0,000							Танлов ассосида
22	Хонобол 2-тор 2-берк кўчаси	2022 йил	0,276					231,840				4,630	0,000							Танлов ассосида
5	Хоноболнинг МФЙ жамии:		6,918	0,000	0,000	0,000	0,000	4 749,220	0,000	0,000	0,000	94,935	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			Танлов ассосида
1	Хоноболтепа 1-тор кўчаси	2022 йил	0,761					378,560				7,561	0,000							Танлов ассосида
2	Хоноболтепа 2-тор кўчаси	2022 йил	1,700					1 044,680				20,894	0,000							Танлов ассосида
3	Хоноболтепа 3-тор кўчаси	2022 йил	2,587					1 988,000				39,750	0,000							Танлов ассосида
4	Хоноболтепа 4-тор кўчаси	2022 йил	1,377					988,400				19,758	0,000							Танлов ассосида
5	Хоноболтепа 2-тор 2-берк кўчаси	2022 йил	0,493					349,580				6,982	0,000							Танлов ассосида
13	Сохибкор МФЙ		2,228	0,000	0,000	0,000	0,000	1 895,740	0,000	0,000	0,000	37,862	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			Танлов ассосида
1	Сохибкор кўчаси	2022 йил	0,605					509,320				10,176	0,000							Танлов ассосида
2	Барака дон кўчаси	2022 йил	0,165					256,480				5,122	0,000							Танлов ассосида
3	Мухамма 1-тор кўчаси	2022 йил	0,235					125,440				2,504	0,000							Танлов ассосида
4	Мухамма 2-тор кўчаси	2022 йил	0,201					188,300				3,760	0,000							Танлов ассосида
5	Мухамма 3-тор кўчаси	2022 йил	0,209					212,100				4,236	0,000							Танлов ассосида
6	Сохибкор 1-берк кўчаси	2022 йил	0,082					43,400				0,867	0,000							Танлов ассосида
7	Сохибкор 2-берк кўчаси	2022 йил	0,072					50,400				1,006	0,000							Танлов ассосида
8	Сохибкор 3-берк кўчаси	2022 йил	0,080					67,200				1,342	0,000							Танлов ассосида
9	Сохибкор 4-берк кўчаси	2022 йил	0,020					11,200				0,224	0,000							Танлов ассосида
10	Сохибкор 5-берк кўчаси	2022 йил	0,040					22,400				0,447	0,000							Танлов ассосида
11	Сохибкор 6-берк кўчаси	2022 йил	0,055					46,900				0,937	0,000							Танлов ассосида
12	Эшонбулак кўчаси	2022 йил	0,342					271,600				5,424	0,000							Танлов ассосида
13	Эшонбулак 1-берк кўчаси	2022 йил	0,122					91,000				1,817	0,000							Танлов ассосида

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиш ва тугаланиш йили	Лойиҳавий қуввати тегишли ўлчов бирикларда (км)	Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ молиялаштириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил жами капитал қуймалар	Шу жумладан:			Асосий фондларни ишла туширишни		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар буйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар буйича қолдиқ молиялаштириш	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лойиҳачи ташкилотлари	
									Курилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Жижоз	Буюртмачининг бошқа харажатлари	Буюртмачи харажатлари	қуввати (км)						қиймати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	Обол қўчаси	2022 йил	0.135					375,060			7,491	0,000							Танлов ассосида
5	Обол-1 қўчаси	2022 йил	0.384					573,720			11,464	0,000							Танлов ассосида
6	Обол-2 қўчаси	2022 йил	0.617					186,480			3,724	0,000							Танлов ассосида
7	Обол-3 қўчаси	2022 йил	0.225					214,200			4,274	0,000							Танлов ассосида
8	Обол-4 қўчаси	2022 йил	0.253					298,200			5,955	0,000							Танлов ассосида
9	Обол-3 7 тор қўчаси	2022 йил	0.165					92,400			1,845	0,000							Танлов ассосида
10	Янги ҳаёт 3-бەрк 1-тор қўчаси	2022 йил	0.603					75,600			1,510	0,000							Танлов ассосида
11	Обол-2 2-тор қўчаси	2022 йил	0.206					54,600			1,090	0,000							Танлов ассосида
12	Обол-3 1-тор қўчаси	2022 йил	0.206					115,080			2,299	0,000							Танлов ассосида
13	Обол-3 2-тор қўчаси	2022 йил	0.171					115,080			2,299	0,000							Танлов ассосида
14	Обол-3 4-тор қўчаси	2022 йил	0.206					95,900			1,915	0,000							Танлов ассосида
15	Обол-3 6-тор қўчаси	2022 йил	0.165					115,080			2,299	0,000							Танлов ассосида
16	Обол-3 8 тор қўчаси	2022 йил	0.165					92,400			1,845	0,000							Танлов ассосида
17	Янги ҳаёт 3-тор қўчаси (2-бەрк дала томони)	2022 йил	0.229					166,340			3,162	0,000							Танлов ассосида
7	Жаҳонир МФЙ																		
1	Файз қўчаси	2022 йил	0.594		0,000	0,000	0,000	5 447,960	0,000	0,000	108,891	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			Танлов ассосида
2	Файз 1-тор қўчаси	2022 йил	0.320					268,800			9,348	0,000							Танлов ассосида
3	Янги ҳаёт қўчаси	2022 йил	1.699					1 420,020			28,390	0,000							Танлов ассосида
4	Тоғувчиқ, Файз 2-тор, Илгор 3-4 тор қўчалари	2022 йил	1.757					1 381,800			27,626	0,000							Танлов ассосида
5	Илгор 1-тор қўчалари	2022 йил	0.354					739,900			14,788	0,000							Танлов ассосида
6	1-Дуқаш қўчаси	2022 йил	0.752					401,800			8,026	0,000							Танлов ассосида
7	Илгор 5-тор қўчаси	2022 йил	0.914					767,760			15,345	0,000							Танлов ассосида
12	Бастурик МФЙ																		
			7,622	0,000	0,000	0,000	0,000	6 294,120	0,000	0,000	125,805	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати тегишли улчов бириқларда (км)	Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ молиялаштириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил Жами келгилар қийматлари	Шу жумладан:			Асосий фондларни ишла тушириштириши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар буйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар буйича қолдиқ молиялаштириш	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдопарни баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лойиҳачи таъкилотлари
									Курилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Жихоз	Буюртмачининг бошқа харажатлари	Буюртмачи харажатлари	шумдан:					
1	"Ибрат" МФЙ Соҳил 1-бەрк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,181	0,000	0,000	0,000	0,000	123,340	0,000	0,000	21,759	0,000	0,000	0,000	0,000			Танлов асосида
2	"Ибрат" МФЙ Соҳил 2-тор кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,134					93,660			1,870	0,000	0,000					Танлов асосида
3	"Ибрат" МФЙ Донишман 2-кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,124					94,353			1,884	0,000	0,000					Танлов асосида
4	"Ибрат" МФЙ "Донишман 3-бەрк" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,187					118,930			2,375	0,000	0,000					Танлов асосида
5	"Ибрат" МФЙ "Ифтихор 7-бەрк" кўчасини жерий таъмирлаш	2022 йил	0,360					203,910			4,072	0,000	0,000					Танлов асосида
6	Ифтихор 1-бەрк кўчаси	2022 йил	0,074					47,600			0,951	0,000	0,000					Танлов асосида
7	Ифтихор 2-бەрк кўчаси	2022 йил	0,074					41,440			0,828	0,000	0,000					Танлов асосида
8	"Ибрат" МФЙ Фидокор кўчаси	2022 йил	0,564					366,800			7,326	0,000	0,000					Танлов асосида
1	Бакор МФЙ		0,857	0,000	0,000	0,000	0,000	683,690	0,000	0,000	13,664	0,000	0,000	0,000	0,000			Танлов асосида
1	"Бакор" МФЙ Абдалит кўчасини жерий таъмирлаш	2022 йил	0,857					683,690			13,664	0,000	0,000					Танлов асосида
15	Арғин МФЙ		5,944	0,000	0,000	0,000	0,000	4 154,983	0,000	0,000	83,010	0,000	0,000	0,000	0,000			Танлов асосида
1	"Арғин" МФЙ "Эски Арғин" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	1,329					726,334			14,516	0,000	0,000					Танлов асосида
2	"Арғин" МФЙ Эски Арғин 2-бەрк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,203					126,595			2,528	0,000	0,000					Танлов асосида
3	"Арғин" МФЙ "Эски Арғин 1-ўтар" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,225					134,540			2,687	0,000	0,000					Танлов асосида
4	"Арғин" МФЙ "Абдалит 1-бەрк" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,137					80,549			1,609	0,000	0,000					Танлов асосида
5	"Арғин" МФЙ Абдалит 2-бەрк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,278					185,612			3,706	0,000	0,000					Танлов асосида
6	"Арғин" МФЙ "Абдалит 6-ўтар" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,320					218,631			4,366	0,000	0,000					Танлов асосида
7	"Арғин" МФЙ "Катта бот" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	1,093					888,020			17,750	0,000	0,000					Танлов асосида
8	"Арғин" МФЙ "Илгор 9-ўтар" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,197					185,612			3,707	0,000	0,000					Танлов асосида
9	"Арғин" МФЙ "Катта бот 1-бەрк" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,215					139,860			2,793	0,000	0,000					Танлов асосида
10	"Арғин" МФЙ Катта бот 2-бەрк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,196					87,360			1,744	0,000	0,000					Танлов асосида
11	"Арғин" МФЙ "Катта бот 3-бەрк" кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,196					153,720			3,069	0,000	0,000					Танлов асосида

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили	Лойиҳавий қуввати тегишли ўлчов бирликларда (км)	Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ молиялаштириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил жамий капитал қўйимвлари	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишта туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар буйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар буйича қолдиқ молиялаштириш	Лойиҳа экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	20
									Курилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Жиҳоз	Буюртмачининг бошқа харажатлари	Буюртмачи харажатлари	Қуввати (км)	қиймати					
1	"Аргин" МФЙ "Абдиқит 7-бەрк" кўчасини тавмирлаш	2022 йил	0,678					543,676			10,864	0,000							Танлов ассосида
12	"Аргин" МФЙ "Абдиқит 3-ўтар" кўчасини тавмирлаш	2022 йил	0,430					291,858			5,828	0,000							Танлов ассосида
13	"Аргин" МФЙ "Абдиқит 4-ўтар" кўчасини тавмирлаш	2022 йил	0,180					154,924			3,094	0,000							Танлов ассосида
14	"Аргин" МФЙ "Абдиқит 5-ўтар" кўчасини тавмирлаш	2022 йил	0,265					237,682			4,747	0,000							Танлов ассосида
15	Миршакор МФЙ																		
1	"Миршакор" МФЙ "Илгор" шох кўчасини тавмирлаш	2022 йил	1,940	0,000	0,000	0,000	0,000	1,297,520	0,000	0,000	25,940	0,000							Танлов ассосида
2	"Миршакор" МФЙ "Илгор 6-бەрк" кўчасини тавмирлаш	2022 йил	0,281					158,200			3,159	0,000							Танлов ассосида
3	"Миршакор" МФЙ "Илгор 7-бەрк" кўчасини тавмирлаш	2022 йил	0,200					110,740			2,212	0,000							Танлов ассосида
4	"Миршакор" МФЙ "Хонариқ 1-бەрк" кўчасини тавмирлаш	2022 йил	0,640					493,892			9,868	0,000							Танлов ассосида
5	"Миршакор" МФЙ Тоғариқ кўчасини тавмирлаш	2022 йил	0,704					502,138			10,033	0,000							Танлов ассосида
6	"Миршакор" МФЙ Эзгароф кўчасини тавмирлаш	2022 йил	0,206					141,393			2,824	0,000							Танлов ассосида
7	Илгор 1-бەрк кўчаси	2022 йил	0,464					294,924			5,889	0,000							Танлов ассосида
8	Илгор 2-бەрк кўчаси	2022 йил	0,142					109,900			2,195	0,000							Танлов ассосида
9	Илгор 3-бەрк кўчаси	2022 йил	0,140					72,870			1,455	0,000							Танлов ассосида
10	Илгор 5-бەрк кўчаси	2022 йил	0,203					131,600			2,628	0,000							Танлов ассосида
11	Хонариқ кўчаси	2022 йил	0,140					108,920			2,175	0,000							Танлов ассосида
12	Хонариқ 2-бەрк кўчаси	2022 йил	0,168					176,680			3,529	0,000							Танлов ассосида
13	Дархон 1-ўтар кўчаси	2022 йил	0,246					185,472			3,703	0,000							Танлов ассосида
14	Қияғариқ кўчаси	2022 йил	0,838					625,730			12,505	0,000							Танлов ассосида
15	Қияғариқ 1-ўтар кўчаси	2022 йил	0,166					93,296			1,863	0,000							Танлов ассосида
12	Чилор МФЙ																		
1	"Чилор" МФЙ Муррабоблар 1-бەрк кўчасини тавмирлаш	2022 йил	1,229	0,000	0,000	0,000	0,000	1,059,744	0,000	0,000	21,165	0,000							Танлов ассосида
2	"Чилор" МФЙ Муррабоблар 2-бەрк кўчасини тавмирлаш	2022 йил	0,451	0,000	0,000	0,000	0,000	214,284	0,000	0,000	4,280	0,000							Танлов ассосида

№	Объектлар номи ва манзили	Курилиш ишларининг бошланиш ва тугалланиш йили	Лойiha ҳавий қуввати тегишли ўлчов бирликларда (км)	Шартноманинг умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ молиялаштириш, шу жумладан буюртмачининг харажатлари	2022 йил жамий капитал қўйималар	Шу жумладан:				Асосий фондларни ишла туширилиши		2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ қиймати	2023 йил 1 январ ҳолатига ўтувчи объектлар бўйича қолдиқ молиялаштириш	Лойiha экспертиза санаси ва рақами	Тендер савдолари баённомаси тасдиқланган санаси ва рақами	Лойihaчи ташкилотлари
									Курилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Жихоз	Буюртмачининг бошқа харажатлари	Буюртмачи харажатлари	қуввати (км)	қиймати					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	"Жарбощи" МФЙ Интеграг 4-бەрк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,143					80,080			1,600	0,000							Танлов асосида
8	"Жарбощи" МФЙ Миллий бoғ 1-бەрк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,065					58,513			1,168	0,000							Танлов асосида
9	"Жарбощи" МФЙ Миллий бoғ 2-бەрк кўчасини таъмирлаш	2022 йил	0,064					54,432			1,087	0,000							Танлов асосида
7	Товкеништи МФЙ		3,402	0,000	0,000	0,000	0,000	2,347,590	0,000	0,000	48,905	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			Танлов асосида
1	Янги хаят кўчаси (Қабристонга олиб бoғувчи йўл)	2022 йил	0,172					72,240			1,443	0,000							Танлов асосида
2	Пунган кўчаси	2022 йил	1,365					859,950			17,189	0,000							Танлов асосида
3	Марказий шохтепа кўчаси	2022 йил	0,960					631,680			12,623	0,000							Танлов асосида
4	Шохтепа 1-ўтар	2022 йил	0,235					230,300			4,599	0,000							Танлов асосида
5	Шохтепа 2-ўтар	2022 йил	0,250					217,000			4,333	0,000							Танлов асосида
6	Шохтепа 3-ўтар кўчаси	2022 йил	0,243					180,320			3,601	0,000							Танлов асосида
7	Шохтепа 4-ўтар кўчаси	2022 йил	0,177					156,100			3,117	0,000							Танлов асосида

"КИРИЛДИ"

"Тошкент шаҳар минтақавий йўлларга бил буюртмачи хизмати" давлат унитар корхонаси директори в.б.б.

О.У. Абдуназаров



"Келишилди"

Тошкент вилояти Автомобиль йўллари бош бошқармаси бошлиғи

Ж.Бекмурзаев



"Келишилди"

Тошкент шаҳар ҳокимлиги Молия бош бошқармаси бошлиғи

Д.Исмагуллаев



2022 й
