

**ЛОЙИҲА ВА ҚИДИРУВ ИШЛАРИ ПУДРАТ
ШАРТНОМАСИ № 9**

ЛОТ № - 22110012081475

2022 йил 30 май

Жиззах шаҳри

Ўзбекистон Республикаси “ЎЗСУВТАЪМИНОТИ” АЖ “Сув таъминоти ва оқава сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Жиззах вилояти ҳудудий бошқармаси, кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб аталиб ҳамда 2022 йил 5 январдаги № 4-сонли ишончномага асосан иш юритувчи номидан бошқарма бошлиғи **М.Каратаев**, бир тарафдан ва “ATLANT ARCHITECT GROUP” масъулияти чекланган жамияти (кейинги ўринларда «Ижрочи» деб юритилади) номидан Низом асосида фаолият юритувчи директор **Ю.Суванова** иккинчи тарафдан, мазкур шартномани қуйидагилар хақида туздилар:

1. Шартнома предмети.

1.1. Мазкур шартнома бўйича ижрочи буюртмачининг топшириғида белгиланган шартларга мувофиқ **Жиззах вилояти Зомин тумани «Суффа» платоси ва унга туташ бўлган ҳудудда ичимлик ва оқава сув тизимини қуриш** объекти бўйича амалдаги қонунчиликнинг ишларнинг шундай турига қўйиладиган талабларига жавоб берадиган ва фойдаланиш учун яроқли бўлган шаҳарсозлик ҳужжатларини (бундан кейинги матнларда “Лойиҳа” деб номланади) ишлаб чиқиш мажбуриятини, буюртмачи эса техник топшириқ ва бирламчи маълумотларни бериш, бажарилган ишларни қабул қилиб олиш ва ҳақ тўлаш мажбуриятини зиммасига олади.

1.2. Хизматлар кўрсатиш муддати:

Ишнинг бошланиши: **15 фоиз** аванс маблағи утказилгандан кейин;

Ишни якунлаш: **75** иш куни.

2. Шартнома бўйича ишлар қиймати ва ҳисоб-китоблар тартиби.

2.1. Мазкур шартнома 2022 йил 25 май кунги танлов хайъатининг 81475-сонли электрон баёнига асосан ишлар қиймати ҚҚС билан **464 992 250 (тўрт юз олтмиш тўрт миллион тўққиз юз тўқсон икки минг икки юз эллик)** сўмни ташкил этади. Шундан: Тасдиқланган 2022 йилдаги дастлабки харажатлар **навбатдаги** “Манзилли дастур” тасдиқлангандан сўнг молиялаштирилиб берилади.

2.2. Ишлар қиймати очиқдир. Ўзбекистон Республикасининг Ҳукумати қарорига асосан ҳамда вазиятлар, материаллар нархлари, ишга ҳақ тўлаш шартлари тубдан ўзгарганда ва бошқа харажатлар туфайли ишлар қиймати мазкур шартномага қўшимча битим тузиш йўли билан ўзгартирилиши мумкин.

2.3. Мазкур шартнома бўйича ишлар қийматини тўлаш буюртмачи тарафидан ижрочининг ҳисоб рақамига пул ўтказиш йўли билан қуйидаги тартибда амалга оширилади:

- мазкур шартнома имзолангандан кейин бир ой давомида ишлар қийматидан 15% олдиндан тўлов;

- кейинги тўловлар – босқичма-босқич, Лойиҳани қабул қилиш-топшириш юк хати имзолангандан сўнг 60 кун давомида, Лойиҳани асосланган рад этиш хати йўқ бўлган тақдирда.

2.4. Буюртмачи молия органи тарафидан молиялаштириш очилмаганлиги сабабли олдиндан тўловни ўтказиш мажбуриятини бажармаса, ижрочи қонунчиликда ўрнатилган тартибда шартномани бекор қилиш ҳуқуқига эга.

2.5. Мазкур иш турларига молиялаштирувчи органлар тарафидан маблағ молиялаштирилмаган тақдирда «Буюртмачи» тулов учун мажбуриятни зиммасига олмайди.

2.6 АРТ, Давлат хизматлари, ЗВОС лойиҳаси, кидирув ишлари ва геология, РСВ, гидрогеология хулосаси, ДАҚН ҳисоботи, муаллифлик назорати, давлат ва экологик экспертиза хулосалари учун тўловлар “Ижрочи” тарафидан амалга оширилади.

3. Ишларни топшириш-қабул қилиш тартиби.

3.1. мувофиқ **Жиззах вилояти Зомин тумани «Суффа» платоси ва унга тугаи бўлган ҳудудда ичимлик ва оқава сув тизимини қуриш**" объекти бўйича лойиҳалаш ишларини бошлаш санаси сифатида қуйидаги талабларни бажариш санаси ҳисобланади:

3.1.1. Лойиҳалашга топширикни қонунчиликда ўрнатилган тартибда тасдиқлаш ва келишиб олиш;

3.1.2. Тасдиқланган лойиҳалашга топшириққа ҳамда лойиҳалаш ишларини тартибга солувчи меъёрий ҳужжатларга мувофиқ буюртмачи лойиҳалаш учун зарур бўлган бирламчи маълумотларни тақдим қилиши;

3.1.3. Тарафлар мазкур шартномага қўшимча ёзма битим тузиш йўли билан юқоридаги талабларни бажариш учун кетадиган вақтга мутаносиб равишда лойиҳалаш ишларини бажариш календар муддатлари сурилиши мумкин.

3.2. Ишлар тугаллангандан сўнг ижрочи тайёр лойиҳани ёки унинг қисмини буюртмачига юк хати бўйича топширади, лойиҳалашга топширик ва мазкур шартнома шартларида кўзда тутилган лойиҳани топшириш-қабул қилиш далолатномасини тақдим қилади.

3.3. Буюртмачи лойиҳани олгандан кейин қуйидагиларни амалга оширишга мажбур:

3.3.1. Лойиҳани топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзолагандан кейин 30 кун давомида лойиҳани олиш ёки олишни рад этиш ва ижрочига рад этиш сабаблари кўрсатилган хатни юбориш;

3.3.2. Лойиҳани олишни рад этиш сабаблари кўрсатилган хат ижрочига юборилгандан сўнг икки тарафлама далолатнома ёки қўшимча ёзма битим тузилади. Қўшимча ёзма битимда лойиҳадаги камчиликларни бартараф этиш ишлари рўйхати ва уларни бажариш муддатлари кўрсатилади;

3.3.3. Буюртмачи лойиҳани олишдан бош тортса (Лойиҳани топшириш-қабул қилиш далолатномасини имзоламаса), рад этиш сабаблари кўрсатилган хатни ижрочига юбормаса, лойиҳа буюртмачига тақдим этилган вақтдан бошлаб унга топширилган ҳисобланади;

3.3.4. Агар буюртмачи лойиҳани текширмасдан қабул қилган бўлса, кейинчалик лойиҳада бирламчи ҳужжатлардан ва шартномадан четланишлар ёки бошқа камчиликлар борлигини аниқласа, бундай камчиликларни лойиҳани қабул қилаётганда аниқлаш имконияти бўлмаса (яширин камчиликлар), бундай ҳолатда буюртмачи камчиликлар аниқлангандан кейин ижрочини 10 кун муддатда ёзма равишда огоҳлантириши ва камчиликларни қисқа муддатда бартараф этилишини талаб қилиши керак.

4. Тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари.

4.1. Буюртмачининг мажбуриятлари:

4.1.1. Лойиҳани тайёрлаш учун зарур бўладиган лойиҳалашга топширик ва бирламчи маълумотларни ижрочига тақдим қилади;

4.1.2. Мазкур шартномада белгиланган миқдор ва тартибда ишлар қийматини ижрочига тўлаб беради;

4.1.3. Ижрочидан олинган лойиҳадан фақат мазкур шартномада кўзда тутилган мақсадларда фойдаланиши, лойиҳани учинчи шахсларга бермаслик ва ижрочининг розилигисиз ундаги маълумотларни ошқора қилмаслик;

4.1.4. Зарурат туғилганда лойиҳани тегишли давлат органлари ва фуқарорларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари билан келишиш учун ижрочини жалб этиш;

4.1.5. Бирламчи маълумотларни ўзгартириш ёки ижрочига боғлиқ бўлмаган бошқа вазиятлар туфайли пайдо бўлган қўшимча харажатларни қоплаш (мазкур масала юзасидан тарафлар дастлаб ўзаро келишиб ва қўшимча битимни имзолашгандан сўнг);

4.1.6. Тайёр лойиханинг камчиликлари сабабли учинчи шахс тарафидан буюртмачига тақдим қилинган даъво бўйича жараёнда иштирок этиш учун ижрочини жалб қилиш.

4.2. Ижрочининг мажбуриятлари:

4.2.1. Лойихани ишлаб чиқиш учун буюртмачи тарафидан тақдим қилинган лойихалашга топширик ва бирламчи маълумотлардаги талабларга риоя этиш, уларга мувофиқ ва ўзи шахсан лойихалаш ишларини бажариши;

4.2.2. Буюртмачи тарафидан тақдим этилган ҳужжатларда хато ва камчиликлар борлиги аниқланса, буюртмачини шу тўғрисида зудлик билан ўрнатилган тартибда огоҳлантириши, буюртмачидан кўрсатмалар олингунча ишни тўхтатиши, буюртмачини ўз вақтида огоҳлантирмаган ижрочи келгусида буюртмачи тарафидан даъво қилинганда ҳужжатларда хато ва камчиликлар борлигини рўқач қилмаслиги керак;

4.2.3. Лойихани тегишли давлат органлари ва фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари билан келишишда буюртмачи билан биргаликда иштирок этиш;

4.2.4. Мазкур шартномада белгиланган муддатда сифатли, қурилиш меъёрлари ва коидалари талаблари ва шахарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш, келишиш ва тасдиқлаш тартибини белгилайдиган бошқа қонунчилик ҳужжатларига жавоб берадиган тайёр лойихани буюртмачига топшириш;

4.2.5. Буюртмачининг розилигисиз лойиха-смета ҳужжатларини учинчи шахсларга бермаслик;

4.2.6. Ўз ҳисобидан муаллифлик назоратини олиб бориш.

4.3. Буюртмачи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

4.3.1. Лойихадан фойдаланиш давомида унда камчиликлар борлиги аниқланса, ижрочидан қуйидагиларни талаб қилиш:

- ижрочи лойихадаги камчиликларни ўз ҳисобидан талаб қилинадиган муддатларда бартараф қилиш;
- шартномавий қийматни шунга мувофиқ миқдорда камайтириш;
- ижрочи лойихадаги камчиликларни ўз вақтида бартараф этмаганлиги сабабли буюртмачининг пайдо бўлган молиявий зарарларини қоплаш;
- Лойихадаги камчиликлар жиддий ва уларни бартараф қилиш имконияти йўқ бўлса, буюртмачи шартномани бекор қилиши ва барча кўрилган молиявий зарарлар қопланишини ижрочидан талаб қилиш;

- «Ижрочи» ташкилотнинг айби билан лойиха ҳужжатларига қушимча иш хажмлари киритилган ва харажатлар аниқланган тақдирда «Ўздавархитектқурилиш» қумитасининг 24.06.2008 йилдаги 50-сонли буйруғи билан тасдиқланган ШНК 1.03.01-08 нинг 1.13.-банди 3-хатбошисига асосан бажарувчига туланган сумма тулик Давлат бюджети фойдасига олиб қуйилади.

4.4. Ижрочи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

4.4.1. Буюртмачининг ёзма рухсати билангина лойихалаштиришга топширик ва бирламчи маълумотлардаги талаблардан чекиниш.

5. Тарафларнинг жавобгарлиги.

5.1. Тарафлар мазкур шартномада кўзда тутилган мажбуриятларини бажармаганлари учун амалдаги қонунчиликка мувофиқ жавобгар бўлади.

5.2. Лойиха буюртмачи тарафидан қабул қилингандан кейин ижрочи кафолатли муддат давомида (10 йил) лойиханинг дастлабки камчиликлари ва лойихадан фойдаланиш мобайнида аниқланган камчиликлари учун жавобгардир. Шунингдек, ушбу камчиликларни ўз ҳисобидан бартараф қилиши, агар камчиликларни бартараф қилиш имконияти бўлмаса, буюртмачининг зарарларини тўлаб бериши керак.

5.3. Ижрочи лойихадаги камчиликлар учун (ушбу камчиликлар аниқланган вақтга боғлиқ бўлмаган ҳолда) қуйидаги ҳолларда жавоб бермайди:

- Буюртмачи ижрочи билан келишиб олмасдан лойихалаш мобайнида лойих кўйилган талаблардан чекинса ёхуд лойихалашга топшириқдаги бирлам маълумотларни ўзгартирса.

5.4. Молия органи тарафидан молиялаштириш очилган бўлса ҳам буюртмачи лойихалаш ишларини ўз вақтида молиялаштирмаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун ўтказилмаган тўлов суммасидан 0,4 % миқдорида пеня тўлайди, лекин пеня миқдори ўз вақтида ўтказилмаган тўлов суммасининг 50 % дан ошмаслиги керак.

5.5. Ижрочи лойихалаш ишларини ўз вақтида бажармаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун бажарилмаган ишлар суммасидан 0,5 % миқдорида пеня тўлайди, лекин пеня миқдори ўз вақтида бажарилмаган ишлар суммасининг 50 % дан ошмаслиги керак.

5.6. Пеня ва зарарларни тўлаш шартномани бузган тарафни шартномадаги мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

5.7. Тарафлар молиявий мажбуриятларни зиммаларига олмаслик шарти билан, биринчи тараф иккинчи тарафни 30 кун аввал ёзма равишда огоҳлантириб, мазкур шартномани муддатидан илгари бекор қилиши мумкин.

5.8. Шартнома муддатидан илгари бекор қилинган ҳолда, шартномани бекор қилиш ташаббуси билан чиққан тараф иккинчи тарафга мазкур шартнома бўйича ишлар қийматининг 10 % миқдорида жарима (неустойка) тўлайди.

6. Махфийлик.

6.1. Ҳар бир тарафнинг фаолияти ёки тарафлар билан боғлиқ шахснинг фаолияти тўғрисидаги ошқора қилинмайдиган барча маълумотлар махфийдир. Тарафлар бундай маълумотларни бошқа шахсларга ошқора қилмасликлари, мазкур шартномани бажариш билан боғлиқ мақсадлардан бошқа мақсадлар учун фойдаланмасликлари керак.

7. Шартномани ўзгартириш ва бекор қилиш.

7.1. Мазкур шартноманинг 10.1-бандида кўрсатилганидек, шартноманинг амал қилиш муддати тугаши билан тарафларнинг шартномадаги мажбуриятлари тугайди.

7.2. Тарафлар ўртасидаги ёзма келишувга асосан шартнома ўзгартирилиши ёки муддатидан илгари бекор қилиниши мумкин.

7.3. Мазкур шартномага қўшимча битим тузилган ёки келишмовчилик баённомаси кўринишидаги ўзгартириш ва қўшимчалар киритилган ҳамда тарафлар (ёки тарафлар номидан вакиллар) томонидан имзоланганидан кейин юридик кучга эга бўлади.

7.4. Қонунчиликда ёки мазкур шартномада назарда тутилган бошқа ҳолларда ҳам мазкур шартнома ўзгартирилиши ёки бекор қилиниши мумкин.

7.5. Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

8. Низоларни хал этиш.

8.1. Мазкур шартноманинг матнида ечимини топмаган масалалар бўйича тарафлар ўртасида пайдо бўлиши мумкин бўлган низолар ва турли талқинлар амалдаги қонунчилик асосида музокаралар ўтказиш йўли билан хал этилади.

8.2. Музокаралар ўтказиш йўли билан низолар хал этилмаса, ўрнатилган тартибда Жиззах туманлараро иктисодий судида кўриб чиқилади.

9. Форс-мажор.

9.1. Кўзда тутилмаган ва келиб чиқишини бартараф этиб бўлмайдиган фавқулодда хусусиятга эга форс-мажор вазиятлари пайдо бўлганда тарафлар мазкур шартномадаги мажбуриятларини бажармаганлари учун жавобгар эмасдирлар.

Фавқулодда вазиятлар сифатида қуйидагилар тушунилади: табиий талофатлар, ёнғин, сув тошқини, шторм, уруш ва уруш ҳаракатлари, қамаллар, кўзғолонлар, саботаж, миллатчилик тусга эга ғалаёнлар, эмбарго, давлат органларининг таъқиқлашлари ва

шартнома тузилганидан кейин пайдо бўлган тарафлар назоратидан ташқаридаги бошқа вазиятлар.

9.2. Форс-мажор вазиятлари пайдо бўлиши муносабати билан мазкур шартномадаги тарафлар мажбуриятлари бутунлай бажарилмаса ёки қисман бажарилса, мажбуриятларни бажариш муддатлари бундай вазиятлар таъсир этиши вақтига муносиб равишда узайтирилади.

10. Бошқа шартлар.

10.1. Мазкур шартнома Жиззах вилояти Ғазначилик бошқармасида руйхатга олинган кундан бошлаб кучга киради ва 2022 йил «31» декабр гача амал қилади.

10.2. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди. Битта нусхаси буюртмачида, иккинчи нусхаси эса ижрочида сақланади.

11. Тарафларнинг манзиллари ва банк реквизитлари:

БУЮРТМАЧИ:

Ўзбекистон Республикаси
“ЎЗСУВТАЪМИНОТИ” АЖ “Сув таъминоти
ва оқова сув объектларини қуриш бўйича
инжиниринг компанияси” УК Жиззах вилояти
худудий бошқармаси
Жиззах ш. Кимёгар маҳалла Тўқимачилар
кўчаси 2 уй. Тел./факс 222-82-41,
шҒХ: 301110860084017063201110206
ИНН: 305978471 ОКЕД 42210
Жиззах вилоят Ғазначилик бошқармаси
ЯҒХ 23402000300100001010
Банк номи: Марказий банкнинг Тошкент
шаҳар Бош бошқармаси Ҳисоб-китоб-касса
маркази (ХККМ)
МҒО: 00014 ИНН: 201122919





М. Каратаев
(ФИШ)

ХУҚУҚИЙ ХУЛОСА:

Мазкур шартнома Ўзбекистон Республикасининг “Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тугрисида”ги Қонуни талаблари асосида тузилган. Хўжалик шартномаси шартлари, унда тарафларнинг жавобгарлиги ҳамда низоларни ҳал этиш тартиби амалдаги қонунчилик талабларига мос келади.

Хуқуқий экспертиза натижасига қура қуйдагилар аниқланди:

1. Шартнома Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунлари талабларига мувофиқ тузилган. Такдим этилган шартнома шартлари қонунчилик талабларига жавоб беради. Шартнома бўйича юзага келган ҳар қандай ҳолат Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси ҳамда “Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тугрисида”ги Қонуни билан тартибга солинади.

2. Шартнома бўйича тарафларнинг ўз мажбуриятларини бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлиги оқибатида юзага келадиган жавобгарлик Ўзбекистон Республикасининг “Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тугрисида”ги Қонунининг 24-34, 36-моддалари талабларига мос келади.

Бошқарма ҳуқуқшуноси


_____ Д.Уралов

ИЖРОЧИ:

“ATLANT ARCHITECT GROUP”
масъулияти чекланган жамияти

Тел. факс. 93-308-73-37
Жиззах ш. М.Улуғбек МФЙ 9-уй
Х/р 2020 8000 5006 6156 1001
АТ «Алоқабанк» банк Жиззах
филиали

МҒО: 00401 ИНН: 304 288 628
ОКОНХ: 71110




(ИМЗО)

Ю.Суванова
(ФИШ)

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича
инжиниринг компанияси” УК Жиззах
вилоят ҳудудий бошқармаси бош
муҳандиси



У.Сакиев
2022 йил

“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг
компанияси” УК Жиззах вилоят ҳудудий бошқармасида ўтказилган танлов
комиссияси аъзолари йиғилиш
БАЁНИ № 3

2022 йил “30”май

Жиззах шаҳри

“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Жиззах вилоят ҳудудий бошқармасининг 2022 йил 1 апрелдаги №3/1-сонли буйруғи билан тасдиқланган комиссияси аъзолари куйидаги таркибда,

ҚАТНАШДИЛАР:

Ў.Сакиев - “Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Жиззах вилоят ҳудудий бошқармаси бош муҳандиси, комиссия раиси;

Комиссия аъзолари:

А.Тангриев - Жиззах вилояти Давлат солиқ бошқармаси мутахассиси;

Ж.Хатамов - "Жиззах сув таъминоти" МЧЖ директори ўринбосари;

Ш.Сайдахмедов - Жиззах вилояти қурилиш бош бошқармаси мутахассиси;

А.Абдукаримов - Танлов савдоларини ташкил этиш ва хўжалик-шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи;

Ф.Мамиров - Бирламчи рухсат берувчи, лойихавий ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассис, комиссия котиби.

Кун тартиби:

“Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” УК Жиззах вилоят ҳудудий бошқармаси буюртмачилигида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сонли қарори билан тасдиқланган 2022 йил “Манзилли дастури”га киритилган **“Жиззах вилояти Зомин тумани «Суффа» платоси ва унга туташ бўлган ҳудудда ичимлик ва оқова сув тизимини қуриш”** объекти лойиҳасини ишлаб чиқиш бўйича ўтказилган харид қилиш комиссиясининг танлов баённомалари асосида тузиладиган шартноманинг Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги ЎРҚ-684-сонли қонуни 62-моддаси талабларига мувофиқ тузилишини таъминлаш.

2022 йил 25 майда “etender.uzex.uz” электрон портали орқали ўтказилган “**Жиззах вилояти Зомин тумани «Суффа» платоси ва унга туташ бўлган ҳудудда ичимлик ва оқава сув тизимини қуриш**” объекти бўйича харид қилиш комиссиясининг №22110012081475-сонли лот рақами, **464 992 250 (тўрт юз олтмиш тўрт миллион тўққиз юз тўқсон икки минг икки юз эллик)** сўм билан «**ATLANT ARCHITECTS GROUP**» МЧЖ ғолиб бўлганлиги тўғрисида танлов савдоси баённомаси расмийлаштирилган;

Комиссия котиби томонидан “**Жиззах вилояти Зомин тумани «Суффа» платоси ва унга туташ бўлган ҳудудда ичимлик ва оқава сув тизимини қуриш**” объектига лойиҳа ташкилотини танлаш бўйича ўтказилган танлов савдоси юзасидан 2 иш куни мобайнида комиссия аъзоларига ҳеч қандай шикоят келиб тушмаганлиги тўғрисида ахбороти ўқиб эшиттирилди.

Комиссия аъзоларининг фикр-мулоҳазаларини эшитиб ва ўрганиб чиққан ҳолда, танлов комиссияси

Қарор қилади:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 22 январдаги ПҚ-98-сонли қарори билан тасдиқланган 2022 йил “Манзилли дастури”га киритилган “**Жиззах вилояти Зомин тумани «Суффа» платоси ва унга туташ бўлган ҳудудда ичимлик ва оқава сув тизимини қуриш**” объектининг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш бўйича “etender.uzex.uz” электрон портали орқали аниқланган «**ATLANT ARCHITECTS GROUP**» МЧЖ билан 3 иш куни ичида шартнома тузилиши мақсадга мувофиқ деб топилсин.

Йиғилиш баёни тўғри тузилган деб имзо қўювчилар:

А.Тангриев

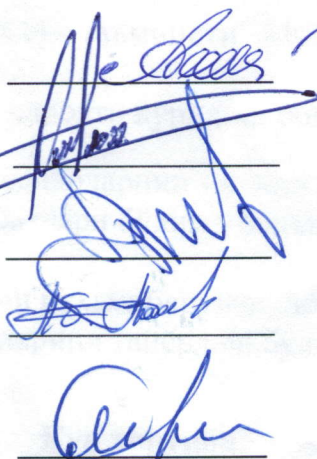
Ж.Хатамов

Ш.Сайдахмедов

А.Абдукаримов

Комиссия котиби:

Ф.Мамиров

The image shows five handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. The signatures are: 1. A. Tangridiev (top), 2. J. Hatamov, 3. Sh. Saidaxmedov, 4. A. Abdulkarimov, and 5. F. Mamirov (bottom). The signatures are stylized and cursive.

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
“ЎЗБЕҲТАРМИНОТ” АЖ бошқарув раиси в.б

С.Саифназаров
2022 й.

“Сув ташминоти ва канализация тизимларини ривожлантириши” жамғармаси ҳисобидан
“Сув ташминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича инжиниринг компанияси” унитар корхонаси объектларини
қуриш, реконструкция қилиш ва капитал ташмирлаш ишларининг лойиҳа-қилирув ишлари бўйича 2022 йил учун
МАНЗИЛЛИ РЎЙҲАТИ

(Милн. сўм)

| ТР | Объектлар номи ва манзили | Лойиҳа қавати ҳос бирликлари | Қурилиш бошланғи ва фоидаланганга тошириш йили | Объект қурилишининг ҳисобий (ақсавлаб) ва таҳминий қиймати | Лойиҳа босқичи ДТНА, ДТНХ, ТНА, ТНХ, Д, ИХ, ИД, ТХ | Объектнинг лоийҳа- қилирув ишлари қиймати* | Лойиҳа бошланғи 01.01.22 й. ҳолатида бажарилган лоийҳа- қилирув ишлари | 01.01.22 й., ҳолатида лоийҳа-қилирув ишлари қолдиқ қиймати | 2022 йил учун капитал қўшимчалар лимити | Лойиҳа-смета ҳужжатларининг бюртмачига тошириш муддати (ой, йил) | Тендер (таллов)лар натijasига бўйича баённома рақами ва санаси | Лойиҳачи ташқилот номи |
|----|---|---------------------------------|--|---|--|--|---|--|--|---|--|---------------------------------|
| 1 | Андижон тумани "Толмазор", "Миробод", "Ноҳатак", "Роҳат" МФЙларда ичимлик суви тармоғини қуриш | 450,8 км 42 та объект | 2022 йил | 361 276,61 | ИД | 7 524,57 | 1 729,77 | 5 794,80 | 5 794,80 | | № 30-2021/2 15.10.2021 | "Фирдавс змс" МЧЖ |
| 2 | Асака туманида ташқиқ этилаётган "Асака сити" мажмуасига ичимлик суви тармоғини қуриш * | 84,8 км 15 та объект | 2022-2023 йил | 76 195,14 | ИД | 1 919,10 | 300,00 | 1 619,10 | 1 619,10 | | | Тендер орқали талланади |
| 3 | Асака туманида ташқиқ этилаётган «Асака сити» мажмуасига оқова сув тармоғини қуриш * | 5,0 км 1 та объект | 2022-2023 йил | 30 000,00 | ИД | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | | | Тендер орқали талланади |
| 4 | Бўстон тумани "Гулистон", "Меҳнатобод", "Декхонобод", "Янгиқилдиқ", "Сарик жўта", "Ушман", "Нашма", "Халқобод" МФЙларда жойлашган ичимлик суви қудуқларини реконструкция қилиш | 42,5 км 8 та объект | 2022 йил | 19 019,00 | ИД | 359,25 | 150,00 | 209,25 | 209,25 | | № 25-2021/2 15.10.2021 | "Муқаммал дизайн лоийҳа" МЧЖ |
| 5 | Зомин тумани "Суффа" платоси ва унга туташ бўлган хулудла ичимлик ва оқова сув тизимини қуриш * | 66,9 км 10 та объект | 2023 йил | 55 406,30 | ИД | 1 232,44 | 372,53 | 859,91 | 859,91 | | | Тендер орқали талланади |
| 6 | Зафаробод тумани "Ёркин" ҳамда "Барлик" ҚФЙларини ичимлик суви тизимларини қуриш | 5,5 км 2 та объект | 2023 йил | 30 000,00 | ИД | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | № 31- 2021 й/1-2 22.11.2021 | "NOVO PLANNING" МЧЖ |
| 7 | Шароф Рашидов тумани, "Халқобод", "Тараққисет" ва "Мадааният" МФЙларда ичимлик суви тармоқлари ва иншоотларини қуриш ва реконструкция қилиш | 13,0 км | 2023 йил | 7 178,33 | ИД | 180,00 | 100,00 | 80,00 | 80,00 | | № 22- 2021 й/1-2 30.09.2021 | "Шакарсозлик дизайн" МЧЖ |
| | | 17,5 км 4 та объект | 2023 йил | 7 141,97 | ИД | 89,33 | 55,00 | 34,33 | 34,33 | | | |

| № | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|---|---------------------------------|--------------|------------------|----|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|----|-----------------------------------|---|
| № | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Земин тумани, "Нурфилон" ҚФЙлариди ичимлик суви тармоқлари ва илшоотларини куриши | 10,0 км 2та объект | 2023 йил | 2 960,94 | ИЛ | 84,21 | 55,00 | 29,21 | 29,21 | | № 24- 2021лт/1-2 30.09.2021 | "Азиза лойиҳа" МЧЖ |
| 9 | Земин тумани, "Бешкуй" МФЙда ичимлик суви тармоқлари ва илшоотларини куриши | 4,9 км 1та объект | 2023 йил | 1 761,53 | ИЛ | 89,33 | 62,53 | 26,80 | 26,80 | | № 21- 2021лт/1-2 30.09.2021 | "Еlegant project" МЧЖ |
| 10 | Фориш тумани, "Осмоноий", "Ўзбекистон", "Э.Камолов", "Боттали" аҳоли пунктларида ичимлик суви тармоқлари ва илшоотларини куриши | 16,0 км 1та объект | 2023 йил | 6 363,52 | ИЛ | 189,57 | 100,00 | 89,57 | 89,57 | | № 29- 2021лт/2 30.09.2021 | "АРСН ПРО АРСНТЕСТS ПРОЕСТ" МЧЖ |
| | Қашқадарё вилояти | 94,5 км 11 та объект | | 59 641,35 | | 878,90 | 279,73 | 599,17 | 599,17 | | | |
| 11 | Шархисабз тумани "Мираж" МФЙ оқова суи тизимини реконструкция қилиш | 9,1 км 1та объект | 2022 йил | 10 405,84 | | 300,00 | | 300,00 | 300,00 | | | Тендер орқали танланади |
| 12 | Чирқочи тумани "Бешчашма" хулуиди суи олиш илшооти, "Айритом" ва "Шўркўлук" МФЙларда ичимлик суи тизимларини куриши | 78,7 км 9та объект | 2022 йил | 43 625,46 | ИЛ | 465,00 | 200,00 | 265,00 | 265,00 | | №-5/5/22 30.09.2021 й | "Шўхрат қурилиш лойиҳа" х/к |
| 13 | Қарши тумани «Меъвзор» МФЙга ичимлик суи тармоқларини куриши | 10,0 км 1та объект | 2022 йил | 5 610,05 | ИЛ | 113,90 | 79,73 | 34,17 | 34,17 | | №-6/0/22 30.09.2021 й | "Проектный Институт Узбеккоммуналлоиҳа" ДУК |
| | Навоний вилояти | 62,1 км 3та объект | | 43 616,43 | | 1 026,90 | 127,04 | 899,87 | 899,87 | | | |
| 14 | Қизилтепа тумани маркази оқова суи тизимларини куриши | 33,0 км 3 та объект | 2022-2023 йй | 22 233,30 | ИЛ | 580,00 | 60,00 | 520,00 | 520,00 | | № 21-6 04.10.2021 й | "Алтер интернационал проект бранч" МЧЖ |
| 15 | Зарафшон шаҳри 19-кичиқ туманга канализация тармоқларини куриши | 5,7 км | 2022 йил | 7 800,30 | ИЛ | 70,00 | 10,50 | 59,50 | 59,50 | | № 21-4 04.10.2021 й | "Ўзбеккоммуналлоиҳа қурилиш" ДУК |
| 16 | Зарафшон шаҳри "Янги Зарафшон" маҳалласига ичимлик суи тармоқларини куриши | 12,0 км | 2022 йил | 2 194,00 | ИЛ | 69,90 | 10,49 | 59,42 | 59,42 | | № 21-2 04.10.2021 й | "Ўзбеккоммуналлоиҳа қурилиш" ДУК |
| 17 | Зарафшон шаҳри Саннат хулуиди қурилатган намунали уйлар (кемпинг) учун ичимлик суи тармоқларини куриши | 4,1 км | 2022 йил | 2 193,22 | ИЛ | 93,00 | 13,95 | 79,05 | 79,05 | | № 21-1 04.10.2021 й | "Ўзбеккоммуналлоиҳа қурилиш" ДУК |
| 18 | Зарафшон шаҳри 13-14-кичиқ туманларга канализация тармоқларини куриши | 7,3 км | 2022 йил | 9 195,62 | ИЛ | 214,00 | 32,10 | 181,90 | 181,90 | | № 21-3 04.10.2021 й | "Ўзбеккоммуналлоиҳа қурилиш" ДУК |
| | Самарқанд вилояти | 94,8 км 4 объект | | 33 500,00 | | 1 005,00 | | 1 005,00 | 1 005,00 | | | |

| № | Объектлар номи ва манзили | Дойиҳа қураёти хос барқарорлик | Қурилиш бошланғич ва фойдаланишга топшириш йили | Объект қурилишининг ҳисобий (дастлабки) тахминий қиймати | Дойиҳа босқичи ДТИА, ДТНХ, ТИА, ТИХ, Л. ИХ, ИЛ, ТХ | Объектнинг дойиҳа-қилирив ишлари қиймати* | Дойиҳа бошлан 01.01.22 й. ҳолатига бажарилган дойиҳа-қилирив ишлари | 01.01.22 й. ҳолатига дойиҳа-қилирив ишлари қолдиқ қиймати | 2022 йил учун қилинган қилирив ишлари лимити | Дойиҳа-смета ҳужжатларини буюртмачига топшириш муддати (ой, йил) | Тендер (танлов)лар натижасига бўйича бўйноқ рақами ва санаси | Дойиҳачи таъкилот номи |
|----|--|--------------------------------|---|--|--|---|---|---|--|--|--|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 19 | Каттакўрғон тумани "Номозовдон", "Қумушқирғок", "Янгиқеҳ", "Саройкўрғон", "Омонбойқирғок" ва "Ўзар" маҳаллаларда ичимлик сув тизимини қуриш ва реконструкция қилиш | 45,8 км 2 объект | 2022 йил | 17 000,00 | ИЛ | 510,00 | ✓ | 510,00 | 510,00 | ✓ | | Тендер орқали танланади |
| 20 | Пахтачи тумани "Гурўгли", "Тинчлик", "Қурпа", "Қувондик", "Сардоба" ва "Хунарман" маҳаллаларда ичимлик сув тизимини қуриш ва реконструкция қилиш | 49,0 км 1 объект | 2022 йил | 16 500,00 | ИЛ | 495,00 | ✓ | 495,00 | 495,00 | ✓ | | Тендер орқали танланади |
| 21 | Сурхондарё вилояти | 92,2 км 3 объект | | 15 278,33 | | 388,62 | 233,17 | 155,45 | 155,45 | | | |
| 21 | Қумқўрғон тумани "Чўқирин", "Исломобод", "Шерозий" ва "Ғалаба" маҳаллаларини ичимлик суви тизимларини қуриш (2-босқич) | 63,6 км 2 объект | 2022 йил | 8 050,95 | ИЛ | 173,50 | 104,10 | 69,40 | 69,40 | ✓ | №94 29.10.2021й | "Саловат-Сифат Дойиҳа" МЧДЖ |
| 22 | Денов тумани "Озоғ" МФЙдаги ичимлик суви тармоғини қуриш | 28,6 км 1 объект | 2022 йил | 7 227,37 | ИЛ | 215,13 | 129,08 | 86,05 | 86,05 | ✓ | №96 29.10.2021й | "Саловат-Сифат Дойиҳа" МЧДЖ |
| 23 | Тошкент вилояти | 34,1 км | | 27 639,06 | | 543,00 | 217,30 | 325,70 | 325,70 | | | |
| 24 | Бўстонлик тумани "Эшакқўриқсой" олма қўлиғини ва магистрал оқова сув коллекторини (д-800 мм) реконструкция қилиш | 0,2 км | 2022 йил | 10 000,00 | ил | 200,00 | ✓ | 200,00 | 200,00 | ✓ | | Тендер орқали танланади |
| 23 | Охангарон тумани "Алшар" МФЙга ичимлик суви тармоқларини қуриш | 3,6 км | 2022 йил | 1 380,00 | ИЛ | 36,00 | 25,20 | 10,80 | 10,80 | ✓ | 43-сон 26.10.2021й | "Мирзачўлағройдойиҳачу рилиш" МЧДЖ |
| 24 | Охангарон тумани "Чувилдоқ" МФЙга ичимлик суви тармоқларини қуриш | 3,7 км | 2022 йил | 2 633,49 | ИЛ | 37,00 | 25,90 | 11,10 | 11,10 | ✓ | 44-сон 26.10.2021й | "Мирзачўлағройдойиҳачу рилиш" МЧДЖ |
| 25 | Охангарон тумани "Янгиобод" МФЙга ичимлик суви тармоқларини қуриш | 4,2 км | 2022 йил | 3 181,06 | ИЛ | 41,00 | 28,70 | 12,30 | 12,30 | ✓ | 45-сон 26.10.2021й | "Мирзачўлағройдойиҳачу рилиш" МЧДЖ |
| 26 | Охангарон тумани "Қорасувёка" МФЙга ичимлик суви тармоқларини қуриш | 7,0 км | 2022 йил | 5 297,84 | ИЛ | 76,00 | 53,20 | 22,80 | 22,80 | ✓ | 46-сон 26.10.2021й | "Мирзачўлағройдойиҳачу рилиш" МЧДЖ |

| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|---|------------------------------|---|---|--|--|--|---|---|--|--|-----------------------------------|----|
| ТР | Объектлар номи ва манзили | Лойиҳа қурағчи хос барлиқсиз | Қурилиш бошланғич ва фойдаланишга топшириш йили | Объект қурилишининг ҳисобий (давсалабки) таҳминий қиймати | Лойиҳа босқич ДТИА, ДТНХ, ТИА, ТИХ, Л.ИХ, ИЛ, ТХ | Объектнинг лойиҳа-қилирув ишлари қиймати | Лойиҳа бошланғич 01.01.22 й. ҳолатига бажарилган лойиҳа-қилирув ишлари | 01.01.22 й. ҳолатига лойиҳа-қилирув ишлари қолдиқ қиймати | 2022 йил учун қантал қилинмавлар лимити | Лойиҳа-смета ҳужжатларини буюртмачига топшириш мuddати (ой, йил) | Тилиер (тадил)лар натижасиза бўлишча баённома рақами ва санаси | Лойиҳачи тапиклилот номи | |
| 29 | Охангарон тумани "Т'елов" МФЙга ичимлик суви гармоқларини қуриш | 10,0 км | 2022 йил | 2 961,68 | ИЛ | 96,00 ✓ | 67,20 ✓ | 28,80 | 28,80 | ✓ | 51-сон 26.10.2021 й | "АРСНТЕСТS ПРОЕКТ ГРУП" МЧЖ | |
| 30 | Охангарон тумани "Санам" МФЙга ичимлик суви гармоқларини қуриш | 5,6 км | 2022 йил | 2 185,00 | ил | 57,00 ✓ | 17,10 ✓ | 39,90 | 39,90 | ✓ | № 49 26.10.2021 й | "SMART АРСНЕНС" МЧЖ | |
| | Хоразм вилояти | 22,0 км 1та объект | | 50 000,00 | | 530,60 | 200,00 | 330,60 | 330,60 | | | | |
| 31 | Кўшқўпир туман марказида оқова сув тизимини қуриш | 22,0 км 1та объект | 2022-2023 йиллар | 50 000,00 | ИЛ | 530,60 ✓ | 200,00 ✓ | 330,60 | 330,60 | ✓ | № 30-Л 27.11.2021 й | "Ўзбекистонмуналоиҳа қурилиш" ДУК | |

(*) Объектларга "Шаҳарсозлик ҳужжатлари экспертизаси"нинг ижобий ҳукмаси олингандан кейин **ОБЪЕКТ ВА ЛОЙИҲА ҚИЛИРУВ ИШЛАРИ** қийматига аниқлик киритилди.



"Киритилди"
"Сув таъминоти ва оқова сув объектлари қурилиши бўйича илҳимиринг компанияси" ЖСК
Директори
Х. Муробов
2022 йил "18" _____

"Келишилди"
Ўзбекистон Республикаси
Модия вазирлиги
2022 йил "18" _____

"Келишилди"
Ўзбекистон Республикаси
Иқтисодий тараққиёт ва камбағалликни қисқарттириш вазирлиги
2022 йил "18" _____

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
