



**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***  
к договору (контракту) от 25.08.2022 г. № 65-9-123-ОВ/2022

между **ABDUL-ALI-JON HAMKOR** и **Боёвут тумани Ободонлаштириш бошкармаси** на общую сумму **76762224,00**

Глава \_\_\_\_\_ 110  
Казначейский лицевой счёт \_\_\_\_\_ 100022860242127045203110005

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4233100			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август	76 762 224,00			76 762 224,00
Сентябрь				
Октябрь				
Ноябрь				
Декабрь				
<b>Всего за год</b>	<b>76 762 224,00</b>			<b>76 762 224,00</b>

Всего 76762224,00 сум

Семьдесят шесть миллионов семьсот шестьдесят две тысячи  
двести двадцать четыре сум 00 тийин  
сумма прописью


Из вышеуказанной суммы 23028667,20 сум или 30,00%\*\*\* от общей суммы договора подлежат предоплате в \_\_\_\_\_ мес. 20\_\_ г.


(\*) – Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(\*\*) – Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода.


(\*\*\*) – Месячный \_\_\_\_\_ % от указанной выше суммы который необходимо оплатить до \_\_\_\_\_ числа текущего месяца (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах )

Руководитель заказчика  
  
Главный бухгалтер заказчика

  
\_\_\_\_\_  
(подпись) **Н.А.Бойжигитов**  
Ф.И.О.

  
\_\_\_\_\_  
(подпись) **Э.Р.Музаффаров**  
Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения \_\_\_\_\_  
(подпись)

Получил работник заказчика   
(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 133301 на приобретение «Sirdaryo viloyati Boyovut tumani "Markaz" MFY Baxoriston ko`chasini joriy ta`mirlash.»**

Способ проведения электронный

Дата 13.08.2022

Время рассмотрения 13.08.2022 20:15

Конкурсная комиссия Боёвут туман ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	BOYJIGITOV PO`LAT ALLAYAROVICH	пердседатель комиссии	Ободонлаштириш бошкармаси
<b>Секретарь комиссии</b>	ALIMOV AKMAL GAYBULLAYEVICH	секретарь комиссии	ободонлаштириш бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	XUDAYBERDIYEV AKBARKUL MURADOVICH	член комиссии	ободонлаштириш бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	IRGASHEV ABDIMALIK SHUKUROVICH	член комиссии	ободонлаштириш бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	DJALOLOV SHERBEK ORIFJONOVICH	член комиссии	ободонлаштириш бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	ISAKOV FARXOD BAXTIYOROVICH	член комиссии	ободонлаштириш бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 13.08.2022 года № лота 133301.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог</b>
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	76 762 224.00
Стартовая сумма	76 762 224.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Иштирокчининг иш тажрибаси

Тип: Числовое значение

Описание: Иштирокчининг иш тажрибаси 4 (турт) йилдан кам булмаслиги шарт

Обязательность: Критично

Требование заказчика: Не менее: 4 год

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО VARQIN NURI	25	25	25	Системная		
ЧП ABDUL-ALI-JON HAMKOR	25	25	25	Системная		
OZOD MALIKA YO'L QURILISH MCHJ	25	2022	25	Системная		
ООО SIRDARYO YUKSALISH SAVDO	25	25	25	Системная		
ООО SHOXYZAMON AFZAL HAMKOR	25	4	25	Системная		

Критерий №2 Иштирокчи томонидан охирги 4 (турт) йил давомида бажарган ва топширган ишлари

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчи томонидан охирги 4 (турт) йил давомида бажарган ва топширган ишлари

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО VARQIN NURI	25	25	19	Экспертная		
ЧП ABDUL-ALI-JON HAMKOR	25	25	24	Экспертная		
OZOD MALIKA YO'L QURILISH MCHJ	25	25	20	Экспертная		
ООО SIRDARYO YUKSALISH SAVDO	25	25	15	Экспертная		
ООО SHOXYZAMON AFZAL HAMKOR	25	Маълумот тақдим этилмақда	20	Экспертная		

Критерий №3 Ишчилари сони ва зарур техникалар тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчиларнинг ишчилари сони 15 тадан кам булмалиги ва солиқ органларидан руйхатга олинган булиши шарт ва зарур техникалар тугрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО VARQIN NURI	25	25	19	Экспертная		
ЧП ABDUL-ALI-JON HAMKOR	25	25	24	Экспертная		
OZOD MALIKA YO'L QURILISH MCHJ	25	25	21	Экспертная		
ООО SIRDARYO YUKSALISH SAVDO	25	25	10	Экспертная		
ООО SHOXYZAMON AFZAL HAMKOR	25	маълумотнома тақдим этилмақда	10	Экспертная		

Критерий №4 кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Бажариладиган ишларни уз вактида ва сифатли бажариш буйича кафолат хати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО VARQIN NURI	10	10	10	Экспертная		
ЧП ABDUL-ALI-JON HAMKOR	10	10	10	Экспертная		
OZOD MALIKA YO'L QURILISH MCHJ	10	10	10	Экспертная		
ООО SIRDARYO YUKSALISH SAVDO	10	10	10	Экспертная		
ООО SHOXYZAMON AFZAL HAMKOR	10	маълумот тақдим этилмақда	10	Экспертная		

Критерий №5 Иштирокчининг солик органларидан карздорлиги йуклиги тугрисида охирги маълумот (онлайн олинган маълумот булиши шарт)

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчининг солик органларидан карздорлиги йуклиги тугрисида охирги маълумот (онлайн олинган маълумот булиши шарт)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО VARQIN NURI	15	15	15	Экспертная		
ЧП ABDUL-ALI-JON HAMKOR	15	15	15	Экспертная		
OZOD MALIKA YO'L QURILISH MCHJ	15	25	15	Экспертная		
ООО SIRDARYO YUKSALISH SAVDO	15	15	10	Экспертная		
ООО SHOXYZAMON AFZAL HAMKOR	15	маълумот тақдим этилмақда	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО SHOXYZAMON AFZAL HAMKOR	76 762 224.00	75 000 000.00 UZS	75 000 000.00	00.00	75 000 000.00	12.08.2022 08:47:30	09.33
ООО VARQIN NURI	76 762 224.00	72 924 113.00 UZS	72 924 113.00	00.00	72 924 113.00	10.08.2022 14:35:22	09.60

ЧП ABDUL-ALI-JON HAMKOR	76 762 224.00	76 762 224.00 UZS	76 762 224.00	00.00	76 762 224.00	11.08.2022 19:21:20	09.12
ООО SIRDARYO YUKSALISH SAVDO	76 762 224.00	74 459 357.00 UZS	74 459 357.00	00.00	74 459 357.00	12.08.2022 08:38:39	09.40
ОЗОД МАЛИКА YO'L QURILISH MCHJ	76 762 224.00	70 000 000.00 UZS	70 000 000.00	00.00	70 000 000.00	12.08.2022 02:16:57	10.00

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО SHOZAMON AFZAL HAMKOR	67.5	9.33	76.83
ООО VARQIN NURI	79.2	9.6	88.8
ЧП ABDUL-ALI-JON HAMKOR	88.2	9.12	97.32
ООО SIRDARYO YUKSALISH SAVDO	63	9.4	72.4
ОЗОД МАЛИКА YO'L QURILISH MCHJ	81.9	10	91.9

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 133301 от 13.08.2022 года на приобретение «Sirdaryo viloyati Boyovut tumani "Markaz" MFY Baxoriston ko'chasini joriy ta'mirlash.» определила победителем:

ЧП ABDUL-ALI-JON HAMKOR  
303362766

и резервный исполнитель: ОЗОД МАЛИКА YO'L QURILISH MCHJ (303028705)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	BOYLIGITOV PO'LAT ALLAYAROVICH	Согласен	
Член комиссии	XUDAYBERDIYEV AKBARKUL MURADOVICH	Согласен	
Член комиссии	IRGASHEV ABDIMALIK SHUKUROVICH	Согласен	
Член комиссии	DJALOLOV SHERBEK ORIFJONOVICH	Согласен	
Член комиссии	ISAKOV FARXOD BAXTIYOROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

"УТВЕРЖДАЮ"

Боёвут туман



Боёвут туман Ободонлаштириши бошкармаси  
П.Бойжигитов

2022 г.

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК

Раздел 1. Основные данные по стройке

1	Наименование и местонахождение стройки	Сирдарё вилояти Боёвут туман Марказ МФЙ Бахористон кучаси жорий таъмирлаш ишларини бажариши учун
2	Отрасль	Коммунальный услуг
3	Инвестор	Местный бюджет
4	Заказчик	Боёвут туман Ободонлаштириши бошкармаси
5	Разработчики	"ADONIS PROJEKT" МЧК
5.1.	ТЭО	
	ПСД и / или ТД	"ADONIS PROJEKT" МЧК
5.3.	Экспертизы	"SHAXARSOZLIK HUUJATLARI EKSPERTIZASI" DUK
6	Генеральный подрядчик	"ABDUL-ALI-JON-HAMKOR" МСНД
7	Источник финансирования	Местный бюджет
8	Срок начала и окончан строительства	2022 г.
9	Основные показатели стройки:	по ПСД
	Мощность (в соотв.ед.измер.)	объект
	Основные фонды	79568803,00
	Капитальные вложения	79568803,00
	Строительно-монтажные работы	76762224,00
	Оборудование, инвентарь	0,000
	Прочие работы и услуги	2806579,00
	Содержание службы заказчика	


ПРОГНОЗ на 2022 г. в соответствии с согласованным с ММЭС и МФ адресным списком	В действующих ценах (млн.сум)
Мощность (в соотв.ед.изм.)	объект
Основные фонды	79568803,00
Капитальные вложения	79568803,00
Строительно - монтажные работы	76762224,00
Оборудование, инвентарь	0,00
Прочие работы и услуги	2806579,00
Содержание службы заказчика	0,000

Раздел II. Поквартальная разбивка прогноза на 2022 г.

ПРОГНОЗ на 2022 г. в соответствии с согласованным с ММЭС и МФ адресным списком	( в текущих ценах, млн.сум)				
	Всего	в том числе по кварталам:			
		I	II	III	IV
Ввод мощности	объект	объект	объект	объект	объект
Основные фонды	79568803,00			79568803,00	
Капитальные вложения	79568803,00			79568803,00	
СМР, оборудование	76762224,00			76762224,00	
Прочие работы и услуги	2806579,00			2806579,00	
Содержание службы заказчика	0,00			0,00	

"ABDUL-ALI-JON-HAMKOR" МСНД:-

*А. Мавлонбердиев*

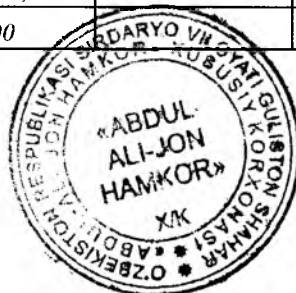

А. Мавлонбердиев

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN  
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA**  
IJRO.GOV.UZ tizimi orqali ЭРИ билан тасдиқланган, Хужжат коди: KH7267015187

**1. Loyihaning turi: Shartnoma      RJ6043448077**

**2.Loyihaning nomi:** “ABDUL – ALI – JON HAMKOR” xususiy korxonalaraxbari A.Mavlonberdiev “Bajaruvchi” hamda Boyovut tuman Obodonlashtirish boshqarmasi rahbari P.Boyjigitov o'rtasida Markaz maxalla fuqarolar yig'inidagi “Baxoriston” ko'chasini joriy ta'mirlash umumiy summasi 76 762 224 so'mga tuzilgan.

**3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot:**

Shartnoma loyihasi Boyovut tuman Obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan 23.08.2022 yilda kiritilgan.

**XULOSA:** Shartnoma loyihasi O'zbekiston Respublikasining 29.08.1998 yildagi “Xojalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida”gi Qonunining 10-14, 24-35-moddalari, O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 26-27 boblari, O'zbekiston Respublikasining “Davlat xaridlari to'g'risida”gi Qonuni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 27.09.2018 yildagi “O'zbekiston Respublikasining “Davlat xaridlari to'g'risida”gi Qonunini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-3953-sonli qarori bilan tasdiqlangan “Davlat buyurtmachilari tomonidan to'g'ridan-to'g'ri shartnomalar bo'eicha xarid qilinadigan(ishlar, xizmatlar) RO'YXATI” talablari asosida ishlab chiqilgan va uni imzolash maqsadga muvofiq.

**Markaz bosh yuriskonsul'ti**



**A.Axmadqulov**


**25.08.2022 yil**

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Боёвут тумани Ободонлаштириш

бошкармаси бошлиги

П.Бойжигитов



СИРДАРЁ ВИЛОЯТИ БОЁВУТ ТУМАНИ МАРКАЗ МФЙ БАХОРИСТОН КУЧАСИ  
ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ХУЖЖАТЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИКИШ

3-сонли йигилиш Баённомаси

1. Ўзбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тугрисида”ги 2021 йил 22 апрелдаги УРК – 684 сонли Қонунига асосан Боёвут тумани Ободонлаштириш бошкармасининг 11.04.2022 йил №- 2022-243-9-123-ОВ сонли буйругига асосан тузилган ички идоравий энг яхши таклифни танлаш комиссиялар таркибида куйидаги аъзолар катнашди.

Танлов комиссияси раиси

Ободонлаштириш бош бошкармаси бошлиги: П.Бойжигитов

Комиссия котиби

Бош муҳандиси

А. Иргашев

Комиссия аъзолари

Объектларни саклаш булим бошлиги

А.Худойбердиев

Инфратузилма булим бошлиги

Ш.Джалолов

Агроном

Ф.Исаков

Тех надзор

А.Алимов

КУН ТАРТИБИ

Сирдарё вилояти Боёвут тумани Марказ МФЙ Бахористон кучасини жорий таъмирлаш хужжатларини ишлаб чиқиш ишларини танлаб олиш,

Кун тартибидаги масала юзасидан Боёвут туман Ободонлаштириш бошкармаси П.Бойжигитов йигилганларга очик бюджет харажатлар сметасидаги маблагдан жорий таъмирлаш ишлари буйича товар хом-ащё биржасига 2022 йил 13 август ЛОТ 133301 раками ва 76 762 224 суммаси билан эълон жойлаштирилганлигини ва жойлаштирилган эълонда куйидаги параметрлари курсатиб утди.

№	Объект номи ва манзили	“ABDUL ALI-JON HAMKOR” MCHJ	
		Нархи (сумда)	Бажариш
1	Сирдарё вилояти Боёвут тумани Марказ МФЙ – Бахористон кучасини жорий таъмирлаш хужжатларини ишлаб чиқиш ишлари	76 762 224	20



Харид комиссияси аъзоларида мазкур лот(лар) иштирокчилари билан афилланганлик хусусиятига эга алокалар мавжуд эмас.

Узбекистон Республикасининг “Давлат харидлари тугрисида”ги қонунининг (УРК-684-сон, 22.04.2021 й) 23-моддасига кура, иштирокчи ва унинг афилланган шахси мазкур лот(лар) иштирок этмаяпти.

Маълумотлар stat.uz саҳифаси орқали текширилди.

Ушбу ЛОТ 133301 сонли лот рақами бўйича Боевут тумани Ободонлаштириш бошқармаси томонидан тасдиқланган танлаш баённомаси юзасидан ҳеч қандай эътироз ёки норозиликлар юзага келмади.

Овозга қуйиш натижасида “**ABDUL ALI-JON HAMKOR**” МСНЖ голиб чиқди.

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда ҳайат

#### ҚАРОП ҚИЛАДИ:

1. “**ABDUL ALI-JON HAMKOR**” МСНЖ, ташкилотидан тушган таклифлари эътиборга олинсин.
2. Танлов голиби этиб, “**ABDUL ALI-JON HAMKOR**” МСНЖ эълон қилинсин ва ушбу ташкилот билан 76 762 224 сумга шартнома тузилиши маъқуллансин.

#### ТАНЛОВ КОМИССИЯСИ РАИСИ

Ободонлаштириш бош бошқармаси бошлиғи:

П.Бойжигитов


#### КОМИССИЯ АЪЗОЛАРИ

Бош муҳандиси



А. Иргашев

Объектларни саклаш бўлим бошлиғи



А. Худойбердиев

Инфратузилма бўлим бошлиғи



Ш. Джалолов

Агроном



Ф. Исаков

Тех надзор

А. Алимов

Боёвут туман Марказ махалла фуқаролар йиғинидаги “Бахористон”  
кўчасини жорий таъмирлаш -сонли шартномага 1-илова

Боёвут туман Марказ махалла фуқаролар йиғинидаги “Бахористон” кўчасини жорий таъмирлаш бўйича

МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ

№	Иш тури ва номи	2022 йил жами	2022 йилда бажариладиган ишлар учун молиялаштириш графиги												СУМЛА			
			январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр				
1	Шартноманинг бахосининг 30% миқдорда аванс	23 028 667,2											23 028 667,2					
2	Берилган авансни қайтарилган ҳолда бажарилган ишларнинг 100% миқдорда молиялаштириш	53 733 556,8											53 733 556,8					
	<b>жами</b>	<b>76 762 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 762 224,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

БҮЮРТМАЧИ  
Боёвут тумани Ободлаштириш бош қармаси  
П.Бойжигитов



Боёвут туман Марказ махалла фуқаролар йиғинидаги “Баҳористон”  
кўчасини жорий таъмирлаш -сонли шартномага 2-илова

Боёвут туман Марказ махалла фуқаролар йиғинидаги “Баҳористон” кўчасини жорий таъмирлаш бўйича

### БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ

сумда

№	Иш тури ва номи	2022 йил жами	2022 йилда бажариладиган ишлар графиги														
			январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр			
1	Боёвут туман Марказ махалла фуқаролар йиғинидаги “Баҳористон” кўчасини жорий таъмирлаш	76 762 224									76 762 224						
	<b>ЖАМИ</b>	76 762 224	0	0	0	0	0	0	0	0	76 762 224	0	0	0	0	0	0

БҮЮРТМАЧИ  
Боёвут туман Ободонлаштириш бош кармаси  
П.Бойжигитов



## **PUDRAT SHARTNOMASI**

25«8»2022 yil.

**65-9-123-OB/2022-son**

“ABDUL – ALI – JON HAMKOR ” xususiy karxona nomidan Nizom asosida ish yurituvchi raxbari A.Mavlonberdiev bir tomondan (bundan buyon matnda “Bajaruvchi” deb yuritiladi) hamda Boyovut tuman Obodonlashtirish boshqarmasi nomidan Nizom asosida ish yurituvchi raxbari P.Boyjigitov , ikkinchi tomondan (bundan buyon matnda “Buyurtmachi” deb yuritiladi) quyidagilar haqida mazkur shartnomani tuzdik:

### **I. SHARTNOMA PREDMETI**

1.1. “Bajaruvchi” ushbu Shartnoma shartlariga muvofiq, Boyovut tuman Markaz maxalla fuqarolar yig'inidagi “Baxoriston” ko'chasini joriy ta'mirlash majburiyatini oladi, “Buyurtmachi” ushbu xizmatlarni va tovarlarni qabul qilish va haqini to'lash majburiyatini oladi.

### **II. TOMONLARNING HUQUQLARI VA MAJBURIYATLARI**

2.1. Buyurtmachining xuquqlari:

- bajaruvchidan texnik shartlarga lozim darajadagi xizmatlarni ko'rsatishni talab qilish;
- lozim darajadagi sifatda xizmat ko'rsatilmagan taqdirda, o'z xohishiga ko'ra quyidagilarni talab qilish:
- kamchiliklarni bepul bartaraf etish yoki Buyurtmachining yoki uchinchi shaxsning kamchiliklarni bartaraf etishga doir xarajatlarini qoplash;
- bahosini mutanosib ravishda pasaytirish;
- shartnoma shartlarining bajarilmaganligi yoki lozim darajada bajarilmaganligi natijasida yetkazilgan zararni qoplashni talab qilish.

2.2. Buyurtmachining majburiyatlari:

- ushbu Shartnoma shartlariga muvofiq ko'rsatilgan xizmatlarni qabul qilish;
- ushbu Shartnomaga muvofiq ko'rsatilgan xizmatlar uchun to'lovlarni amalga oshirish.

2.3. Bajaruvchining huquqlari:

- buyurtmachidan amaldagi qonunchilikda belgilangan tartibda va hajmda ko'rsatilgan xizmatlar uchun oldindan to'lov va yakuniy hisob-kitoblarni amalga oshirishni talab qilish;
- buyurtmachidan bajarilgan ishni qabul qilishni asossiz ravishda rad etish natijasida yetkazilgan zararni qoplashni talab qilish;

2.4. Bajaruvchining majburiyatlari:

- ushbu shartnomaga muvofiq belgilangan tartibda u tomonidan taqdim etilgan texnik topshiriqqa binoan xizmatlarni belgilangan muddat, miqdor va sifatlar bo'yicha ko'rsatish;
- agar xizmat ko'rsatish jarayonida Bajaruvchi shartnoma shartlaridan va texnik shartlardan chetga chiqsa, Buyurtmachining talabiga binoan uch kun ichida aniqlangan barcha kamchiliklarni bepul bartaraf etish.

### **III. SHARTNOMA BAHOSI VA XISOB-KITOB QILISH TARTIBI**

3.1. Ushbu shartnomaning bahosi 76 762 224 (Yetmish olti million yetti yuz oltmish ikki ming ikki yuz yigirma to'rt ) so'm, QQS bilan.

Buyurtmachi taqdim etiladigan xizmatning 30 foizi miqdorida oldindan to'lovni amalga oshiradi va mablag' Bajaruvchining hisob raqamiga kelib tushgan sanadan boshlab ushbu shartnomaning majburiyatlari bajarilishi boshlanadi. Ko'rsatilgan xizmatlar uchun hisob-kitobning qolgan qismi bajarilgan ishlar to'g'risidagi dalolatnoma imzolanganidan keyin uch ish kuni ichida amalga oshiriladi.

3.2. Xizmatlar bo'yicha hisob-kitoblar bank o'tkazmasi orqali Bajaruvchining hisob raqamiga

o'tkazish yo'li bilan amalga oshiriladi.

#### IV. SHARTNOMANI BAJARISH

4.1. Shartnoma shartlari ushbu shartnoma va qonun hujjatlari talablariga muvofiq belgilangan tartibda amalga oshiriladi. Ishlarni amalga oshirish muddati : Boshlanishi 25.08.2022 yil, tugallanishi 15.09.2022 yil Agar tomonlar o'z zimmlariga olgan barcha majburiyatlarning bajarilishini ta'minlagan bo'lsa, shartnoma bajarilgan deb hisoblanadi.

4.2. Shartnomani bajarishdan bir tomonlama rad etishga yoki shartnoma shartlarini bir tomonlama o'zgartirishga yo'l qo'yilmaydi, qonunchilikda belgilangan hollar bundan mustasno. 4.3. Shartnoma bo'yicha majburiyatlarning bajarilishi sanasi hisobvaraqa-faktura tuzilgan kun deb hisoblanadi.

G'aznachilik shtampida ko'rsatilgan sana Buyurtmachining xizmatlar uchun to'lovlarni to'lash bo'yicha majburiyatlarini bajaradigan kun hisoblanadi.

4.4. Buyurtmachining roziligi bilan xizmatlar muddatidan oldin taqdim etilishi mumkin.

4.5. Buyurtmachi belgilangan muddatlarni buzgan holda ko'rsatilgan xizmatni qabul qilishni rad etishga haqlidir.

4.6. Belgilangan miqdordan ortiq bitta nomdagi xizmatni ko'rsatish xuddi shu texnik topshiriqqa kiritilgan boshqa nomdagi xizmatning kamchiliklarini to'ldirish deb hisoblanmaydi, kamchiliklar to'ldirilishi lozim, Buyurtmachining oldindan yozma roziligi bilan amalga oshiriladigan holatlar bundan mustasno.

4.7. Ko'rsatilayotgan xizmat to'g'ridan-to'g'ri Buyurtmachining mas'ul xodimlari tomonidan taqdim etilayotgan xizmatlar hajmi, ularning sifati ko'rsatilgan hisobvaraqa-faktura bo'yicha qabul qilinadi.

Shartnomada nazarda tutilgan xizmatlar ushbu shartnomaga muvofiq yoki ushbu shartnomada belgilangan muddatlarda va hajmlarda amalga oshiriladi. Buyurtma bevosita (qo'lda), pochta orqali yoki boshqa usul bilan xizmatlarni ko'rsatish nazarda tutilayotgan sana boshlanishidan besh kundan kechiktirmay taqdim etiladi. Buyurtma bevosita (qo'lda) qabul qilganda, Bajaruvchining xodimi Buyurtmachida qoladigan buyurtma nusxasida qabul qilinganligi to'g'risida belgi qo'yadi.

4.8. Buyurtmachi ilgari berilgan buyurtmani bekor qilishga yoki xizmatlarning tegishli qismini ko'rsatish sanasini Bajaruvchini buyurtmada ko'rsatilgan sanadan kamida bir kun oldin xabar bergan holda o'zgartirishga haqli.

#### V. TOMONLARNING JAVOBGARLIGI

5.1. Taqdim etilayotgan xizmatlarning sifati, miqdori, ularning bahosi Bajaruvchi tomonidan noto'g'ri belgilanganlik holati aniqlangan taqdirda, Bajaruvchi taqdim etilayotgan xizmatlarning sifati, shuningdek ularning miqdorini hisobga olgan holda qayta hisob-kitob ishlarini amalga oshiradi va ushbu hisoblangan summaga qo'shimcha ravishda mijozga noto'g'ri hisoblangan summaning 20% miqdorida jarima to'laydi.

5.2. Agar taqdim etilayotgan xizmatlarning sifati shartnomada ko'rsatilgan texnik va boshqa shartlarning talablariga javob bermasa, aybdor tomon taqdim etilgan sifati lozim darajada bo'lmagan xizmatlar bahosining 20% miqdorida jarima to'laydi.

5.3. Jarima va penyadan tashqari, Bajaruvchi Buyurtmachiga xizmatlarni taqdim etmaslik natijasida etkazilgan zararni qoplaydi.

5.4. Xizmatlar kechiktirilgan yoki ko'rsatilmagan taqdirda, Bajaruvchi Buyurtmachiga har bir kechiktirilgan kun uchun majburiyatning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, ammo jarimaning umumiy miqdori ko'rsatilmagan xizmatlar bahosining 50 foizidan oshmasligi kerak. Penyani to'lash shartnoma majburiyatlarini buzgan tomonni shartnomani to'g'ri bajarishdan va xizmatlarni kechiktirish yoki ko'rsatmaslik oqibatida yetkazilgan zararni qoplashdan ozod qilmaydi.

5.5. Ko'rsatilgan xizmatlar uchun to'lovni o'z vaqtida to'lamagan taqdirda, Buyurtmachi

Bajaruvchiga har bir kechiktirilgan kun uchun muddati o'tgan to'lov summasining 0,4 foizi miqdorida, lekin muddati o'tgan to'lov miqdorining 50 foizidan ko'p bo'lmagan miqdorda penya to'laydi.

5.6. Buyurtmachi shartnomaning tegishli shartini bajarmaganligi yoki lozim darajada bajarmaganligi uchun javobgarlikka tortilganda, tegishli harakat (harakatsizlik) natijasida Buyurtmachi tomonidan shartnoma shartlari bajarilmaganligi (lozim darajada bajarilmaganligi) yuzasidan Bajaruvchining javobgarligi ham ko'rib chiqiladi. Buyurtmachining Bajaruvchi aybi bilan shartnomani bajarmaganligi (lozim darajada bajarilmaganligi) natijasida yetkazilgan zarar, belgilangan tartibda Bajaruvchi tomonidan qoplanadi.

5.7. Tomonlarning ushbu shartnomada ko'zda tutilmagan javobgarlik masalalari O'zbekiston Respublikasining qonun hujjatlariga muvofiq hal qilinadi.

## VI. NIZOLARNI HAL ETISH TARTIBI

6.1. Tomonlar o'rtasida ushbu kelishuvdan kelib chiqadigan nizolar tomonlar o'rtasida muzokaralar yo'li bilan hal qilinadi.

6.2. Tomonlar o'rtasidagi muzokaralar yo'li bilan hal qilinmagan nizolar qonun xujjatlarida belgilangan tartibda iqtisodiy sud tomonidan hal qilinadi.

## VII. FORS-MAJOR HOLATLARI

7.1. Agar ushbu shartnoma tuzilgandan so'ng, ushbu shartnomada belgilangan majburiyatlarning biron bir tomonini to'liq yoki qisman to'g'ri bajarishiga to'sqinlik qiladigan holatlar yuzaga kelsa va agar bunday holatlar, ya'ni yong'in, toshqin, zilzila, boshqa tabiiy ofatlar, eksport yoki importga to'siqlar yoki embargolar, urush, jangovar harakatlar, terroristik harakatlar, ish tashlashlar (tomonlar ishchilarining ish tashlashlaridan tashqari), pandemiya, amaldagi qonunchilikdagi o'zgarishlar, davlat organlari va O'zbekiston Respublikasi Hukumati tomonidan qabul qilingan umumiy xarakterdagi qarorlar tomonlarning shartnoma shartlarini bajarishiga bevosita ta'sir qilsa, tegishli majburiyatlarning bajarilishi vaqti bunday holatlar bartaraf etilgan vaqtga yoki ularning oqibatlari tugashi vaqtiga ko'chiriladi.

7.2. Fors-major holatlari yuzaga kelgan Tomon, ushbu holat haqida shuningdek, holatning taxminiy davomiyligi to'g'risida boshqa Tomonni yozma ravishda 7 (yetti) kun ichida xabardor qilishi shart. Agar yuqorida ko'rsatilgan holatlar to'g'risida o'z vaqtida xabar berilmagan bo'lsa, yengib bo'lmas kuch ta'sirida zarar yetkazilgan Tomon ushbu holatlarni asos qilib ololmaydi.

7.3. Xabarnomada ko'rsatilgan faktlar rasmiy manbalar tomonidan berilgan hujjatlar bilan tasdiqlanishi kerak, shu jumladan, press-revizlar, biroq ular bilan cheklanmaslik lozim.

Bunday xabarnomaning yo'qligi, shuningdek tegishli dalillarning yo'qligi ushbu tomonni shartnoma majburiyatlarini bajarishdan ozod qilinishiga asos sifatida yuqoridagi holatlarni keltirish huquqidan mahrum qiladi.

7.4. Favqulodda vaziyatlar yuzaga kelgan taqdirda, tomonlar zudlik bilan o'zaro muzokaralar olib boradilar va favqulodda vaziyatlar oqibatlarini bartaraf etish yoki bartaraf etish maqsadida ko'riladigan choralar to'g'risida kelishib oladilar.

7.5. Agar fors-major holatlari yoki ularning oqibatlari tomonlarning o'z majburiyatlarini bajarishiga to'sqinlik qiladigan bo'lsa, tomonlarning har biri boshqa tomonga ushbu shartnomani bekor qilishning kutilayotgan sanasidan 10 (o'n) ish kuni oldin yozma ravishda xabar yuborganidan keyin ushbu shartnomani bekor qilish huquqiga ega. Bunday holda tomonlarning hech biri boshqa tomondan fors-major holatlari natijasida yetkazilgan zararni qoplashni talab qilishga haqli emas. Shuningdek, Bajaruvchi bajarilmagan majburiyatlari uchun Buyurtmachidan olingan barcha to'lovlarni Buyurtmachiga qaytaradi va Buyurtmachi Bajaruvchining bajarilgan barcha majburiyatlarini to'liq to'laydi.

## VIII. KORRUPTSIYAGA QARSHI KURASH

8.1. Ushbu Shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarayotganda Tomonlar, ularning sheriklari, ishchilari yoki vositachilari har qanday noqonuniy ustunliklarga yoki boshqa noqonuniy maqsadlarga erishish uchun bevosita yoki bilvosita pul mablag'lari yoki qimmatliklarni to'lashni amalga oshirmaydi.

8.2. Ushbu Shartnoma majburiyatlarini bajarayotganda Tomonlar, ularning sheriklari, ishchilari yoki vositachilari pora berish/olish, tijoriy pora olish, shuningdek amaldagi qonunchilik va xalqaro hujjatlarning talablarini buzadigan harakatlarni amalga oshirmaydilar. Jinoiy yo'l bilan topilgan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashishga oid xalqaro hujjatlar talablarini buzilishi kabi harakatlarni amalga oshirmaydi.

8.3. Ushbu Shartnoma Tomonlarining har biri boshqa Tomonning xodimlarini har qanday tarzda rag'batlantirishdan, shu jumladan pul mablag'lari, sovg'alar berish, ularga ish (xizmatlar)ni bepul bajarishi va ushbu bandda ko'rsatilmagan boshqa usullar bilan xodimning rag'batlantiruvchi tomon foydasiga har qanday harakatlarni sodir etishdan bosh tortadi.

Xodimning uni rag'batlantiruvchi tomon foydasiga amalga oshirgan harakatlari deganda quyidagilar tushuniladi:

- boshqa kontragentlar bilan taqqoslaganda asossiz ustunliklarni taqdim etish;
- har qanday kafolatlar bilan ta'minlash;
- amaldagi tartib-taomillarni tezlashtirish;
- xodim tomonidan o'z vazifalari doirasida amalga oshiriladigan, ammo Tomonlar o'rtasidagi munosabatlarning shaffofligi va ochiqligi tamoyillariga zid bo'lgan boshqa harakatlar.

8.4. Agar Tomonlardan biri mazkur shartnomaning 2-ilovasida keltirilgan korruptsiyaga qarshi kurashish shartlarini buzgan yoki buzishi mumkin deb gumon qilsa, ikkinchi Tomonni yozma ravishda xabardor qilishga majbur. Yozma xabarnomadan so'ng, tegishli Tomon ushbu Shartnoma bo'yicha majburiyatlarning bajarilishini buzilish sodir bo'lmaganligi yoki sodir bo'lmasligi tasdiqlangunga qadar to'xtatib turishga haqli. Ushbu tasdiq yozma xabarnoma yuborilgan kundan boshlab 5 (besh) ish kuni ichida yuborilishi kerak.

8.5. Yozma xabarnomada Tomon kontragent, uning sheriklari, ishchilari yoki vositachilari tomonidan ushbu shartlar va qoidalarning buzilganligi yoki buzilishi mumkinligini ishonchli tarzda tasdiqlaydigan yoki asoslashi mumkin bo'lgan faktlarga tayanishi yoki tegishli materiallarni taqdim etishga majbur, ya'ni pora olish/berish, tijoriy pora olish, shuningdek amaldagi qonunchilik va jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash bo'yicha xalqaro hujjatlar talablarini buzadigan harakatlar asoslantirilishi lozim.

8.6. Shartnomaning taraflari korruptsiyaning oldini olish choralarini ko'rish tartib-taomillarini tan oladi va ularga rioya etilishini nazorat qiladi. Bunda Tomonlar korruptsiyaviy faoliyat bilan shug'ullanishi mumkin bo'lgan kontragentlar bilan ishbilarmonlik munosabatlari xavfini minimallashtirish, shuningdek, korruptsiyaning oldini olish maqsadida bir-biriga o'zaro yordam berish uchun oqilona harakatlarni amalga oshiradilar. Shuningdek, Tomonlar korruptsiyaviy faoliyatga Tomonlarning ishtiroki xavfini oldini olish maqsadida tekshiruvlar o'tkazish tartib-taomillarini amalga oshirilishini ta'minlaydilar.

8.7. Tomonlar o'zlarining sodir etilishi mumkin bo'lgan noqonuniy xatti-harakatlari va ushbu Shartnomaning korruptsiyaga qarshi kurashish shartlarining buzilishi kontragentning ishonchligi reytingini pasaytirishidan tortib ushbu shartnomaning bekor qilinishigacha bo'lgan noxush oqibatlariga olib kelishi mumkinligini tan oladi.

8.8. Tomonlar maxfiylik tamoyillariga rioya qilgan holda ushbu Shartnomani bajarish doirasida keltirilgan faktlar bo'yicha tegishli tartib-taomillar amalga oshirilishini va amaliy qiyinchiliklarni bartaraf etish ya yuzaga kelishi mumkin bo'lgan nizoli vaziyatlarning oldini olish bo'yicha samarali choralarini qo'llashni kafolatlaydilar.

8.9. Tomonlar ushbu Shartnomaning korrupsiyaga qarshi kurashish shartlarini bajarish bo'yicha to'liq maxfiylikni, shuningdek, talablar buzilganligi faktlari to'g'risida xabar bergan Tomon uchun ham, shuningdek, xabar bergan Tomonning xodimlari uchun ham salbiy oqibatlar keltirmasligini kafolatlaydilar.

#### IX. SHARTNOMANING AMAL QILISHI

9.1. Ushbu shartnoma Tomonlar imzolagan kundan boshlab kuchga kiradi va 2022 yil 25 dekabr gacha amal qiladi.

9.2. Tomonlar o'rtasidagi munosabatlar ushbu shartnomaning barcha shartlari bajarilganda va hisob-kitoblar to'liq amalga oshirilganda tugaydi.

#### X. YAKUNIY QOIDALAR

9.3. Ushbu Shartnoma tomonlarning kelishuvi bilan yoki Tomonlardan birining talabiga binoan, boshqa tomon tomonidan shartnoma shartlari sezilarli darajada buzilgan taqdirda sud tomonidan bekor qilinishi mumkin.

9.4. Ushbu shartnomaga kiritilgan har qanday o'zgartirish va qo'shimchalar faqat yozma ravishda tuzilgan va taraflarning tegishli vakolatli vakillari tomonidan imzolangan taqdirda amal qiladi.

9.5. Ushbu shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo'lgan ikki nusxada tuzildi.

9.6. Ushbu shartnoma, unga kiritilgan o'zgartirishlar (qo'shimchalar) tomonlar tomonidan imzolangan paytdan boshlab oshiriladi.

#### XI. TOMONLARNING REKVIZITLARI VA IMZOLARI

Bajaruvchi: "ABDUL-ALI-JON HAMKOR"

Mansil: Guliston sh. A. Temur kuchasi 55

R/s: 20208000800475544001

Bank: ATB Kishloq qurilish bank

MFO: 01037 INN: 303362766



Raxbar:  A. Mavlonberdiev.

Buyurtmachi: Boyovut tuman obodonlashtirish boshkarmasi


R/s: 100022860242127045203110005

L/s: 2340200300100001010

Bank: Markaziy bank XKKM Toshkent sh.

MFO 00014 INN: 206946592

Raxbar: \_\_\_\_\_ P. Boyjigitov.

	<b>Hujjat <u>elektron raqamli imzo</u> orqali imzolangan.</b> Elektron raqamli imzoning haqiqiylikini tekshirish uchun <b>QR Code</b> ni skanerlang.	
	Imzolovchi F.I.SH.	PO'LAT BOYJIGITOV ALLAYAROVICH
	Imzolangan sana	25 apr 2022 15:07
	Hujjat kodi	<b>RJ6043448077</b>
	Hulosa kodi	<b>KH7267015187</b>





"ТАСНИҚЛАЙМАН"

Бўйбўту тумани ҳокими

У.У. Раҳмон

2022 йил

2022 йил Бўйбўту тумани бюджети параметрлари фуқароларни таъмирлаш учун ажратилган маблағ. Валларар Маълумотини 02.02.2022 йилда асосан,  
 "Очқик билан" ахборот порталига шикоятини, "Меннинг Булим" дастурига йўналтирилган  
 Бўйбўту тумани "Тулбон" ва "Марказ" маҳалла фуқаролар йиғини ҳудудларидан ички кўчаларни қуриш ва жорий таъмирлаш ишларинини  
 2022 йил МАЊИЦЕЛИ РУЊНАПИ

№	Объектлар номи ва мазмун	Қурилиш башланган ва фиданнинг тоталари йили	Даржа куратори(ка)	Олаётинин узловий кайфияти (шароити аҳоли) жўрналдан, бухгалтерия бошқа харажатлар	01.01.2022 йил ҳозирги объектнинг сўраш сўраш сўраш сўраш	01.01.2022 йил ҳозирги объектнинг сўраш сўраш сўраш сўраш	01.01.2022 йил ҳозирги объектнинг сўраш сўраш сўраш сўраш	2022 йил учун кўрсаткичлар			2022 йилда фиданнинг тоталари		01.01.2022 йил ҳозирги объектнинг сўраш сўраш сўраш сўраш	Тендер (даржа) пайжи бўлиши Билан рақам сўраш	Қўри либ қилини ш
								Жамо қўраш	Қўраш қўраш	Қўраш қўраш	Муддат қўраш	Асосий фонд қўраш			
1	Қишлоқ ва жорий таъмирлаш		0.284	188338.2 7413.2	188338.2 7413.2	188338.2 7413.2	188338.2 7413.2	175924.9 99162.7	7413.2 4886.6	2022 2022	108769.4 79568.8	108769.4 79568.8	38.53420 27.07.2022 й	"АРИҚ" А.Ш. КОН 13.08.2022 й НАНҚОН XX	
2	"Марказ" МФЙ ҳудуддан "Бозор" МФЙ ҳудуддан жорий таъмирлаш		0.122	79568.8 2886.6	79568.8 2886.6	79568.8 2886.6	79568.8 2886.6	76762.2	2886.6	2022	79568.8	79568.8	38.53420 30.07.2022 й	"АРИҚ" А.Ш. КОН 13.08.2022 й НАНҚОН XX	

"КИРИТИЛДИ"  
 Тумани ҳокими ўринбосари  
 П.Раҳмон  
 2022 йил



"КЕЛИШТИРИЛДИ"  
 Тумани ҳокими ўринбосари  
 Б.Алиқов  
 2022 йил



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida  
**GUVOHNOMA**

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

**"ABDUL-ALI-JON HAMKOR" Xususiy korxonasi**

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

**"ABDUL-ALI-JON HAMKOR" XK**

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

11.06.2015

131

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR)

303362766

Tashkiliy-huquqiy  
shakli:

**Xususiy korxonasi**

Joylashgan joyi:

**Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, A.Temur ko'chasi, 55-uy, 11-xonadon**

Guvohnoma:

**Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, YAGONA DARCHA tomonidan  
 MARKAZI berilgan**

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi)





1954  
JAN 10 1954  
U.S. DEPARTMENT OF STATE  
WASHINGTON, D.C.

RECEIVED  
JAN 10 1954  
U.S. DEPARTMENT OF STATE  
WASHINGTON, D.C.

ABDEL-AL-JON HAMKOP

SECRETARY OF THE ARAB LEAGUE

AND TAXPAYER

SECRET

TX 510101 III-2018



хизматлари, ташқи қишлоқ ҳаётига тайёр дори-дармонларнинг, дори воситаларнинг ширини, доринини босумли усуллик дори-дармонларни, аксонимилларни, дориларнинг препаратларини, асосий доруворчилик дору-доронини, дору воситаларни ва табиий уруқчалари билан кенг турдаги улгурчи ва ёқилма савдо қилиш; шифохоналар ва даволани муассасаларини таъмирлаш;

- қонунда белгилабган тартибда кенг турдаги мақина ва улгурчи савдо билан шуғулланиш; дорихона ва фитообъектлар таъмирлаш;
  - ҳушдорий ийфонани ва даволани муассасасини диспансери, давлати клиникалари ва тайёр хизматлари курситиш;
  - оргтехникалар, компьютер, кюроқончиларни таъмирлаш ва савдои;
  - компьютер ва интернет тармоқини қилиш курситиш;
  - иккиламчи ҳам амбарини йиғиш ва қайта юзиши;
  - полимер махсулотларини престлаш, қўйиш, ипсизитиш ва мақсуд билан паки бериш қилиш турдаги шастмасса буюмлари, жумладан маданий-маънавий ва ҳужалик буюмлари, қўйишдан престлаш усули билан қишлоқчи яки экиклар ишлаб чиқариш;
  - полимер илғика, қувурлар, дастлар иониклар, трубаалар, қонлар, ёчки, дўққир ва бошқа шастмасадан буюмлар ишлаб чиқариш;
  - бино ва иншоотларни қуриш ва таъмирлаш ишлари билан шуғулланиш;
  - қурилиш материаллари ишлаб чиқариш ва сотиш;
  - аҳолига кенг турдаги қонуна хизматлар курситиш;
  - шлакблок, гишт ва қурилишнинг бошқа материалларини ишлаб чиқариш;
  - кенг турдаги қурилиш ва таъмирлаш ишлари билан шуғулланиш;
  - қурилиш материаллари чакана ва улгурчи савдоси билан шуғулланиш;
  - эшик, ром, дурадгорлик махсулотларини ишлаб чиқариш ва сотиш;
  - суи, исеиклик, ирригация қувурларини ва канализация тизимларини таъмирлаш;
  - мебел деталлари, пружинали матрашлар, металл қарқасал мебеллар, мактаб ва болалар мебелли, кутубхоналар, музей ва дорихоналар учун махсус мебеллар ишлаб чиқариш;
  - мебелларни таъмирлаш ва тиклаш;
  - коғоз ва картон, целлюлоза-коғоз саноатининг бошқа иккиламчи махсулотларини йиғиш, қайта ишлаб чиқарувчи қорхоналарга сотиш, тайёр коғоз махсулотларини савдо марказларига чакана ва улгурчи сотиш;
  - нон ва нон махсулотлари ишлаб чиқариш ва сотиш;
  - ун махсулотларидан макарон ва кенг турдаги ширинликлар ишлаб чиқариш ва сотиш;
  - автомобиллар юзиш шахобчаси ва тухтан жойини очиш;
  - авиотеххизмат, вулканизация, аккумулятор цехлари таъкил қилиш;
  - авиотранспорт воситаларига газ балонлари ўрнатиш ишлари билан шуғулланиш;
  - авиотранспорт воситалари билан ҳар хил хизматлар курситиш;
  - ун, шодли ва арпа тегирмони ўрнатиш ва ишлатиш;
  - пахта тигиш ва тозалани ускуналарини ўрнатиш ва ишлатиш;
  - суи, газ, электр улчов ускуналарини таъмирлаш, ўрнатиш ва сотиб олиб қайта сотиш;
  - қонунда белгилабган тартибда қора ва рангли металлларни аҳолидан йиғиш, уларни қайта ишлаб чиқариш ҳамда қайта ишлаб чиқарувчи ташкилотларга сотиш;
  - тикувчилик ва энгил саноат махсулотларини ишлаб чиқариш ва сотиш;
  - юқорида курсатилган фаолиятни ва бошқа хизмат ва ишларни бажарган ҳолда пақд пул ва пул утказиш йули билан гуновларни амалга ошириш;
  - юқоридаги фаолият турларидан лицензия талаб этилувчи фаолият турлари қонунда белгилабган тартибда тегишли лицензияларни олгандан сунг амалга оширилади;
- 2.2. Қонуна белгилабган тартибда ташқи иқтисодий фаолият, экспорт ва импорт операцияларини бажариш.
- 2.3. Қонунчилик тақиқламаган бошқа фаолият турларини амалга ошириш

### 3. Қорхонани бошқариш.

Корхона раҳбарини маъмуриятнинг ҳуқуқи оғиб берилади. Буни корхона таъсисчилари ва корхона раҳбарлиги аниқ билади.

Корхона таъсисчиси корхонанинг олий органи ҳисобланади.

Корхонага таъсисчиси тайинлаган ва ишга қўйган раҳбар ваъма ҳужжатлари билан раҳбарлик қилади.

Корхона раҳбари корхона таъсисчиси оқибат ҳисобот бериб туради.

Корхона раҳбарининг ҳуқуқлари:

- корхона фаолияти билан боғлиқ масалаларни ҳал қилиш;
- корхона ишлари иккинчи даражада иш олиб бериши, маълумотлар ва ҳисоботларни бериши ва раҳбарлик қилиши ва таъсисчиларни шу корхона мақсадини қўллаш қилиши;
- корхона ишларини тасарруф қилиш, ресурсларни ва қорғиний қоралиш, таъкилот, корхона ва айрим ишлардан шартнома ва битимлар тузиши, банкларда қўшиб раҳбарлири ва бошқа раҳбарлик қилиши ва қўғозлари бериши;
- ишларнинг тартибини ишлаб чиқариши ва уларни иш;
- ишларнинг тартибини ишчиларни билиши ва билиши;
- ишларнинг бериши ҳодимлари учун мажбурий буюруқлар чиқариши ва ҳуқуқлар бериши;
- ишларнинг ва бошқарув ишларини раҳбарларини мустакил тайинлайди ва ишлар оқиб

Корхонанинг таркибий бўлинмалар раҳбарлари, бошқарув ишларини бошқаруши ва раҳбар қилиши корхона аҳволи ва қан қарорларини учун ҳисоб бериши.

**4. Корхонанинг мол-мулки ва маблағлари.**

Корхонанинг Устав жамғармаси **1 000 000 (биш миллион) сўм** миқдорда белгиланган ва қўғозлари хусусий қўчмас мулк, товар моддий бойликлар, нақд пул, транспорт воситалари ва моддий қўғозларни ишга қўйишида ташкил қилинади.

Устав фонди таъсисчи томонидан ошириш ҳамда қайтариш ҳуқуқига эга.

Корхона мулкни асосий фондлар ва айланма маблағларни, шунингдек қиймати қўғозларни мустакил балансда аниқ қилиш билан бойликлар ташкил қилинади.

Қўғозлар корхонанинг мулкни шакллантириш маблағлари ҳисобланади:

- ишчиларнинг пул ва моддий бадаллари;
- қўғозлар ва бошқа кредитчиларнинг кредитлари;
- қўғозлар билан ёки хайр-аҳсон бадаллари ва ташкилотлар, корхоналар ҳамда фуқораларнинг қўғозлари.

Корхона ушга қарашли бинаolari, иншоотларни, асбоб-ускуналарни, транспорт воситаларини, жиҳозларни, хом-ашё ва бошқа моддий бойликларни бошқа корхоналарга, таъсисчилар ва муассасаларга сотиш ва бериш, айир-қўйиш, ижарага топшириш ва олиш ёки қўғоз бериб туриш, шунингдек, уларни балансдан чиқариш ҳуқуқига эга.

Корхона маблағлари қуйидаги фондларга ажратилади: устав фонди, резерв фонди, қўғозларга ажратма фонди ва бошқа фондлар.

Корхона валюта фондни ташкил этиши мумкин. Бу фондни ташкил этиш ва ундан қўғозларни белгиланган тартибда амалга оширилади.

Корхона уз фаолиятининг натижаларига мос равишда баланс фойдасидан 10% қўғозларни таъсисчи фондига ажратилади.

Корхонадан бюджетга, таъсисчига ҳамда солиқ туламини ажратилган кейин қолган қисми қўғозларни ҳисоблашиб, уни корхона уставига мувофиқ ишлатади.

**5. Ҳўжалик фаолияти.**

Корхона уз фаолиятини мустакил режалантиради. Хом-ашё ресурсларни ва қўғозларининг мавжудлигини ҳамда ишлаб чиқарилаётган маҳсулотларга, бажарилаётган ишга қўғозлар билан хизматга бўлган талабларни ҳисобга олиб таркибни истиқболни белги қилиди.

Корхона давлат эҳтиёжлари учун шартнома асосида ишлар бажарали, маҳсулот сотали ва қўғоз берилади.

Корхона уз истиқболни учун қуйидагиларни амалга ошириши мумкин:

...ишга асосий фойдага тайёарлик мулкдор хисоблари ва бодний техника жихозларини бошқа ташкилотлардан ... бирим шахслардан нақд ёки нақд пуисит сотиб олиш. ... фойдаланиш; ... банк муассасаларидаги хисоб ракамларида савлаш ва хисоб-китоб, кредит ... амалга ошириш; ... (ишларини, хизматларини) ишлаб чиқарини ашёвийшарини мустрки ... белгиланган нархлар ва тарифларда, амалдан қонунчиликда назарда ... бошқариладиган нархларда сотиш; ... ишонини учун мажкур Устивда назарга тутилган ҳар қандай харажатлар; ... қарига олинган мабуот учун фойда зулаи тартибда қарига ... шини бақаринини ва хизмат қурбатини мумкин.

**6. Корхона хисоботи.**

6.1. Амаат статистика идоралари белгиланган шаклларда корхона уч иши ишларинини ... бухгалтерия хисобини амаатга ошириши. Статистика хисоботи олиб боради. ... молиявий-хужалик фаолияти тафтиши амаатдаги жинунчилик асбобда куни ... бир марта утқилилади. ... молиявий-хужалик фаолиятини тафтиши тамомланган мажкурланган ... асбобда тафтиш қилади.

**7. Тугатини ва қайта ташкил этиш фаолияти.**

7.1. Корхона фаолиятини тугатиш қайта ташкил этиш (кушиб иборини, кушиб олиш, булиш, ... чиқарини ва узгартирини) шаклида амаатга оширилади.

7.2. Корхонани қайта ташкил этиш шайтида унинг хужук ва бурчлари хужукай ворсинга утади.

7.3. Корхона куйидаги ҳолларда:

- 1. тафтишинини умумий йиғилишини қарори буфича;
- 2. корхона банкротликка учраган, корхонани руйхатта олиш хакикий эмас деб топилган, ... рухсатномаси (лицензияси) юритилган ёки қонунда тақиқланган ва қонунчиликда қула ... бошқа ҳолларда суд қарори билан тугатилиши мумкин.

7.3. Корхонани тугатиш тугатини қабул қилган умумий йиғилиши ёки орган жамиятша ... билан қарор қилинган ҳолда тугатини комиссиясини тайин қилдилар ҳамда ... тартиби ва мудлатини белгилайдилар.

Тугатини комиссияси тайинлангани билан корхона ишларини бошқариш соҳасидаги ваколатлар ... иштироига утади. Тугатини комиссияси корхона номидан судларда иштирок этиши.


Тугатини комиссияси юридик шахсларини давлат руйхатидан утқилини хакидаги маълумотлар ... матбуот органларида корхонани тугатини, унинг кредиторлари талабларини ... органлари ва тартиби тугатинидаги эълонни чоп этиради. Бу муддат корхона ... қандай эълон чиққан қундан бошлаб, икки ойдан кам булиши мумкин эмас.

7.4. Корхонани тугатиш процедуралари Узбекистон Республикасинини амаатдаги қонунчиликда ... тартибда амаатга оширилади.

7.5. Кредиторларини талаблари қаноатлантирилгандан сунг қолган мулк ва маблағлар ... тафтишига тағйини булади.

7.6. Юридик шахсларини руйхатта олиш ягона давлат реестрига корхона тугатинини хакидаги ... қайдлар киритилганидан сунг корхонани тугатиш тамомланган, корхона фаолияти жин тугатган ... хисобланади.

«ABDULLA-JON HAMKOR»  
хусусий Корхонаси тафтиши:



*(Handwritten signature)*

MAVLONBERDIYEV AXATKUL



"ADONIS PROJECT" MCHJ



## РАБОЧИЙ ПРОЕКТ-


Текущий ремонт  
автомобильных дорог по ул. "Бахористон" в МСГ "Марказ"  
Баявутском районе Сырдарьинской области  
Пересчет по Экспертному заключению №54069 от 30.07.2022г


### СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

Книга №- 01

*Пояснительная записка к смете*  
*Продолжительность строительства*  
*Стартовая стоимость строительства*  
*Прочие расходы заказчика*  
*Сводная объектная смета*  
*Лицензия*



  
\_\_\_\_\_  
О.Атабаева

  
\_\_\_\_\_  
М.Пулатов

г. Гулистан 2022 г.

**РЕКОМЕНДУЕМЫЙ  
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ**

**автомобильных дорог по ул."Бахористон" в МСГ "Марказ"  
Баявутском районе Сырдарьинской области  
Пересчет по Экспертному заключению №54069 от 30.07.2022г**  
Стоимость объекта в текущих ценах: 79 568 804 сум  
Нормативная трудоёмкость: 133,434 чел. час


Наименование затрат и показателей	Всего капитальных вложений (сум)	в том числе		
		СМР	Оборудование	Прочие затраты заказчика
Затраты на основную заработную плату				
Затраты на социальные отчисления на социальное страхование	3 054 154	3 054 154		
Затраты на машины и механизмы (ориентир.)	1 521 893	1 521 893		
Расходы на стройматериалы, конструкции и изделия	49 851 121	49 851 121		
Затраты на транспортировку материалов 5%	2 492 556	2 492 556		
Затраты на оборудование с учет.тран.и склад.Расход 2%			0	
Затраты на кабельную продукцию с учет.транс 1,5%				
<b>Итого прямые:</b>	<b>56 919 724</b>	<b>56 919 724</b>		
Прочие затраты и расходы подрядчика 17,27%	9 830 036	9 830 036		
<b>Итого полная стоимость объекта подлежащая обязательному страхованию:</b>	<b>66 749 760</b>	<b>66 749 760</b>		
Контрагент риска от прямых с прочими и произведенными расходами без учета страхования К = 0.02	0	0		
страхование строительства 0,32%	0	0		
<b>Итого с коэффициентом риска и страх.стр.:</b>	<b>66 749 760</b>	<b>66 749 760</b>		
НДС 15%	10 012 464	10 012 464		
<b>Итого стоимость в догов. Текущих ценах с НДС</b>	<b>76 762 224</b>			
<b>Прочие расходы заказчика:</b>	<b>2 806 579</b>			<b>2 806 579</b>
затраты на ПСД	1 949 705			1 949 705
затраты на экспертизу с НДС	690 000			690 000
затраты на авторский надзор	0			0
затраты на ГАСН 0,2%	133 500			133 500
затраты на тех.обследования	0			0
затраты на "Шаффоф курилиш 0,05%"	33 375			33 375
<b>Итого стоимость ст-во без НДС с проч. затратами заказч.</b>	<b>69 556 339</b>			
<b>Итого стоимость ст-во с НДС с проч. затратами заказчика</b>	<b>79 568 804</b>			

Директор:

Тип:

Сметный отдел:

Представитель заказчика

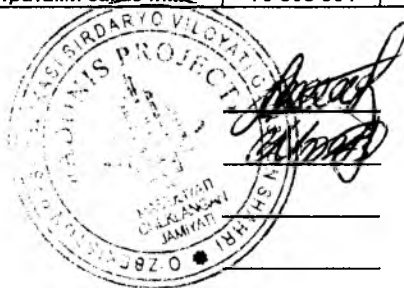

О.Атабаева

М.Пулатов

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

### Определение стартовой стоимости в договорных текущих ценах

по объекту:

**автомобильных дорог по ул. "Бахористон" в МСГ "Марказ"**

В соответствии с требованиями приложения № 1 к Постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 11.06.03 г. № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» стоимость строительства объекта рассчитываются согласно п. 4.01.16-04 п. 4.6 по формуле:

$$C = (C_m + C_{зп} + C_{эм} + C_p + Пп + C_p) \times K_p$$

где при строительстве объекта «под ключ»:

$$C = (C_0 + C_m + C_{зп} + C_{эм} + C_p + Пп + C_p) \times K_p,$$

где:

$C_0$  - затраты на оборудование, мебель и инвентарь;

$C_m$  - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

$C_{зп}$  - затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование;

$C_{эм}$  - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

$C_p$  - прочие затраты производственного характера;

$Пп$  - прочие затраты подрядчика;

$C_p$  - затраты на страхование строительства объектов на время строительства;

$K_p$  - коэффициент риска, определяемый исходя из прогнозируемого индекса роста

цены в строительстве на очередной год.

#### 1. Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции.

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определяются на основе среднего ресурсного расчета, разрабатываемого в составе конкурсной документации с применением средневзвешенных цен на единицу с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов, сложившихся в Сырдарьинской области, по формуле:

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{mp},$$

где:

$C_{m1}, C_{m2}, C_{m3}, \dots, C_{mp}$  - стоимость отдельных видов строительных материалов,

где:

$N_{ср}$  - количество отдельных видов строительных материалов, изделий и конструкций, требуемого для строительства объекта;

$C_{ср}$  - средневзвешенная цена на единицу строительных материалов, изделий и конструкций с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов, сложившихся в регионе

Стоимость строительных материалов, изделий и конструкций взята из «Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы» принимаемые в строительном производстве Республики Узбекистан и утвержденные Госкомархитектстроём Республики Узбекистан за 1 кв 2022 года. Цены на материалы и оборудования рекомендательного характера

#### 2. Затраты на заработную плату

Затраты на заработную плату определяются путем умножения нормативной трудоемкости объекта на текущую стоимость 1 человеко-часа (в сумах) и на коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование, по формуле:

$$C_{зп} = T \times C_ч \times K_{сс},$$

где:

$T$  - нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая по ресурсной смете, в чел.-часах;

$C_ч$  - среднечасовая заработная плата рабочих; при определении стартовой стоимости объекта исчисляется исходя из фактического уровня средне-статической месячной заработной платы строителей по региону;

$K_{сс}$  - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$C_ч = Z_{мс} : \Phi,$$

Где:

$Z_{мс}$  - среднемесячная заработная плата строителей по региону, определенная на основе статических за предыдущие 12 месяцев предшествующих на момент расчета, сум/месяц;

Ф - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

**Сч = 18 280**

Отчисление на социальное страхование от основной заработной платы:

Трудозатраты по сводным ресурсным методам: **133,434**

Основная заработная плата рабочих строителей: **3 054 154**

Трудозатраты рабочих-строителей, определенные в составе смет: **133 434 чел-час**

Трудозатраты одного рабочего строителя за месяц при восьми часовой рабочей смены: **178 чел-час в мес**

Козф. учитывающий параллельную работу бригад при производстве работ на объекте: **1,1 коэфф.**

Среднее кол.во рабочих строителей, электр., сантехн. и других специал. работающих на объекте: **3 чел.**

определилась :  $\frac{0,3мес.}{7Раб. дн.}$

Среднее количество рабочих строителей, электриков, сантехников и других специалистов работающих на объекте:

$T=133,434/178/1,1/3$

### 3. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов в текущих ценах при определении стартовой стоимости строительства объекта, рассчитывается по формуле

$$Сэм = Эм \times Цпр.$$

где:

Эм -- объём эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов приняты усредненно к Сырдарьинской области:

**Сэм = 1 521 893**

### 4. Затраты на приобретение оборудования, мебели и инвентаря.

Затраты на приобретение оборудования, мебели и инвентаря определяются на основании спецификаций, составленных на основе действующих сметных ресурсных нормативов с применением цен предприятий-производителей (поставщиков) с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов или по банку данных, формируемых на основе мониторинга цен, по формуле:

$$Co = Co1 + Co2 + Co3 + \dots + Con,$$

где:

Co1, Co2, Co3, ..., Con, - стоимость отдельных видов оборудования, мебели и инвентаря.

$$Con = N \times Цср.$$

где:

N -- количество отдельного вида оборудования, мебели и инвентаря;

Цср -- средневзвешенная цена единицы оборудования, мебели и инвентаря.

**Co = 0**

### 5. Структура прямых затрат

№ п/п	Наименование	Стоимость в текущих ценах, сум
1	Основная заработная плата рабочих-строителей	3 054 154
2	Эксплуатация машин и механизмов	1 521 893
3	Расходы на строительные материалы, изделия и конструкции	52 343 677
4	Расходы на оборудование, мебель и инвентарь	0
	ИТОГО.	56 919 724

### 6. Прочие затраты производственного характера

Прочие затраты производственного характера учитывают затраты (Ср) учитывают затраты на временные здания и сооружения, зимнее удорожание, перевозку рабочих, вахтовый метод строительства и т.п., которые не учтены в прямых затратах.

Эти затраты определяются по данным ПОС и средне сложившихся затрат в подрядной организации. Прочие затраты производственного характера Ср приняты условно.

ИТОГО прямые затраты с учетом затраты производств. характера **56 919 724**

### 7. Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты подрядчика Пп приняты согласно статистическим данным в размере 16% от суммы прямых затрат с учетом затрат производственного характера, за минусом затрат на оборудование

**Пп = 56919724,05 x 17,27% = 9 830 036**

Итого полная стоимость объекта подлежащего страхованию

$Ср = См + Сзп + Сэм + Сп + Пп = 66 749 760$

8. Коэффициент риска

~~Коэффициент~~ риск принят условно в размере 0.02% 0  
~~Коэффициент~~ строительства 0,32% 0  
Итого: стоимость строительства в текущих ценах без НДС:  
Ц = 66 749 760

Итого НДС:  
Пз = 66749760 x 15% 10 012 464

9. Прочие затраты заказчика

Прочие затраты заказчика Пз

Пз = 6955633879,44% 2 806 579

Всего стоимость строительства в текущих ценах с НДС составит:

66749760 + 10012464 + 2806579 = 79 568 804



*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ АВТО ДОРОГА ПО УЛ. "БАХОРИСТОН" МСГ "МАРКАЗ" БАЯБУТСКОМ РАЙОНЕ СЫРДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ  
(наименование стройки)

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

(локальная ресурсная смета)

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ОБЪЕКТ-АВТО ДОРОГА

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
			по проектным данным
п	з	4	6
<b>РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ</b>			
1	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.]( СУЩЕСТВУЮЩЕГО АВТО ДОРОГА)	1000M2	0,549288
2	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА (ТОЛЩ.3СМ)	100M3	0,164786
3	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	M3	18,128
4	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	M2	549,288
5	УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ИЗ БЕТОНА В25, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20(17) СМ	1000M2	0,549288
6	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 27-06-002-17	1000M2	0,549288
7	НАРЕЗКА ШВОВ В БЕТОНЕ СВЕЖЕУЛОЖЕННОМ	100M	0,784697
8	ПЛЕНКООБРАЗУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ ПМ-100А	M2	549,288
9	НАНЕСЕНИЕ ЛИНИИ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ КРАСКОЙ	100 M2	0,4882

ГИП

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА



М.ПУЛАТОВ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ АВТО ДОРОГА ПО УЛ. "БАХОРИСТОН" МСГ "МАРКАЗ" БАЯБУТСКОМ РАЙОНЕ СЫРДИЙСКОЙ ОБЛАСТИ  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 1**  
(локальная ресурсная смета)

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. ОБЪЕКТ-АВТО ДОРОГА  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на ед. измерения	по проектным данным
2	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ</b>				
E0101-036-01	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.] (СУЩЕСТВУЮЩЕГО АВТО ДОРОГА)	1000M2	0,549288	
257	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,38	0,208729
E2704-001-01	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА (ТОЛЩ.3СМ)	100M3	0,164786	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,4	2,3729
107	АВТОРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	1,55	0,255418
112	АВТОПОПУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,29	0,706932
S45049	ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ	M3	18,128	
S29970	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	M2	549,288	
E2706-002-17	УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ИЗ БЕТОНА В25, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20(17) СМ	1000M2	0,549288	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	302	165,888
404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	18,71	10,2772
1135	МАШИНЫ ПОЛИВМОЩНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	22,3	12,2491
2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	3,2	1,7577
9219	ВОДА	M3	178	97,7733
30659	ПЛИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	M2	12,2	6,7013
36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	M3	0,19	0,104365
36180	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ БЕРЕЗОВЫЕ И МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД: БЕРЕЗА, ЛИПА. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ I СОРТА	M3	0,24	0,131829
41353	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ В25 М-300 (ДЛЯ ВЕРХНЕГО СЛОЯ И ОДНОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ)	M3	204	112,0548
E2706-002-18 К=3	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 27-06-002-17	1000M2	0,549288	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	15,9	8,7337
404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	3,48	1,9115
2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,45	0,24718
30659	ПЛИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	M2	1,77	0,97224
36053	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	M3	0,03	0,016479
41353	БЕТОН ДОРОЖНЫЙ В25 М-300 (ДЛЯ ВЕРХНЕГО СЛОЯ И ОДНОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ)	M3	30,6	16,8082
E2706-007-02	НАРЕЗКА ШВОВ В БЕТОНЕ СВЕЖЕУЛОЖЕННОМ	100M	0,784697	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,52	6,6856
1332	НАРЕЗЧИКИ ШВОВ В СВЕЖЕУЛОЖЕННОМ ЦЕМЕНТОБЕТОНЕ	МАШ.-Ч	2,46	1,9304
2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,007847
44345	ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ	M2	6,82	5,3516
S32652	ПЛЕНКООБРАЗУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ ПМ-100А	M2	549,288	
E2709-018-01 ДОП. 4	НАПЕСЕНИЕ ЛИНИИ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ КРАСКОЙ	100 M2	0,4882	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,77	0,864114
2434	КРАСКОУЛЬТЫ С КОМПРЕССОРОМ	МАШ.-Ч	0,47	0,229454
2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,47	0,229454
30187	КРАСКА РАЗМЕТОЧНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ РАБОТ	L	0,064	0,031245
<b>ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:</b>				
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>				
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		167,0739
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	МАШ.-Ч		25,69359

Смета составлена:

Объем предоставил:

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ АВТО ДОРОГА ПО УЛ. "БАХРИСТОН" МСГ "МАРКАЗ" БАВУТСКОМ РАЙОНЕ  
СЫРДЖИНСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование строки)

### РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная ресурсная смета)

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ОБЪЕКТ-АВТО ДОРОГА

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество	3		6		7
			4		5		
			на. ед. изм.	общая	Сметная стоимость	в базисном уровне	

### 10. ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОГО РЕСУРСНОГО

#### УДОВЫЕ РЕСУРСЫ

ТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ

ОТО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:	ЧЕЛ-Ч	167,0739	18280,25	3054154,00	3054154
---------------------------	-------	----------	----------	------------	---------

#### РОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

ТОПТЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)

ТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,706932	72437	51208,02	
ОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 59 (80) КВТ (Л.С.)	МАШ-Ч	0,208729	93613,98	19539,99	

БРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ

МАШИНЫ ПОЛИВНОЕЧНЫЕ: 6000 Л	МАШ-Ч	12,2491	97872	1198846,11	
РЕЗЧИКИ ШВОВ В СВЕЖЕУЛОЖЕННОМ ЦЕМЕНТОБЕТОНЕ	МАШ-Ч	1,9304	49084	94749,52	

АСКОМУЛЫТЫ С КОМПРЕССОМ

МАШ-Ч	0,229454	65162	14951,68	
-------	----------	-------	----------	--

ТОМОБИЛИ ВОРТОВЫЕ ПРЭПОДЛЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т

МАШ-Ч	1,5184	54548	82825,08	
-------	--------	-------	----------	--

ТОМОБИЛИ ВОРТОВЫЕ ПРЭПОДЛЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т

МАШ-Ч	0,229454	65162	14951,68	
-------	----------	-------	----------	--

ОТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:

Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:	СУМ			1521893	
---------------------------------	-----	--	--	---------	--

#### МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

ДА

М3	97,7733	1200	117327,92	
----	---------	------	-----------	--

АСКА РАЗМЕТОЧНАЯ ДЛЯ ДОРЖНЫХ РАБОТ

Т	0,031245	26400000	824862,72	
---	----------	----------	-----------	--

ТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ

М2	5,7291	71600	410201,68	
----	--------	-------	-----------	--

СКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-

М3	0,087886	3500000,8	307601,42	
----	----------	-----------	-----------	--

МАТЕРИАЛЫ БЕРЕЗОВЫЕ И МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД:

М3	0,131829	3499999,47	461401,78	
----	----------	------------	-----------	--

РЕЗА, ЛИПА, ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ,

М3	95,2465	460342	43845982,35	
----	---------	--------	-------------	--

ТОН ДОРЖНЫХ В25 М-300 (ДЛЯ ВЕРХНЕГО СЛОЯ И

М2	5,3516	2500	13379,08	
----	--------	------	----------	--

НОСЛОЙНЫХ ПОКРЫТИЙ)

М2	549,288	2500	1373220,00	
----	---------	------	------------	--

ЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ

М2	549,288	2500	1373220,00	
----	---------	------	------------	--

ЕНКООБРАЗУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДОРЖНЫХ РАБОТ ПМ-

М3	18,128	62000	1123936,00	
----	--------	-------	------------	--

СОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ

СУМ			49851121	
-----	--	--	----------	--

ОТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:

эта составил:





Сирдарё вилояти

Sirdaryo viloyati 120100, Sirdaryo viloyati, Guliston shahri, Hondamir ko'chasi, 7-uy, Tel. +998 67 226-06-61, E-mail: sirdarya\_davekspert@mail.ru, www.ekspertiza.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Gaimov Bo'riboy Xolbayevich

Sana: 30-07-2022 yil



### Yig'ma ekspert xulosasi № 54069

**Obyekt nomi** «Sirdaryo viloyati Boyovut tumani "Markaz" MFY Baxoriston ko'chasini joriy ta'mirlash.»

**Buyurtmachi** - Boyovut tumani obodonlashtirish boshqarmasi.

**Bosh loyihachi** - "ADONIS PROJEKT" MCHJ

**Litsenziya** AL-002049 24.01.2022 yil

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet mablag'lari hisobidan

**Bosh pudratchi** - tender (tanlov) asosida

**Qurilish turi** joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 51395

#### 1. Loyihalash uchun asos

2. Loyiha topshirig'i buyitmachi tomonidan tasdiqlangan.

3. Nuqson dalolatnomasi buyitmachi tomonidan tasdiqlangan.

#### 2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

1. Loyiha topshirig'i buyitmachi tomonidan tasdiqlangan.

2. Nuqson dalolatnomasi buyitmachi tomonidan tasdiqlangan.

3. Smeta hujjatlari - o'bektni taqdim etilgan qiymati QQS va buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan - 81 127 223 so'm.

Lokal resurs qaydnomasi.

Resurs smeta hisobi.

#### 3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Sirdaryo viloyati Boyovut tumani "Markaz" MFY Baxoriston ko'chasini joriy ta'mirlash loyiha-smeta hujjatlari Loyiha topshirig'i, va nuqson dalolatnomasi asosida bajarilgan. Loyiha-smeta hujjatlari "ADONIS PROJEKT" MCHJ tomonidan tasdiqlangan nuqson dalolatnomasiga asoson

ishlab chiqilgan. Sirdaryo viloyati Boyovut tumani "Markaz" MFY Baxoriston ko`chasini joriy ta'mirlash ishlarini bajarishda tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi bo`ycha quyidagi ishlarni amalga oshirish belgilangan bo`limlar kesimida; 1-Bo`lim: yer ishlari (ishlari ketma-ketligi tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi asosida.) 2-bo`lim; yo`l qoplamalari (ishlar ketma-ketligi tasdiqlangan nuqson dalolatnomasi asosida.)

#### **4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

2.Loyiha topshirig`i buyitmachi tomonidan tasdiqlangan.

3.Nuqson dalolatnomasi buyitmachi tomonidan tasdiqlangan.

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

4.Smeta hujjatlari.

Joriy narxlardagi resurs smetasida quyidagilar hisobga olingan: Ishchi quruvchilar o`rtacha 1kishi/soat ishxaki 12% ijtimoiy sug`urta ajratmasi bilan 18280,25 so`m. 2022 yil 1 chorak katalogi, Mashinamexanizmlar mash/soat narxlari Qurilish vazirligining 2022 yil 1 yanvar xolatidagi taqdim etgan ro`yxatiga asosan olingan. Pudratch harajatlari 17,27 % olingan loyiha topshirig`ga asosan. Transport harajatlari 5% olingan. Materiallar va konstruksiyalar qiymati QURILISH IQTISODIYOTI INSTITUTI" MCHJ tomonidan ishlab chiqilayotgan joriy narxdagi 2022 yil 1 chorak katalogiga asosan olingan.

#### **5.Ekspertiza natijalari**

Buyurtmachi tomonidan smeta summasi QQS va buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan birga xisoblanganda 81 127 223 so`m taqdim etilgan. Ekspertiza ko`rigi jarayoni natijalariga ko`ra ob'ektning taqdim etilgan qiymati QQS va buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan -1 558 420 so`mga kamaytirildi.

-Qurilish materiallari harajatlari sarfi - 746 094 so`mga kamaydi.

-mashina va mehanizm harajatlari sarfi - 122 272 so`mga kamaydi.

-buyurtmachining boshqa harajatlari sarfi - 337 028 so`mga kamaydi.

Tafsiya etilyongan materiallar va konstruksiyalar qiymati QURILISH IQTISODIYOTI INSTITUTI" MCHJ tomonidan ishlab chiqilayotgan joriy narxdagi 2022 yil 1 chorak katalogiga asosan olingan.

1. Smetaga kiritilgan buyurtmachi tomonidan tasdiqlandanda nuqson dalolatnomasi asosidagi ish turlari va hajimlarining haqqoniyliigi va ishonchliliigi uchun javobgarlik buyurtmachiga va loyihachi tashkilot zimmasiga yuklatiladi.
2. Smeta hujjatlariga asosan qayta qurish ishlarining yakuniy harajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so`ng, haqiqiy (ijro xujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

3. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.(sanitariya-epidemiologiya va yong'inga qarshi nazorat xizmatlari hamda ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish organlari, avtoyo'l boshqarmasi)
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yanvardagi 15-sonli qarorining 4-ilovasiga muvofiq, II bob 8-band va SHNQ 1.03.06-13 da "Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi".
5. Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa harajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertisasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.
6. Buyurtmachi va loyiha tashkilotiga o'rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan kamchiliklarni bartaraf etgan holda loyiha-smeta hujjatlarini o'zgartirish talabi qo'yilgan. Agar ushbu talab bajarilmasa va loyiha-smeta hujjatlari buyurtmachiga to'liq tuzatishlarsiz berilsa, ushbu ekspertiza xulosasi haqiqiy emas deb hisoblanadi.

## **7. Xulosalar.**

Ekspertiza natijalarini xisobga olgan holda Sirdaryo viloyati Boyovut tumani "Markaz" MFY Baxoriston ko'chasini joriy ta'mirlashga tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarini kelgusida kelishish hamda tasdiqlash uchun QQS 15 % va buyurtmachining boshqa xarajatlari bilan xisoblaganda umumiy miqdorda – 79 568 804 so'mga, QQS 15 % bilan - 76 762 224 so'mda tavsifa etiladi. QQS siz - 66 749 760 so'm.

Buyurtmachining boshqa harajatlari - 2 806 579 so'm.

2. O'zbekiston Respublikasi Shaharsozlik kodeksi 4-bob 23,24,25-moddalari xamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar maxkamasining 17.09.2021 yildagi № 579-sonli qarorining 1-ilova 3-bob 29-bandiga asosan "Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlari bo'yicha buyurtmachi xamda loyiha tashkiloti javobgardir".

3. Smeta hujjatlarida nazarda tutilgan asosiy qurilish materiallari va uskuna (jixoz) larni xarid qilish tartibi belgilangan tartibda O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq amalga oshirilishi va asoslovchi xujjatlarga tayanilishi lozim. "Narxlar kelishuvi" to'g'risidagi bayonnoma ko'rsatilgan narxlarning haqqoniyli buyurtmachi va pudratchi tashkilot, hamda o'zaro hisob-kitob qilishda ShNQ 4.01.16-09 qoidalariga amal qilgan holda eng maqbul narxlar qabul qilinishi nazorati buyurtmachi tashkilot zimmasida qoladi.

4. Yakuniy harajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro hujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi. "Qurilishning bahosini shartnomaviy joriy narxlarda aniqlash qoidalari" ShNK 4.01.16-09.

5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003-yildagi № 261 qarori bilan tasdiqlangan "Qurilish ob'ektlari narxini joriy shartnoma narxlarida aniqlash tartibi to'g'risida vaqtinchalik qoidalar"ga va ShNK 4.01.16.09 ga binoan qurilishning narxi tavsiyaviydir.

Tavsiya etilgan bahoni qabul qilish qarorini buyurtmachi va pudratchi birgalikda qabul qiladilar (ShNQ4.01.16-09, 6-bob. 6.4 -bandi).

**Bosh mutaxassis:** Toshbayev O'ktamjon Abdurayimovich



## XALQ DEPUTATLARI BOYOVUT TUMANI KENGASHI QARORI

2022 - yil 6 - iyun

VI-37-72-9-123-K/22

Boyovut tumani hokimligi

### Boyovut tumani “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi” mablag‘lari hisobidan “Ochiq budget” axborot portali orqali “Mening yo‘lim” loyihasida eng ko‘p ovoz to‘plagan takliflar uchun mablag‘lar ajratish to‘g‘risida

O‘zbekiston Respublikasi budget kodeksining 126-moddasiga, “Fuqarolar tashabbusi jamg‘armasi” mablag‘lari hisobidan “Ochiq budget” axborot portali orqali “Mening yo‘lim” loyihasi uchun eng ko‘p ovoz to‘plagan takliflarni ko‘rib chiqib, O‘zbekiston Respublikasi “Mahalliy davlat hokimiyati to‘g‘risida”gi qonunning 6, 24-moddasiga asosan Xalq deputatlari tuman Kengashi

### QAROR QILADI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Avtomobil yo‘llari sohasida ochiqlik ochiqlik standartlarini joriy etish va sohada jamoatchilik nazoratini kuchaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2022-yil 2-fevraldagi 49-sonli qaroriga asosan tuman (shahar) mahalliy budjeti parametrlarida hududiy ichki yo‘llarni ta‘mirlash uchun ajratilgan mablag‘lari hisobidan, joriy yil 4-apreldan 29-aprelgacha bo‘lgan muddat davomida “Ochiq budget” axborot portali orqali “Mening yo‘lim” loyihasida eng ko‘p ovoz to‘plagan takliflar;

1-o‘rinni olgan Boyovut tumani Qarapchi mahallasi Maroqand ko‘chasi 5.500 metrini ta‘mirlash taklifi (**taklif ID raqami 1280500019**) xarajatlari uchun 922.9 ming (*To‘qqiz yuz yigirma ikki million to‘qqiz yuz ming*) so‘m;

2-o‘rinni olgan Boyovut tumani Yangi avlod mahallasi Hur o‘lka ko‘chasi 1.400 metrini ta‘mirlash bo‘yicha kiritilgan taklifni to‘liq moliyalashtirish uchun jamg‘armada qoldiq yetmaganligi hamda Xalq deputatlari Boyovut tuman Kengashining 2022-yil 21-maydagi “Boyovut tumanida 2022-yilda sement-beton qoplamali ichki yo‘llarni qurish parametrlarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi VI-37-65-9-123-K/22-sonli qaroriga asosan ushbu ko‘cha 2022-yilda sement-beton qoplamali ichki yo‘llarni qurish manzilli ro‘yhatiga kiritilganligi sababli (**taklif ID raqami 1280500027**) taklifi rad etilsin;

3-o‘rinni Boyovut tumani Navro‘z mahallasi To‘maris ko‘chasini 1.715 metrini ta‘mirlash taklifi; (**taklif ID raqami 1280500005**) xarajatlari uchun 287.8 ming (*Ikki yuz sakkiz yuz yigirma sakkiz yuz ming*) so‘m;

4-o‘rinni olgan Boyovut tumani Ma‘naviyat mahallasi Nayman ko‘chasini 3.100 metrini ta‘mirlash (**taklif ID raqami 1280500013**) ushbu taklif, 2022-yil tashabbusli budget jarayonida qatnashib g‘olib bo‘lganligi hamda kiritgan taklifni to‘liq moliyalashtirish uchun jamg‘armadagi mablag‘ yetarli bo‘lmaganli sababli rad etilsin. Shuningdek, ushbu taklif rad etilganligini inobatga olib, jamg‘armadagi qoldig‘ mablag‘lar keyingi o‘rini egallagan takliflarga loyiha

smetasiga asosan taqsimlansin.

2. Boyovut tumani Ma'naviyat mahallasi Nayman ko'chasini ta'mirlash (**taklif ID raqami 1280500013**) taklifi rad etilganligini inobatga olib, quyidagi takliflarga:

5-o'rinni Boyovut tumani Gulbog' mahallasi Nodirabegim ko'chasini 650.0 metrini ta'mirlash taklifi; (**taklif ID raqami 1280500026**) xarajatlari uchun 109.1 ming (Bir yuz to'qqiz million yuz ming) so'm;

6-o'rinni Boyovut tumani Markaz mahallasi Sheroz ko'chasini 400.0 metrini ta'mirlash taklifi; (**taklif ID raqami 1280500025**) xarajatlari uchun 67.1 ming (Oltmish yetti million yuz ming) so'm;

7-8-o'rinni olgan takliflarni moliyalashtirish uchun kiritgan mablag'lariga jamg'armada qolgan qoldiq yetmaganligi sababli rad etilsin;

9-o'rinni Boyovut tumani Markaz mahallasi Bahoriston ko'chasini 500.0 metrini ta'mirlash taklifi; (**taklif ID raqami 1280500034**) xarajatlari uchun 83.9 ming (Sakson uch million to'qqiz yuz ming) so'm;

10-o'rinni Boyovut tumani Sarmich mahallasi Yuqori Sarmich ko'chasini 1.000 metrini ta'mirlash taklifi; (**taklif ID raqami 1280500018**) xarajatlari uchun 167.8 ming (Bir yuz oltmish yetti million sakkiz yuz ming) so'm mablag'lar ajratilsin.

3. Xarajatlarni amalga oshirishga mas'ul tashkilotlar rahbarlariga:

- ajratilgan mablag'lar doirasida belgilangan tartibda to'lovlarni amalga oshirish;
- moliyalashtirish manbasini ochish uchun o'rnatilgan tartibda rasmiylashtirilgan hujjatlarni tuman moliya bo'limi va tuman G'aznachilik bo'linmasiga taqdim etish;
- ajratilgan mablag'lardan to'g'ri, maqsadli va samarali foydalanilishini ta'minlash;
- ajratilgan maqsadli mablag'larni o'z vaqtida va samarali ishlatilishi yuzasidan moliyaviy hisobotlar asosida tizimli o'rganish hamda o'rganish natijalariga ko'ra, ishlatilmagan va iqtisod qilingan mablag'larni tuman mahalliy budjetiga qaytarish choralarini ko'rsinlar.

4. Tuman hokimligining moliya bo'limi mudiri v.v.b (B.Ahmadov)ga budjet xarajatlar rejasiga belgilangan tartibda tegishli o'zgartirishlar kiritish, tuman G'aznachilik bo'linmasi boshlig'i (F.Kuldashv)ga to'lovlarni o'rnatilgan tartibda va o'z vaqtida amalga oshirish hamda ajratilgan mablag'lardan maqsadli foydalanilishini nazorat qilish vazifalari topshirilsin.

5. Mazkur qaror ijrosini nazorati xalq deputatlari tuman Kengashining mahalliy budjetni shakllantirish va ijro etish, iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish va tadbirkorlikni rivojlantirish masalalari doimiy komissiyasi A.Amanlikov hamda tuman hokimining birinchi o'rinbosari F.Kushakov zimmlariga yuklatilsin.

6. Mazkur qaror qabul qilingan kundan boshlab kuchga kiradi.

**Kengash raisi**

**D.Uralova**
