

Ушбу пудрат шартномаси «Буюртмачи» деб аталувчи Хўжаобод туман Ободонлаштириш бошкармаси, унинг номидан Низом асосида иш олиб борувчи раҳбар вазифасини бажарувчи Т. Умирзаков бир томондан ва «Пудратчи» деб аталувчи «Хўжаобод ТЙФУК» ва унинг номидан Низом асосида иш олиб борувчи Д. Косимов иккинчи томондан келишув асосида амалдаги қонунларга мувофиқ тузилди

I. ШАРТНОМАНИНГ МАВЗУСИ

1.1. «Пудратчи» мазкур шартнома шартларига мувофиқ «Буюртмачи» Хўжаобод туман Баҳрин МФЙ Пахтакор кучаси 200 м қисми ички йулларини асфалтлаш ишларини бажариб беради.

II. ШАРТНОМАНИНГ БАХОСИ ВА ХИСОБ КИТОБ ТАРТИБИ

2.1. Бажарилиши лозим бўлган ишлар «Буюртмачи» томонидан тасдиқланган сметага ва танлов комиссиясининг қарори билан тасдиқланган ишлар қиймати (барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда) га асосан жорий нархларда 43 149 881.57 (Кирк уч миллион бир юз кирк туккиз минг саккиз юз саксон бир сумм 57 тийин) сўми ташкил этади.

2.2. Шартнома томонлар ўртасида имзоланиб Газначилик тизимидан руйхатдан утгандан сунг 10 банк иш кунида «Буюртмачи» бажариладиган ишлар умумий қийматининг 30 фоизини яъни 12 944 964.47 (Ўн икки миллион тўккиз юз кирк тўрт минг тўккиз юз олтмиш тўрт сум 47 тийин) сўми, тегишли бюджетдан молиялаштирилган маблағлар доирасида, олдиндан аванс тарикасида «Пудратчи»нинг ҳисоб рақамига ўтказиб беради.

2.3. Бажарилган ишлар учун тўловларнинг қолган 65 фоизи, яъни 28 047 423.02 (Йигирма саккиз миллион кирк етти минг тўрт юз йигирма уч сум 02 тийин) сўмини «Пудратчи» томонидан топширилган бажарилган ишлар далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида тулов графиги асосида ўтказиб беради.

2.4. «Буюртмачи» 5 фоиз охириги тўлов 2 157 494.08 (Икки миллион бир юз эллик етти минг тўрт юз тўксон тўрт сум 08 тийин) сумини «Пудратчи» томонидан иш тўлик бажариб топширилиб, қабул қилиш – топшириш далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида 5 йил кафолат муддатда ўтказиб беради.

2.5. Бажарилган ишлар учун тўловлар «Буюртмачи» томонидан пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

III. ТОМОНЛАРНИНГ ХУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

3.1. «Пудратчи»нинг мажбуриятлари Шартнома имзолангандан сўнг иш бажариладиган объектни «Буюртмачи»дан далолатномага асосан қабул қилиб олади. Мазкур шартномада илова қилинадиган тўлов жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови амалга оширилгандан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва ишларни бажариш календар графигига асосан 30 кун муддатда ишларни бажариб топширади. Барча ишларни тасдиқланган смета ҳужжатларига мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда «Буюртмачи»га мазкур шартнома шартларига мувофиқ топширади. Иншоат ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, хом-ашёлардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар далолатномани имзолаган кундан бошлаб 3 ой эгиб белгиланади. Агар иншоатдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуксонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуксонларни бартараф этиш даврмга узайтирилади. Нуксонлар Пудратчи тамонидан унинг уз ҳисобидан бартараф этилади.

3.2. «Пудратчи»нинг ҳуқуқлари Бажариб берилган иш учун олдиндан аванс ҳақ тўланишини ва ишни бажариб топширгандан сўнг тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинишини талаб қилиш; Бажариб берилган ишни қабул қилиб олиш асоссиз равишда рад этилиши натижасида етказилган зарарни қопланишини талаб қилиш;

3.3. «Буюртмачи»нинг мажбуриятлари Тасдиқланган смета бўйича бажарилган ишларни қабул қилиб олиш; Бажарилган ишлар учун ўз вақтида ҳақ тўлаш;

3.4. «Буюртмачи»нинг ҳуқуқлари «Пудратчи»дан амалдаги давлат стандартлари ва бошқа меъёрий ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш; Камчиликларни бепул бартараф этилиши ёки камчиликларни бошқа шахс томонидан тўғриланиши харажатларини қопланишини талаб қилиш; «Пудратчи»дан шартномада курсатилган ишларини қабул қилиш комиссияси иштирокида лойиҳа ҳужжатлари асосида ишни сифатли бажарган ҳолда қабул қилиб олиш; «Пудратчи» томонидан ишлатиладиган материаллар ва асбоб ускуналарни шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини назорат қилиш

IV. ШАРТНОМАНING БАЖАРИЛИШИ

4.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажармаса мажбуриятни бажармаган томон иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

4.2. «Пудратчи» объектни ўз вақтида топширмаганилиги учун «Буюртмачи»га ҳар бир кечиктирилган кун учун шартнома мажбуриятлари бажарилмаган қисмининг 0,5 % миқдориди пеня тўлайди. Тўланадиган пеня суммаси бажарилмаган мажбуриятлар баҳосининг 50 % идан ошмаслиги керак.

4.3. Аниқланган нуксон ва камчиликлар «Пудратчи» томонидан ўз вақтида бартараф қилинмаса «Буюртмачи» томонидан тўловлар тўхтатилади. Лозим даражада бажарилмаган ишларнинг 20 % и миқдориди «Пудратчи» жарима тўлайди.

4.4. Бажарилган ишлар учун «Буюртмачи» томонидан ўз вақтида ҳақ тўланмаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 % и миқдориди пеня тўлайди. Тўланадиган пеняларнинг умумий суммаси кечиктирилган тўловларнинг 50 % и миқдоридан ортмаслиги керак.

4.5. Тўланадиган пеня ва жарималар шартнома мажбуриятларини бузган тарафни иккинчи тарафга ана шу мажбуриятларни бажармаслик оқибатида етказилган зарарни қоплаш жавобгарлигидан озод этмайди.

V. ФОРС МАЖОР ХОЛАТЛАР

5.1 Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни тўлик ёки қисман бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар шартнома шартларини бажарилишига бевосита таъсир этса томонларнинг жавобгарликдан озод этилиши Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

VI. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ, БЕКОР ҚИЛИШ ВА НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

6.1. Мазкур шартнома белгиланган шаклда томонларнинг ўзаро келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин.

6.2. Мазкур шартнома бўйича юзага келиши мумкин бўлган низо ва келишмовчиликлар ўзаро муҳокама йўллари билан ҳал этилади. Агарда ўзаро муҳокама йўли билан ҳал этиш имкони бўлмаса Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Хўжалик суди орқали ҳал этилади.

VII. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ

7.1. Шартнома томонлар имзолаб ҳудудий Газначилик булинмасидан руйхатдан утган кундан кучга қиради ва 31 декабрь 2022 йилгача амал қилади.

7.2. Шартнома 2 нусхада тузилиб, иккала нусхаси ҳам ҳуқуқий жиҳатдан тенг кучли ҳисобланади.

«ПУДРАТЧИ»
«Хўжабод ТИФУК»

«БУЮРТМАЧИ»

Манзил : Хўжабод туман Ипакчи МФЙ


х/р 22626000600663325001

Ипатека банк Истиклол филиали
МФО 00068

Стир 201503300

ОКОНХ 42110

Бошлик:



И. Косимов

Хўжабод туман Ободонлаштириш бошқармаси

Манзил Хўжабод ш, Лайлак уч кучаси 5 уй

Марказийбанк Тошкент ш, бош бошқармаси ХККМ

х/р 100022860032367045203110001

х/р

МФО 00014

СТИР 205595604

ОКОНХ 90290

Модия Вазирлиги Газна ҳисоб варағи

х/р 23102000300100004010

МФО 00014 ИТН/20/22919

Бошлик

Т. Умирзаков

(имзо)



М.Ў.

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA
HUQUQIY XULOSA**

№ EX27022638

1. Loyi haning turi

Shartnoma

2. Loyi haning nomi

Haq evaziga xizmat ko'rsatish to'g'risida

Birinchi tomondan Xo'jaobod tuman Obodonlashtirish boshqarmasi keyingi o'rinlarda **"Buyurtmachi"** nomidan ish olib boruvchi rahbari T.Umirzakov va **ikkinchi tomondan "Xo'jaobod TYF" U/K** keyingi o'rinlarda **"Pudratchi"** nomidan rahbari D.Qosimov o'rtasida haq evaziga xizmat ko'rsatish shartnomasi tuzilmoqda. "Pudratchi" mazkur shartnoma shartlariga muvofiq Xo'jaobod tuman Baxrin MFY Paxtakor ko'chasi 200 m qismi ichki yo'llarini asfaltlash ishlarini bajarib beradi. Bajarilishi lozim bo'lgan ishlar "Buyurtmachi" tomonidan tasdiqlangan smetaga va tanlov komissiyasining qarori bilan tasdiqlangan ishlar qiymati (barcha soliqlar, yig'imlar va ajratmalarni o'z ichiga olgan holda) ga asosan joriy narxlarda 43 149 881.57 (Qirq uch million bir yuz qirq to'qqiz ming sakkiz yuz sakson bir so'm 57 tiyin) belgilanishi to'g'risidagi shartnoma loyihasi ishlab chiqilgan.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot

Xo'jaobod tuman obodonlashtirish boshqarmasi

12.09.2022-yil.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

13.09.2022-yil.

**Yuridik xizmat ko'rsatish markazi
Bosh yuriskonsulti**



Sh.Xabibullayev



Хужаобод туман Бахрин МФЙ Пахтакор кўчасини ички йулларини 0.2 метр қисмини жорий таъмирлаш учун ишлари буйича танлов комиссиясининг йиғилиши

БАЁНИ № 8

2022 йил «10» 09

Хужаобод тумани

Хужаобод туман ҳокимининг «Тумандаги Хужаобод туман Бахрин МФЙ Пахтакор кўчасини ички йулларини 0.2 метр қисмини жорий таъмирлаш учун ишлари ҳақида»ги 2022 йил 5- июлда тасдиқланган танлов хайъатининг аъзоси йиғилишида иштирок этдилар:

1. А.Саитов - туман ободонлаштириш бошқармасининг бош муҳандиси хайъат раиси

Х А Й Ё А Т А Ё З О Л А Р И:

- 2 О. Мирзаева - туман ободонлаштириш бошқармаси ёрдамчи ҳисобчи, котиби
- 3. Х.Халилов - туман ободонлаштириш бошқармаси Кабристон назоратчиси, аъзо
- 4. Г. Аманова - туман ободонлаштириш бошқармаси омборчи, аъзо
- 5. О. Ортиқов - туман ободонлаштириш бошқармаси булим устаси, аъзо
- 6. А. Соипов - туман ободонлаштириш бошқармаси бригадир, аъзо

К У Н Т А Р Т И Б И

Хужаобод туман Бахрин МФЙ Пахтакор кўчаси ички йулларини 0.2 метр қисмини жорий таъмирлаш ишлари буйича танлов ўтказиш ҳақида

Кун тартибидаги масала юзасидан туман ободонлаштириш бошқармаси бошлиғи Т. Умирзаков сўз олиб ички йулларини жорий таъмирлаш ишларини амалга ошириш учун тузилган Бахрин МФЙ Пахтакор кўчасини ички йулларини жорий таъмирлаш ишлари учун нуқсонлар кайдномасига тузилган булиб, унга кура Бахрин МФЙ Пахтакор кўчаси ички йулларини жорий таъмирлаш ишлари учун 48 000 000 сўм маблағ ажратилиши кўзда тутилган.

Биз ушбу ички йулларини жорий таъмирлаш учун ишларни амалга оширувчи пудрат ташкилоти - қурилиш корхонасини аниқлаб олишимиз керак. Ички йўлни асфалтлаш ишларини амалга оширишда танловга қатнашиш таклифи ушбу фаолият билан шугулланувчи бир қатор хўжалик юритувчи субъектларга Махсус Ахборот паргалига 24.08.2022 йил жорий таъмирлаш ишлари учун смета ҳужжатларини таёрлаш 47892347 сўмга лот №142932 билан эълонлар жойлаштирилди

Эълонга берилган №	Эълон нашр этган сана	Эълонга берилган маблағ	Эълонга кўйилган хизмат тури	«Хўжаобод туман йўллардан фойдаланиш» у/к томонидан кўйилган таклиф	«Хўжаобод транс лидер» МЧЖ томонидан кўйилган таклиф	“Милано қурилиш” МЧЖ томонидан кўйилган таклиф
142932	24.08.2022 й	47892347 сум	Хужаобод туман «Бахрин МФЙ Пахтакор кўчаси жорий таъмирлаш ишлари	43 149 881.57 сум	46 000 000 сум	43 100 000 сум

Танловда Хужаобод туманидаги “Хўжаобод туман йўллардан фойдаланиш» у/к, Хўжаобод транс лидер» МЧЖ ҳамда “Милано қурилиш” МЧЖ лар ўз тижорий таклифлари билан қатнашмоқда.

1. “Хўжаобод туман йўллардан фойдаланиш» у/к
Бажариладиган ишлар буйича 43 149 881.57 сум

2. «Хўжаобод транс лидер» МЧЖ

Бажариладиган ишлар буйича 46 000 000 сум

3. "Милано курилиш" МЧЖ

Бажариладиган ишлар буйича 43 100 000 сум

Хайъат аъзолари томонидан ички йўлни жорий таъмирлаш учун амалга оширувчи корхоналарининг таклифлари ўрганиб чиқилиб, баённомага асосан таҳлил қилиниб овозга қўйилганда « Хўжаобод туман йўллардан фойдаланиш » у/к таклифини ёқлаб хайъати аъзолари томонидан овоз берилди.

(Қатнашчиларнинг тижорий таклифлари ва давлат руйхатидан ўтганлиги тўғрисидаги гувоҳнома нусхаси баённомага илова қилинади)

Танлов комиссиясини аъзолари кун тартибдаги масалани муҳокама қилиб:

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Ўтказилган танловда Андижон вилояти Давлат хизматлари маркази томонидан 2021 йил 29 декабр куни тадбиркорлик субъекти сифатида № 1079247 ракам билан гувоҳнома берилган (СТИР № 201503300) « Хўжаобод туман йўллардан фойдаланиш » у/к ички йўлларини жорий таъмирлаш ишларини бажариб беришлигини ҳисобга олиб танлов ғолиби деб топилсин.

2. Ушбу қарорга асосан Хўжаобод туман Ободонлаштириш бошқармасининг « Хўжаобод туман йўллардан фойдаланиш » у/к билан Баҳрин МФЙ Пахтакор кўчаси ички йўлларини жорий таъмирлаш ишларини амалга оширишда баҳолаш мезони юқори баҳоланганлиги ҳисобга олинди шартномани расмийлаштирилиши мақсадга мувофиқ деб топилсин.

3. "Милано курилиш" МЧЖ ва «Хўжаобод транс лидер» МЧЖ лар томонидан қўйилган таклифлар баҳолаш мезонида паст баҳоланганлиги сабабли рад этилди.

4. Шартномада жорий таъмирлаш учун смета ҳужжатларини таёрлаш амалга оширишда ташкилотларни узига нисбатан банкротлик эмаслиги, каррупсияга йўл қўймаслиги тўғрисида тилхат, ишларни бажариш учун зарур техникавий молиявий моддий кадрлар ва бошқа ресурсларни мавжудлиги тўғрисида ҳужжатларни тақдим қилганлиги ҳисобга олинсин. .

5. Таъмирлаш ишлари учун буюртмачининг пудрат ташкилоти билан ҳисоб-китоблари, ўрнатилган тартибда расмийлаштирилган бир ойда бажарилган ишларни қабул қилиш далолатномалари асосида, бажарилган иш миқдори (қилинган харажатлар) тўғрисидаги ўрнатилган тартибда расмийлаштирилган ҳисоб варақ-фактуралар (маълумотномалар) буйича амалга оширилсин.

6. «Танлов натижалари буйича ғолиб» деган тушунча пудратчи хўжалик юритувчи субъектлар томонидан шартнома шартлари бузилганда буюртмачи, яъни туман ободонлаштириш бошқармаси ташаббуси билан шартномани бекор қилишга тускинлик қилмаслиги таъкидлансин.

Қарор йиғилиш иштирокчилари томонидан ёқлаб овоз бериш билан қабул қилинди.

Комиссия раиси:

А. Саитов

Комиссия котиби:

О. Мирзаева

Комиссия аъзолари:

А. Соипов

Х.Халилов

О. Ортиков

Г. Аманова

**Протокол закупочной комиссии по конкурсу лот № 142932 на приобретение
Ободонлаштириш булими Бахрин МФЙ Пахтакор кучасини асфалтлаш**

Способ проведения электронный

Дата 07.09.2022

Время рассмотрения 07.09.2022 10:21

Конкурсная комиссия Хужабод т. ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	SAITOV ABID GULAMDJANOVICH	бош мухандис	комиссия раиси
Секретарь комиссии	MIRZAYEVA OZODAXON MAMATIMINOVNA	ердамчи хисобчи	ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	ORTIKOV OMATJON XALILOVICH	булим устаси	аъзо
Член комиссии	SAIPOV AVAZBEK DALISHOVICH	бригадир	аъзо
Член комиссии	XALILOV XABIBULLA KIMSANBAYEVICH	назоратчи	аъзо
Член комиссии	AMANOVA GULAZZAMXON XAYITBOYEVNA	омборчи	ободон

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 07.09.2022 года № лота 142932.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог
Подробное описание	Ободонлаштириш булими Бахрин МФЙ Пахтакор кучасини асфалтлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	47 892 347.00
Стартовая сумма	47 892 347.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ариза

Тип: Текстовое значение

Описание: Энг яхши таклифларда иштирок этиш учун ариза

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ХУЖАБОД ТУМАН ЙЎЛ ФЙДАЛ УК	15	15	14	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"ХО'ЖАОВОД TRANS LIDER" masuliyati cheklangan jamiyati	15	46,000,000	12	Экспертная		
MILANO QURILISH МЧЖ	15	43100000	12	Экспертная		

Критерий №2 Тилхат

Тип: Текстовое значение

Описание: Корупцияга йул куймаслик хакида тилхат

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ХУЖАОВОД ТУМАН ЙЎЛ ФОЙДАЛ УК	20	20	19	Экспертная		
"ХО'ЖАОВОД TRANS LIDER" masuliyati cheklangan jamiyati	20	46,000,000	17	Экспертная		
MILANO QURILISH МЧЖ	20	43100000	17	Экспертная		

Критерий №3 реестрда мавжуд эмаслиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Инсофсиз ижрочилар реестрида мавжуд эмаслиги

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ХУЖАОВОД ТУМАН ЙЎЛ ФОЙДАЛ УК	15	15	13	Экспертная		
"ХО'ЖАОВОД TRANS LIDER" masuliyati cheklangan jamiyati	15	46,000,000	9	Экспертная		
MILANO QURILISH МЧЖ	15	43100000	12	Экспертная		

Критерий №4 Маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Узига нисбатан банкротлик омилларини мавжуд эмаслиги

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ХУЖАОВОД ТУМАН ЙЎЛ ФОЙДАЛ УК	15	15	11	Экспертная		
"ХО'ЖАОВОД TRANS LIDER" masuliyati cheklangan jamiyati	15	46,000,000	8	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MILANO QURILISH MЧЖ	15	43100000	6	Экспертная		

Критерий №5 Маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчиларига шартномани бажариш учун зарур техникавий.молиявий.вмоддий кадрлар ва бошка ресурсларни мавжудлиги

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ХУЖАБОД ТУМАН ЙЎЛ ФОЙДАЛ УК	20	20	18	Экспертная		
"ХО'ЖАБОД TRANS LIDER" masuliyati cheklangan jamiyati	20	46,000,000	17	Экспертная		
MILANO QURILISH MЧЖ	20	43100000	17	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ХУЖАБОД ТУМАН ЙЎЛ ФОЙДАЛ УК	47 892 347.00	43 149 881.57 UZS	43 149 881.57	00.00	43 149 881.57	26.08.2022 14:46:02	29.97
MILANO QURILISH MЧЖ	47 892 347.00	43 100 000.00 UZS	43 100 000.00	00.00	43 100 000.00	04.09.2022 19:48:42	30.00
"ХО'ЖАБОД TRANS LIDER" masuliyati cheklangan jamiyati	47 892 347.00	46 000 000.00 UZS	46 000 000.00	00.00	46 000 000.00	31.08.2022 19:47:31	28.11

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ХУЖАБОД ТУМАН ЙЎЛ ФОЙДАЛ УК	61.7645	29.97	91.7345
MILANO QURILISH MЧЖ	52.7058	30	82.7058
"ХО'ЖАБОД TRANS LIDER" masuliyati cheklangan jamiyati	51.8826	28.11	79.9926

Закупочная комиссия по конкурсу лот № 142932 от 07.09.2022 года на приобретение Ободонлаштириш булими Бахрин МФЙ Пахтакор кучасини асфалтлаш определила победителем:

ХУЖАБОД ТУМАН ЙЎЛ ФОЙДАЛ УК
201503300

и резервный исполнитель: MILANO QURILISH МЧЖ (205927782)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	SAITOV ABID GULAMDJANOVICH	Согласен	
Член комиссии	ORTIKOV OMATJON XALILOVICH	Согласен	
Член комиссии	SAIROV AVAZBEK DALISHOVICH	Согласен	
Член комиссии	XALILOV XABIBULLA KIMSANBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	AMANOVA GULAZZAMXON XAYITBOYEVNA	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



"YO'L LOYIHA SERVICE"
Маъсуляти чекланган жамият

Тел: 998 90 253 05 54 ; 998 93 910 05 53

Андижон ш. А.Фитраткучаси 4 А уй. Банк №/р 2020 8000 6054 7412 4001
«Узсаноаттурилишбанк» «Бунёдкор» филиали МФО 00440 ИНН 309
163 202 ОКОНХ 66000

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "ПАХТАКОР" ДЛИНОЙ 200М
В МФЙ "БАХРИН" ХОЖАБОДСКОГО РАЙОНА**

(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

КОПИЯ. № _____

Андижан - 2022 год

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

ООО "YO'L LOYIHA SERVICE"
АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "ПАХТАКОР" ДЛИНОЙ 200М В МФЙ
"БАХРИН" ХОЖАБОДСКОГО РАЙОНА
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА
ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНЫЕ СМЕТЫ
ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНЫЕ ВЕДОМОСТИ

Директор:

Г.И.П



ОМУРЗАКОВ Х.

АКБАРОВА.Д

Составлена на основании дефектного акта

Экз. _____

АНДИЖАН - 2022 год

СОДЕРЖАНИЕ
СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "ПАХТАКОР" ДЛИНОЙ 200М В МФИ "БАХРИН"
ХОЖАЛОВДСКОГО РАЙОНА
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

№	НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА	СТРАНИЦЫ
I	II	III
1	ПИСЬМО-ЗАДАНИЕ	
2	ДЕФЕКТНЫЙ АКТ	
3	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	
4	СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА	
5	ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА	
6	ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ	

СОДЕРЖАНИЕ
СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "ПАХТАКОР" ДЛИНОЙ 200М В МФИ "БАХРИН"
ХОЖАЛОБОДСКОГО РАЙОНА
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

№ I	НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА II	СТРАНИЦЫ III
1	ПИСЬМО-ЗАДАНИЕ	
2	ДЕФЕКТНЫЙ АКТ	
3	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	
4	СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА	
5	ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА	
6	ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ	

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "ПАХТАКОР" ДЛИНОЙ 200М В МФЙ "БАХРИН" ХОЖАБОВДСКОГО РАЙОНА
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЕ)**

Стоимость работ и затрат определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года № 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений" и ШНК 4.01.16-09

Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле(ШНК 4.01.16-09)

$$Ц = (Сзн + Сэм + См + Зо + Стр + Пп + Ппр + Пз + Ср) \times Кр$$

где:

- Сзн**- затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;
- Сэм**- затраты на эксплуатацию машин и механизмов;
- См**- затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;
- Стр**- затраты на транспортные расходы;
- Пп**- прочие затраты подрядчика;
- Ппр**- прочие затраты производственного характера;
- Пз**- прочие затраты заказчика ;
- Зо**- затраты на на оборудование;
- Ср**- затраты на страхование строительства объектов;
- Кр**- Коэффициент риска;

I. Затраты на заработную плату;

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих - строителей на текущую стоимость 1 человека - часа (в сумах) и на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$Сзн = Тр \times Сч \times Ксс = 866,120 \text{ тыс. сум}$$

Тр - трудозатраты рабочих - строителей и монтажников, определяемые в составе ресурсных смет;

Сч - среднечасовая заработная плата рабочих - строителей, исчисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону за 2022г., принята с зарплатой рабочих - строителей на строительстве. 12483,39 сум

Ксс- коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование. 12 %

Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$Сч = Змс : \Phi = 13981,40 \text{ сум}$$

где:

Змс- Среднемесячная заработная плата рабочих - строителей по региону; 2107571 сум

Φ- среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднемесячная заработная плата строителей по стройке в расчете на месяц, определена на основе статистических данных , а часовая ставка из расчета 168,83 часов в месяц.

Трудозатраты определены в соответствие с ресурсной ведомостью и составляют для рабочих - строителей 61,95 чел/час

II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам, исходя из нормативной потребности в машино - часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машино - часа соответствующего вида машин по формуле :

$$Сэм = ЭМ \times Цпр = 1894,751 \text{ тыс. сум}$$

где:

ЭМ - Объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр- текущие цены на эксплуатации машин и механизмов в час/ сум

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной ведомостью.

III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметой, разработанной в составе рабочего проекта с использованием средних текущих цен на материально - технические ресурсы, приведенных в Каталог Госархитектстроя по формуле:

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{мп} = 32320,857 \text{ тыс. сум}$$

где: $C_{m1}, C_{m2}, C_{m3}, C_{мп}$ - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций
 $C_{мп} = N \times C_{ср}$,

где:
 N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;
 $C_{ср}$ - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции), применены по протоколу согласования цен.

IV. Затраты на приобретение оборудования.

$$Z_o = Z_k + Z_{пр} = 0$$

Z_k - стоимость основного технологического оборудования.
 $Z_{пр}$ - стоимость прочего оборудования, приобретаемого на рынках Республики определена по спецификациям проекта и средневзвешенным ценам.

V. Транспортные расходы на перевозку грузов :

$$C_{тр} = 596,295 \text{ тыс. сум}$$

где:
 $C_{тр}$ - размер транспортных расходов на перевозку строительных материалов, изделий и конструкций установлен в размере 5% от их стоимости в соответствии с письмом Государственного комитета республики Узбекистан по архитектуре и строительству за 352/11-05 от 31.01.2011 год.

VI. Прочие производственные затраты.

Затраты на временные здания и сооружения	0 %	
Дополнительные затраты в зимнее время на строительство		0 %
		0

VII. Прочие затраты подрядчика.

$Пп$ - прочие затраты подрядчика приняты в размере 18,71 %

от суммы прямых затрат согласно согласования Андижанского областного Хокимията и ИК "СЕЗ" Андижанской области

$Пп$ - 6 563,791 тыс .сум

VIII. прочие затраты заказчика

0,000 тыс .сум

IX. Страхования объектов .

Тариф по обязательному страхованию строительных рисков принимается в размере 0,4% от страховой суммы (80% полной стоимости объекта)

$$C_{р} = (C_m + C_{зп} + C_{эм} + C_{п} + Пп) \times 0,8 \times 0,4\% = 0,000 \text{ тыс. сум}$$

X. Коэффициент роста цен.

Коэффициент роста цен принят в размере 0 %

В соответствии с « Временным положением о порядке определения стоимости строительства объектов в договорных текущих ценах» Утвержденным Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 г. №261 стартовая стоимости строительства объекта является ориентиром и не могут служить основанием для заключения договоров подряда.

Составил :

Стартовая стоимость объекта в договорных текущих ценах

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "ПАХТАКОР" ДЛИНОЙ 200М В МФЙ "БАХРИН"
ХОЖАОБОДСКОГО РАЙОНА
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

(Наименование объекта , стройки)

№.№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Стоимость (тыс.сум)
1	2	3
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	32 320,857
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	866,120
4	Затраты на эксплуатации машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов)	1 894,751
5	Прочие затраты производственного характера	0,000
6	Прочие затраты подрядчика 18,71%	6 563,791
7	Затраты на страхование строительства объектов	
8	Затраты на покрытие риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на очередной год	
9	ИТОГО стоимость строительство в договорных текущих ценах	41 645,519
10	НДС 15%	6 246,828
11	ИТОГО стоимость строительство в договорных текущих ценах	47 892,347

ИСПОЛНИТЕЛЬ



ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "ПАХТАКОР" ДЛИНОЙ 200М В МФЙ "БАХРИН" ХОЖАБОДСКОГО РАЙОНА
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ

Составлено в текущих ценах

N п/п	Наименование ресурса	Единица измерения	Сметная потреб- ность	Сметная стоимость, СУМ	
				в текущем уровне	
				единицы	всего
1	2	3	4	5	6
Ресурсы по нормам СНиП					
<i>Затраты труда</i>					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	61,948	13 981,40	866 119,77
Итого по трудовым ресурсам		СУМ			866 119,77
<i>Строительные машины и механизмы</i>					
1	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,029	90 150,67	2 614,37
2	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,053	90 150,67	4 777,99
3	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,900	90 150,67	81 135,60
4	ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,150	11 200,00	1 680,00
5	РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,075	18 892,00	1 416,90
6	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,900	403 629,50	363 266,55
7	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	1,540	147 559,40	227 241,48
8	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	0,685	139 704,70	95 697,72
9	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	0,775	223 214,70	172 991,39
10	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,250	181 632,70	45 408,18
11	АВТОТРАНСПОРТ АСФАЛЬТОБЕТОНА ДАЛЬНОСТЬ ДО 8КМ	Т	66,717	8 937,68	596 295,20
Итого по строительным машинам		СУМ			1 894 750,51
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>					
1	БИТУМ	Т	0,147	5 404 033,00	793 852,45
2	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	66,717	472 548,30	31 527 004,93
Итого по материальным ресурсам		СУМ			32 320 857,38

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ УЛИЦЫ "ПАХТАКОР" ДЛИНОЙ 200М В МФП "БАХРИН" ХОЖАОВОДСКОГО РАЙОНА
(ПОСЛЕ ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ)

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНО-РЕСУРСНАЯ СМЕТА

объект -

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Сметная стоимость

35 081,73

ТЫС.СУМ.

0,00

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ


СУМ

Состав акции в смету	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество		Общая стоимость	
				на единицу измерения	по проектным лацням	в текущем (прогноном) уровне	
						на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	9	10
РАЗДЕЛ I. ДЛИНА 200М							
1	E68-15-1	РЕМОНТ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ДОРОГ ОДНОСЛОЙНОГО ТОЛЩИНОЙ: 50 ММ ПЛОЩАДЬЮ РЕМОНТА ДО 5 М2	100М2	0,53000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	100,10000	53,05	13 981,40	741 755,21
		КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	3,42000	1,81	133 425,50	241 847,06
		КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 М3/МИН	МАШ.-Ч	2,95000	1,56	26 502,00	41 435,88
		КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	1,00000	0,53	8 600,00	4 558,00
		МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,90000	3,13	4 600,00	14 384,20
		АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,10000	0,05	90 150,67	4 777,99
		БИТУМ	Т	0,07000	0,04	5 404 033,00	200 489,62
		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	11,90000	6,31	472 548,30	2 980 362,13
2	E2706-026-01	РОЗЛИВ ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	Т	0,10000			
		БИТУМ	МАШ.-Ч	0,29000	0,03	90 150,67	2 614,37
		БИТУМ	Т	1,03000	0,10	5 404 033,00	556 615,40
3	E2713-010-01 ДОП. 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ	1000 М2	0,50000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,63000	8,32	13 981,40	116 255,34
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	1,44000	0,72	90 150,67	64 908,48
		ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,24000	0,12	11 200,00	1 344,00
		МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,50000	0,25	181 632,70	45 408,18
		РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,12000	0,06	18 892,00	1 133,52
		УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	1,44000	0,72	403 629,50	290 613,24
		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ.-Ч	3,08000	1,54	147 559,40	227 241,48
		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ.-Ч	1,37000	0,69	139 704,70	95 697,72
		КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ.-Ч	1,55000	0,78	223 214,70	172 991,39
		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	96,60000	48,30	472 548,30	22 824 082,89
		ВОДА	М3	0,90000	0,45	0,00	0,00
		БИТУМ	Т	0,01080	0,01	5 404 033,00	29 181,78
4	E2713-011-01 ДОП. 9 К=2	ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ НА 0,5 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 27-13-011-01 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	1000 М2	0,50000			
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,16000	0,58	13 981,40	8 109,21
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,36000	0,18	90 150,67	16 227,12
		АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,06000	0,03	11 200,00	336,00
		ГУДРОНАТОРЫ РУЧНЫЕ	МАШ.-Ч	0,03000	0,02	18 892,00	283,38
		РЕЗЧИКИ ШВОВ ДИСКОВЫЕ	МАШ.-Ч	0,36000	0,18	403 629,50	72 653,31
		УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,36000	0,18	403 629,50	72 653,31
		АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ	Т	24,22000	12,11	472 548,30	5 722 559,91
		БИТУМ	Т	0,00280	0,00	5 404 033,00	7 565,65
		БИТУМ	Т	66,71700		8 937,68	596 295,20
5	C148-8-1	АВТОТРАНСПОРТ АСФАЛЬТОБЕТОНА ДАЛЬНОСТЬ ДО ВКМ	Т	66,71700		8 937,68	596 295,20


ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ I					
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ					
В ТОМ ЧИСЛЕ:					
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	СУМ				35 081 727,65
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	СУМ				35 081 727,65
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	СУМ				866 119,77
ИТОГО	СУМ				1 894 750,51
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 18,71%	СУМ				32 320 857,38
ВСЕГО	СУМ				35 081 727,65
НДС 15%	СУМ				6 563 791,24
ВСЕГО С НДС	СУМ				41 645 518,89
	СУМ				47 892 346,73

ПРОВЕРИЛ


СОСТАВИЛ



ОМУРЗАКОВ Х.

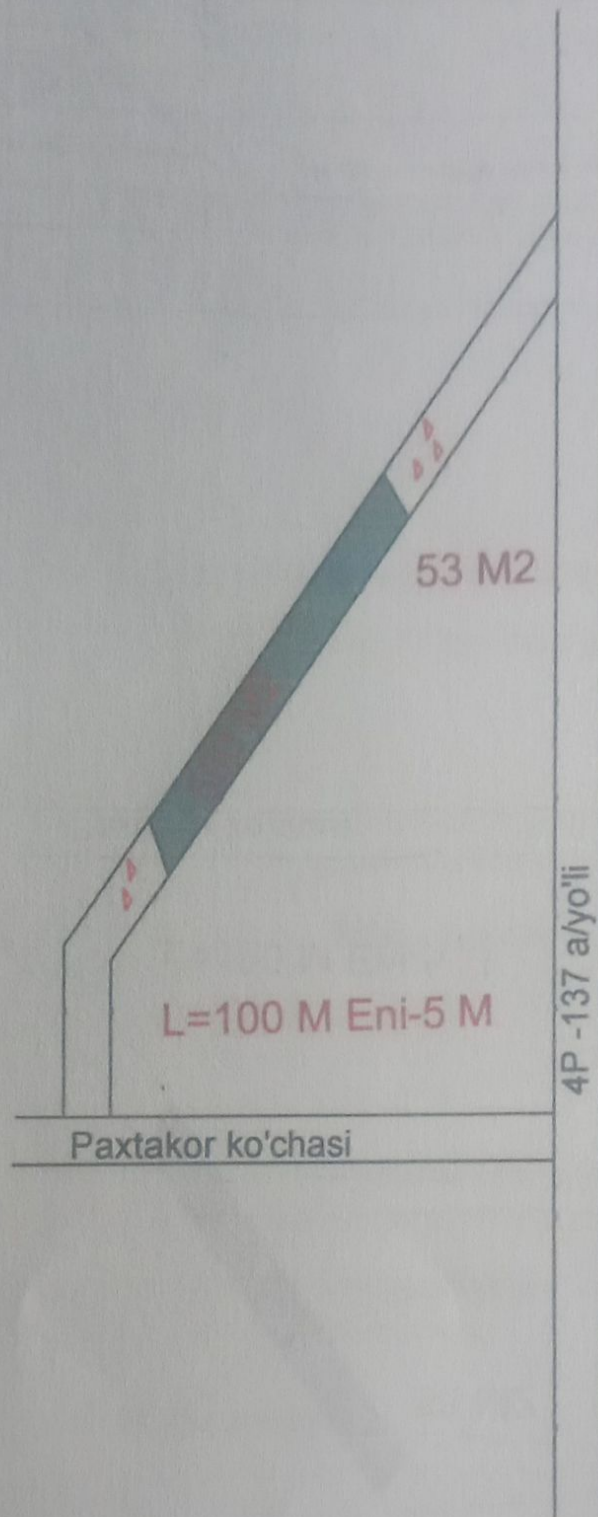

				Andijon viloyati Ho'jaobod tumanl "Baxrin" MFY "Paxtakor" ko'chasini jorly tamirlash		
Rahbar:	Omurzaqov X			Bosqich	Varoq	Varoqlar
Tekshirdi:	Ergashev I			PII	1	1
Chizdi:	Abdullaev A			"YO'L LOYIHA SERVICE" Andijon 2022-yil		
L.B.M	Akbarova D					
				YO'L REJASI		



Xo' jaobod tumani "Bahrin" MFY "Paxtakor" ko'chasini

0km-0,200km qismini joriy ta'mirlash bo'yicha


NUQSONLAR QAYDNOMASI

Biz, quyida imzo qo'yib tasdiqlovchilar, komissiya a'zolari: Xo'jaobod tumani obodonlashtirish boshqarmasi vakili, "Bahrin" MFY raisi, "Bahrin" MFY faoli, Loyiha tashkilot vakili, mazkur qaydnomani tuzdik shu to'g'ridagi, vizual tekshirish va instrumental o'lchashlar natijasida ushbu yo'lda quyidagi ish turlari va hajmlari aniqlandi.

№ tr	Ishlarning manzili				Uzunli gl (m)	Yo'l elementlarini mavjud xolati	Loyihada kuzda tutilgan ish turlari va tadbirlari	Ish hajmlarini hisoblash formulasi	O'lcho v birfigi	Miqdor i	Izoz
	km		piketaj								
	dan	gach a	PK +	PK +							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ko'chaning uzunligi №1 - 200m											
1	0,0	0,1	0+00	1+00	100	Mavjud yo'l qoplamasi eski asfaltobetondan mavjud. Kengligi 5,0m .	Mexanizm yordamida 5sm qalinlikda qaynoqmayda zaralli zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish.	L x Eni	m2	500	
2	0,1	0,2	1+00	2+00	100	Mavjud yo'l qoplamasi eskirgan asfaltobetondan iborat. Chuqur chanoqlar mavjud. Kengligi 5,0m	Mavjud yo'l qoplamasi buzilgan, chuqur chanoqlari mavjud 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish. (yamash)	L x Eni x %	m2	53	
Umumiy yo'l bo'yicha sarflanadigan qurilish materiallarini keltirish masofasi.											
1						Asfaltobeton		km	8		

Imzolar:

1. Xo'jaobod tumani obodonlashtirish boshqarmasi vakili;
2. MFY raisi;
3. MFY vakili;
4. Loyixa tashkilot vakili;



A. Laurab
T. H. Paxtakor
R. H. ...
A. Spravch



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Андижон вилояти

Andijon viloyati 170100, Andijon Shahri, A.Navoiy shox ko'chasi 30-uy. Tel/Faks (374) 223-57-82, E-mail: ekspert-2312@mail.ru. www.eksptiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: MASHRAPOV AXRORBEB AKRAMOVICH

Sana: 15-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 56692

Obyekt nomi «Xo'jabod tumani "Baxrin" MFY "Paxtakor" ko'chasini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - "Yo'l loyiha Service" MCHJ

Bosh loyihachi - "Yo'l loyiha Service" MCHJ

Litsenziya Ozbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi AL-002058 sonli

O'zbekiston Respublikasi qurilish vazirligi tomonidan 02.02.2022 yilda berilgan, cheksiz.

Moliyalashtirish manbai - Maxalliy byudjet mablag'lari xisobidan

Bosh pudratchi - tender savdolari orkali

Qurilish turi joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 54211

1. Loyihalash uchun asos

Xo'jabod tuman (shaxar) xokimligi tasarufida bo'lgan ichki xo'jalik yo'llarini maxalliy byujet mablag'lari xisobidan tamirlash ishlari bo'yicha 2022-yil uchun dastlabki MANZILLI RO'YXATI.

2022 yildagi "Xo'jabod tuman obodonlashtirish boshqarmasi rahbari" tomonidan tasdiqlangan va "Yo'l loyiha Service" MCHJ bilan kelishilgan nuqsonlar dalolatnomasi

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Lokal resurs xujjatlar.

Tushuntirish xatlari.

Yig'ma lokal xujjatlar

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ob'ektning peshxisob xisoblari bo'yicha: "Xo'jabod tumani "Baxrin" MFY "Paxtakor" ko'chasini joriy ta'mirlash" ob'ekti peshxisob xisoblari bo'yicha, tasdiqlangan nuqson dalolatnoma asosida quyidagi ish turlari bajarilishi ko'zda tutilgan:

Yo'l poyonining uzunligi -200m. Mexanizm yordamida 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasini yotqizish. Mavjud yo'l qoplamasi buzilgan, chuqur chanoqlari mavjud 5sm qalinlikda qaynoq mayda zarrali zich asfaltobeton qorishmasi yotqizish.(yamash) ishlari ko'zda tutilgan.

Xisob kitob uchun "Resurslar metodi" dan foydalanildi.

4. Loyihalayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Tushuntirish xatining tartibga keltirilishi.

Ish xaqi xarajatlari Vaqtinchalik tartib bilan kelishilgan xolda tartib asosida aniqlangan:

- Quruvchilarning o'rtacha oylik ish xaqi xisobotlar asosida keltirilgan.

- Ijtimoiy sug'urtaga xisoblanish 2022 yil ko'rsatkichlari asosida qabul qilingan.

Putratchi xarajatlari SHNK-4.01.16-09ga asosan keltirilgan.

Buyurtmachi xarajatlari xisobga olinmagan.

Tavakkalchilik koeffitsienti xisobga olinmagan.

Mashina va maxsulotlar qiymati tegishli me'yoriy xujjatlar asosida aniqlik kiritilgan.

Ijtimoiy sug'urtaga o'tkazmalarni aniqlash uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 04.12.2014 yildagi PFP-2270 sonli Farmoniga kiritilgan №25 sonli ilovadan foydalanish zarur.

Taqdim etilgan 15% QQS bilan hisoblangan umumiy miqdori 47892,347 ming so'mni tashkil qilgan

7. Xulosalar.

Peshxisob xisoblari bo'yicha: « Xo'jabod tumani "Baxrin" MFY "Paxtakor" ko'chasini joriy ta'mirlash », ob'ektini quyidagi texnika-iqtisodiy ko'rsatkichlariga ko'ra keyingi kelishuv va tender savdolarini o'tkazish uchun tavsiya etiladi:

Me'yoriy mehnat sarfi - 7,74 kishi/kun.

Joriy narxdagi tavsiyaviy (boshlang'ich)

miqdori 15% QQS bilan - 47892,347 ming so'm.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va ShNK 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'ektning qiymati buyurtmachi tomondan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash va qurilish ishlari narxi boshlang'ich xisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

ShNK 1.03.06-13da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaxarsozlik xujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyixa qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

Bosh mutaxassis: Xaldarov Jur'at Alimdjanovich
